
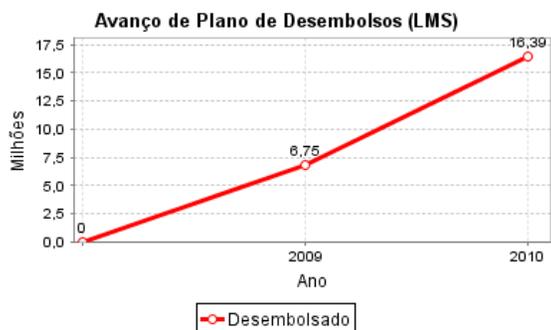



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	COMPANIA ANONIMA HIDROLOGICA VENEZOLANA				
Setor:	WATER AND SANITATION				
Número da Operação:	1445/OC-VE	Atual:	28.000.000,00	Original BID:	28.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	28.000.000,00	Corrente BID:	28.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	63,53
Operação Relacionada:		Saldo:		Cofinanciamento/País:	12.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	40.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011

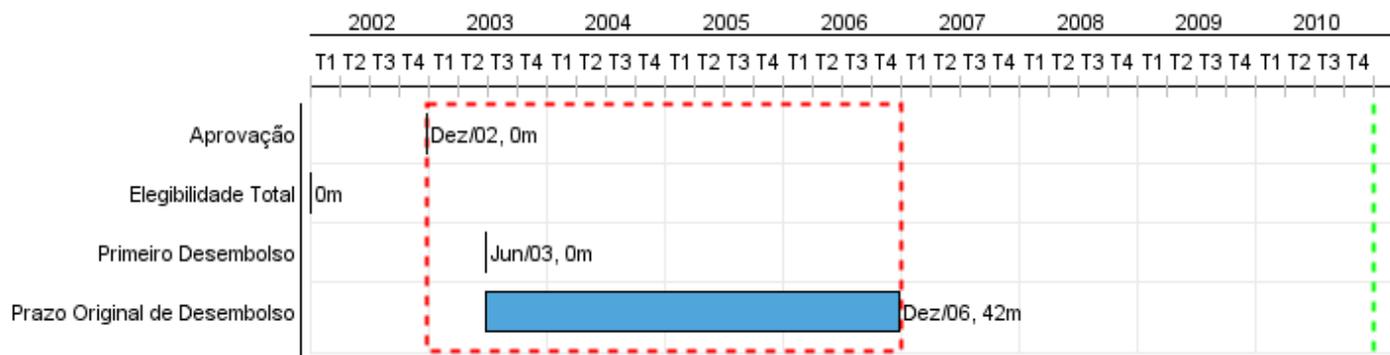

Progresso Acumulado até 2010

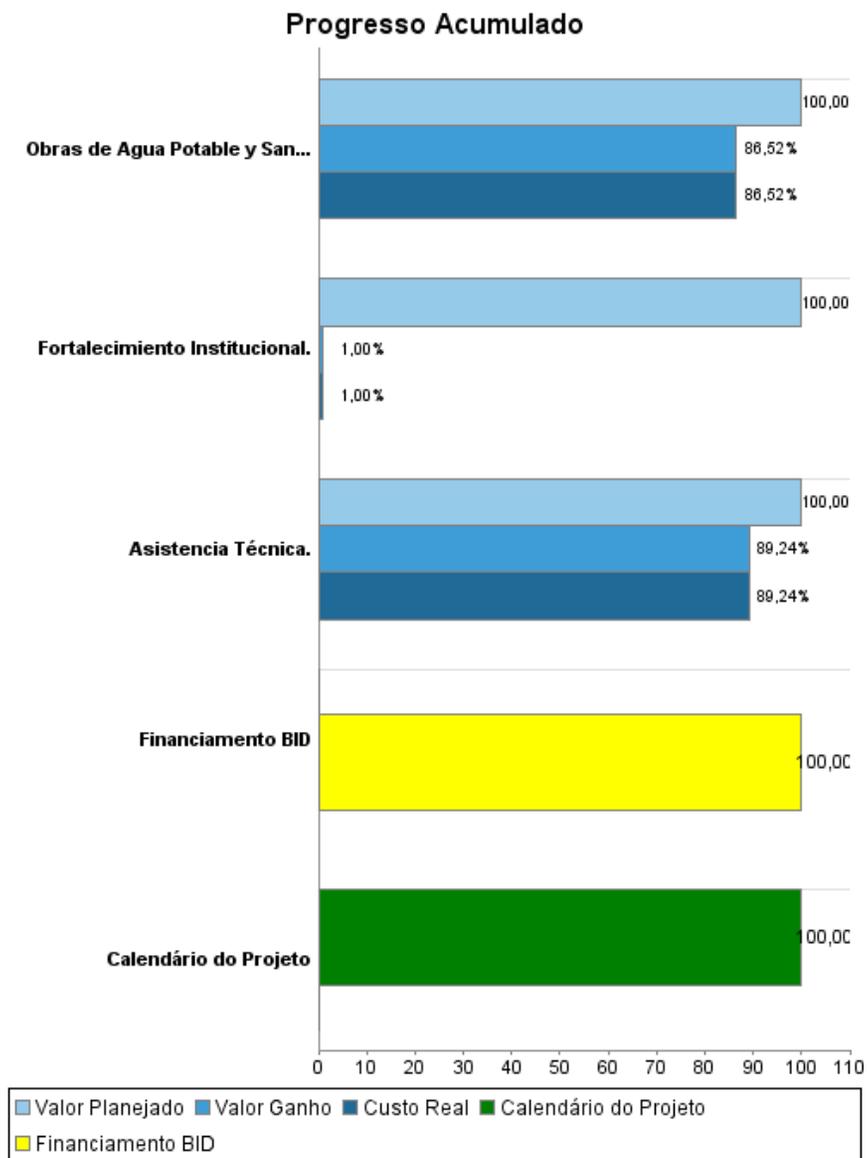

Resultados

Resultado: incremento de la cobertura y del consumo per-cápita de agua potable y, de los servicios de saneamiento.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2013	2014	Final do Projeto
LHD (Litros-Hombre-Día) de consumo per-cápita de agua potable en las comunidades rurales beneficiadas por el Programa.	LHD (Litros-Hombre-Día)	50,00	2002	P	120,00			120,00
				A	120,00			
% de disminución de las diarreas agudas en niños menores de 5 años habitantes de las comunidades rurales beneficiadas por el Programa.	%			P	10,00			10,00
				A	10,00			

Resultado: Mecanismo de gestión (operativo-financiero) implantado, para que las comunidades rurales del Programa, estén atendidas con sistemas de APS administrados por (Entidades Operadoras -EO's-) que sean financieramente sostenibles.

Observações: Verificación en la oportunidad de la evaluación ex-post.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2013	2014	Final do Projeto
Sistemas de APS atendidos por el Programa son económicamente viables de acuerdo con la evaluación ex-post.	Sistemas			P			50,00	50,00
				A				
% de los Operadores (EO's) funcionando 3 años después del último desembolso con: (i) servicio contínuo las 24 horas; (ii) calidad de agua conforme las normas; y (iii) flujo de caja positivo.	%			P		75,00		75,00
				A				

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Obras de Agua Potable y Saneamiento									
Obras de Agua Potable y Saneamiento						4.970.000,00			30.830.000,00
Asistencia Técnica.									
Asistencia Técnica.						200.000,00			2.000.000,00
Fortalecimiento Institucional.									
Fortalecimiento Institucional.						3.356.195,69			3.389.695,69
TOTAL						8.526.195,69			36.219.695,69
