
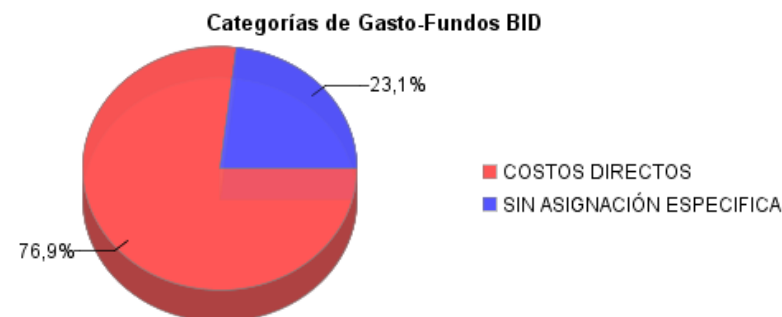
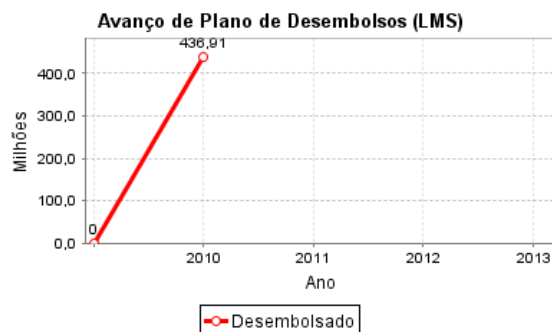



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)		
Sector: ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY		
Número da Operação: 1686/OC-VE-1	Atual: 800.000.000,00	Original BID: 800.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 507.292.830,96	Corrente BID: 800.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 63,41	Pari-passu: 96,46
Operação Relacionada:	Saldo: 292.707.169,04	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 800.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 156

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 12, 2011

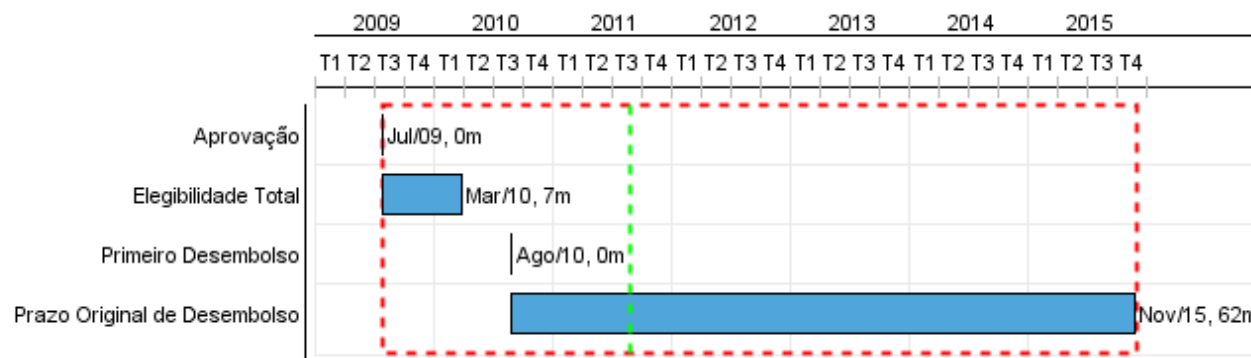

Progresso Acumulado até 2010

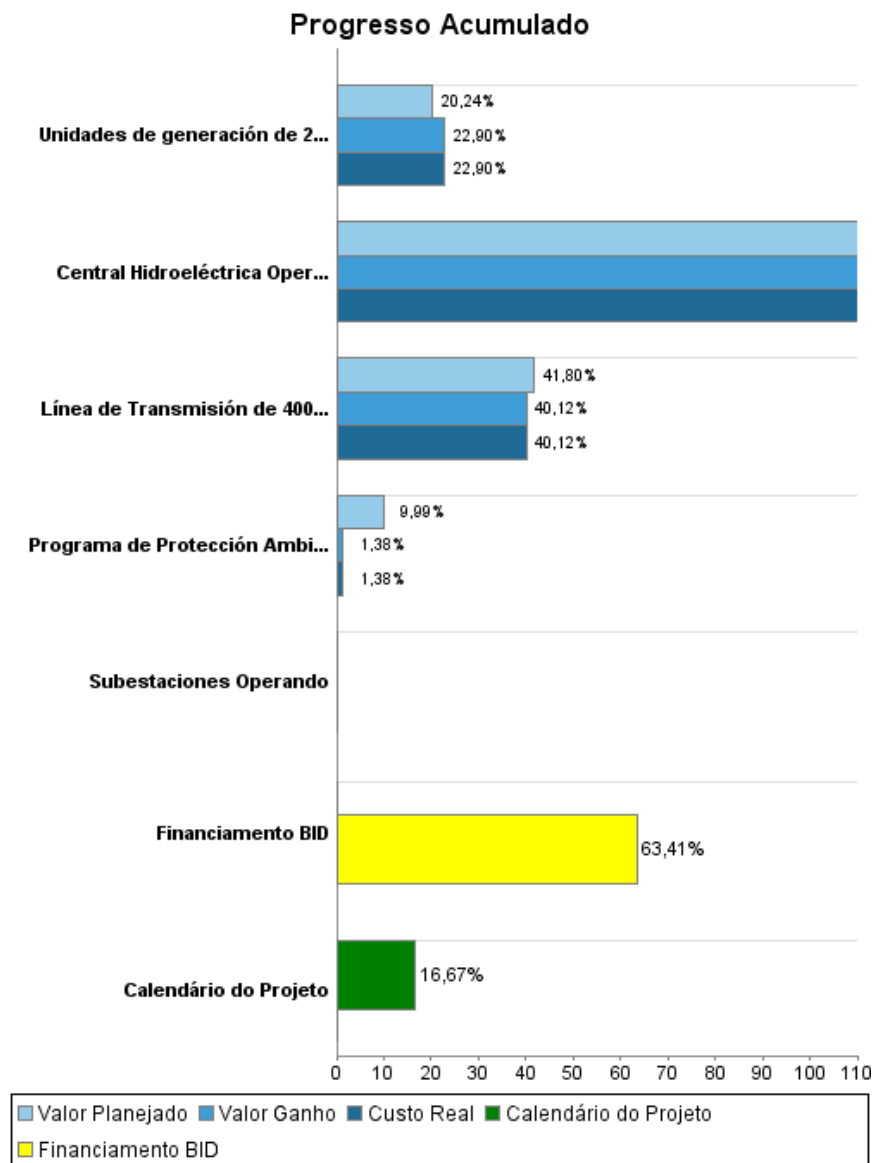

Resultados

Resultado: Producción Energética incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Producción Energética Anual TOCOMA	GWh		2003	P A	1.854,00	11.126,00	18.543,00	18.545,00	18.545,00

Resultado: Costo Promedio de la Capacidad Instalada reducido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Costo Promedio de la Capacidad Instalada	US\$/MW		2011	P A			2.245,00	2.245,00	2.245,00

Resultado: Costo Promedio de la Energía Producida reducido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Costo Promedio de la Energía Producida	US\$/KWh		2003	P A			5,87	5,87	5,87

Resultado: Deuda de la empresa EDELCA reducida

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Relación entre deuda financiera total y EBITDA de EDELCA	Unidades	1,80	2011	P A			2,99	2,99	2,99

Resultado: Nivel de Ingreso de las Familias Reubicadas mantenido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Nivel de Ingresos Anuales de las Familias reubicadas/compensadas a precios de 2003	Bs	250.000,00	2011	P A				250.000,00	250.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Central Hidroelétrica									
Central Hidroelétrica Operando	Unidad				1,00	522.670.130,00	504.134.840,00		190.035.178,00
Unidades de generación de 216 MW cada una con operación comercial iniciada	unidad				1,00	140.904.340,00	159.408.480,00		696.159.850,00
Líneas de Transmisión y Subestaciones									
Línea de Transmisión de 400KV operando	unidad				1,00	21.124.590,00	20.278.730,00		50.541.560,00
Subestaciones Operando	unidad				1,00				63.527.440,00
Protección Ambiental									
Programa de Protección Ambiental Implementado	Informes				1,00	3.409.420,00	469.580,00		34.116.540,00
Ingeniería, Administración y Auditoria									
Sin Asignación Especifica									
Gastos Financieros									
TOTAL						688.108.480,00	684.291.630,00		1.034.380.568,00
