

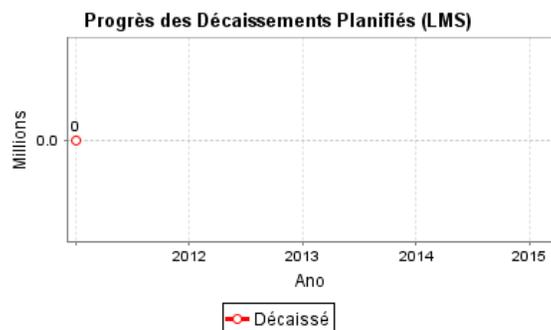


Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Montant Courant Approuvé:	50.000.000,00	Initial BID:	50.000.000,00
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	50.000.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	2630/OC-ES	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Étape:	Approved	Solde:	50.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Type d' Opération:	INV - Investissement			Estimation Initiale:	50.000.000,00
Opération(s) Connexe(s):	ES-T1085, ES-T1097, RG-P1442, ES-T1161			Période d'Amortissement (mois):	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation				

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 30-mar-2012
		Validé par le Représentant: 30-abr-2012

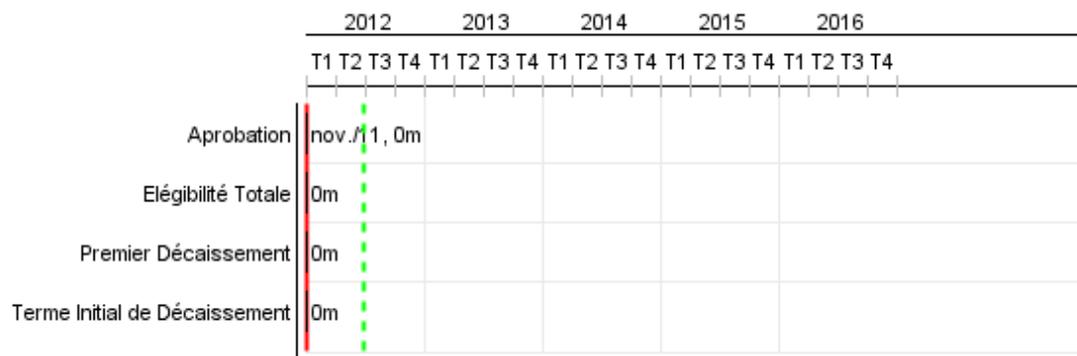

Progrès Cumulé à 2011

Progrès Cumulé

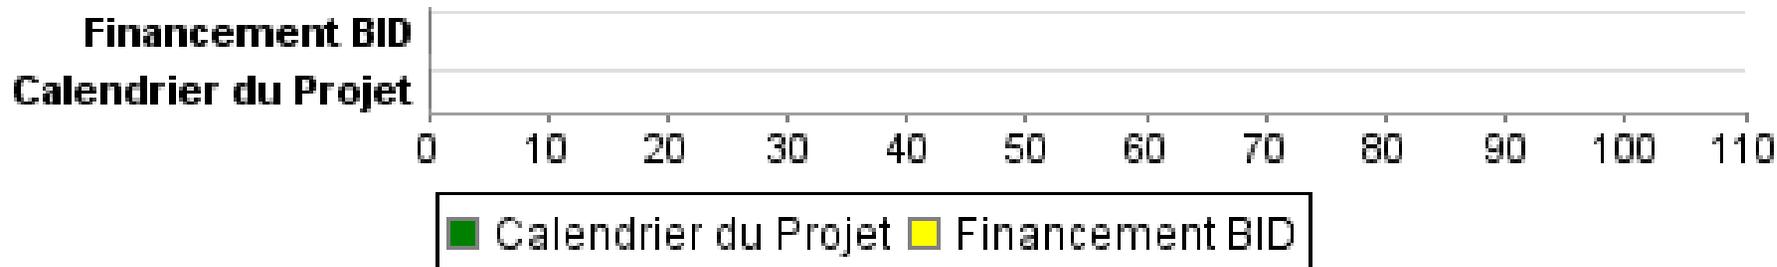

Résultats

Résultat:	Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Precarios Urbanos (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mejoradas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2014	Fin du Projet
Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) que han disminuido su nivel de susceptibilidad a riesgos por inundaciones	Número		2011	P A			10,00
Hogares incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud	Porcentaje		2011	P A			90,00
Volúmenes de agua retenidos	Millones de m3		2011	P A			0,50
Numero de hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares		2012	P A		2,000.00	2,000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Mejoramiento integral y mitigación de riesgo de AUP de CSU en AMSS									
Asentamientos Urbanos Precarios con obras de mejoramiento ejecutadas	Asentamientos				8,00				28.000.000,00
Reducción de vulnerabilidad en AUP a través de inversiones estructurales en el AMSS									
Lagunas de laminación construidas	Lagunas				7,00				16.000.000,00
Plan Maestro de Drenajes	Plan				1,00				3.000.000,00
Bóvedas reparadas	Bóvedas								2.000.000,00
Fortalecimiento de la gestión de la operación									
Unidad Coordinadora de Proyecto constituida	Unidad				1,00				300.000,00
Sistema de monitoreo y seguimiento implementado	Sistema				1,00				450.000,00
Auditoría realizada	Auditoría				5,00				250.000,00
TOTAL									50.000.000,00
