
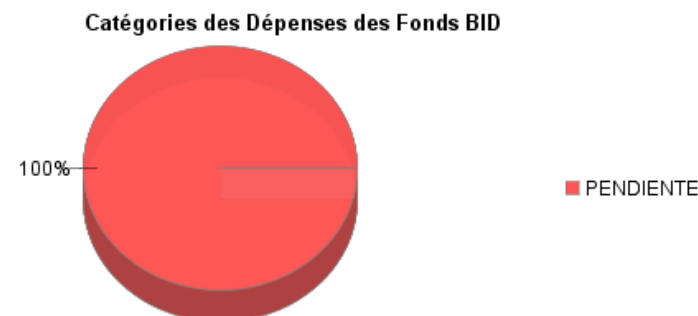



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	UGP Igarapes de Manaus				
Secteur:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2676/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	280.000.000,00	Initial BID:	280.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	280.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	70,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1005, BR-L1164, BR-L1217, BR-X1017, RG-P1442	Solde:	280.000.000,00	Cofinancement/Pays:	120.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	400.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	A () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	15-mar-2012
		Validé par le Représentant:	30-abr-2012

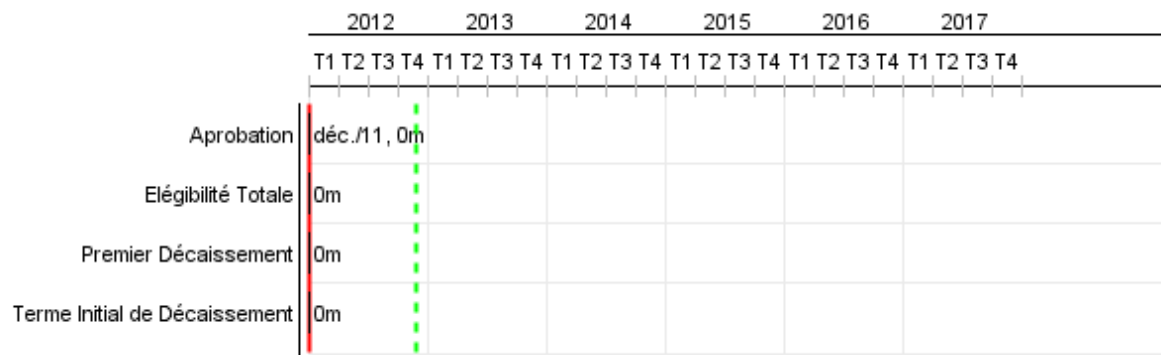

Progrès Cumulé à 2011

Progrès Cumulé

Financement BID
Calendrier du Projet

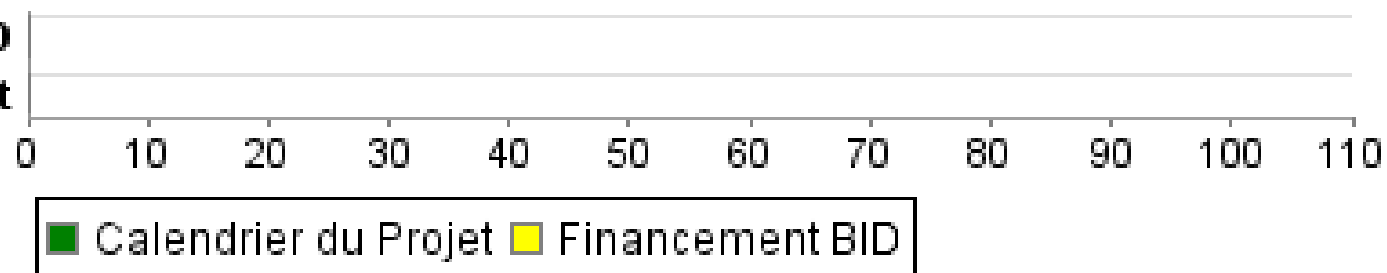

Résultats

Résultat: Qualité da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	22.40	2011	P A	5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	59.00	2011	P A	100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	67.00	2011	P A	0,00
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	430,000.00	2011	P A	1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	42.80	2011	P A	2,00

Résultat: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	45.00	2012	P A	5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	15.00	2012	P A	100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	139.00	2012	P A	0,00
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	930,000.00	2012	P A	1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	4.60	2012	P A	2,00

Résultat: Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	4.90	2011	P A	5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	3.00	2011	P A	100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	21.00	2011	P A	0,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1297 - Social and Environmental Program for the Igarapés in Manaus - PROSAMIM
III
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 06/03/2012

Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	36.00	2011	P	1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1.20	2011	P	2,00
				A	

Résultat:	Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	23.00	2012	P	5,00
				A	
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	8.00	2012	P	100,00
				A	
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	78.00	2012	P	0,00
				A	
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	110,000.00	2012	P	1.000,00
				A	
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1.50	2012	P	2,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional									
Produto 1: Canais de Macrodrenagem construídos	metros				2.491,00				20.616.000,00
Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	metros				27.584,00				3.686.000,00
Produto 3: Unidades habitacionais construídas	unidades habitacionais				1.242,00				91.656.000,00
Produto 4: Sistema Viário construído	metros				5.390,00				10.781.000,00
Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	m²				70.003,00				48.525.000,00
Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	sistema				1,00				51.509.000,00
Produto 7: Domicílios conectados	Domicílios				11.062,00				5.115.000,00
Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	famílias				3.959,00				58.862.000,00
Sustentabilidade Social e Institucional Ambiental									
Produto 9: Plano de Sustentabilidade Sociambiental implantado	plano				1,00				4.000.000,00
Produto 10: Mulheres profissionalmente capacitadas para inserção no mercado de trabalho	mulheres				172,00				424.000,00
Produto 11: Plano de entidades parceiras conveniadas e fortalecidas elaborado	plano				1,00				1.250.000,00
Produto 12: Plano de Controle Integral de Parasitose elaborado	plano				1,00				600.000,00
Outros									
TOTAL									297.024.000,00
