
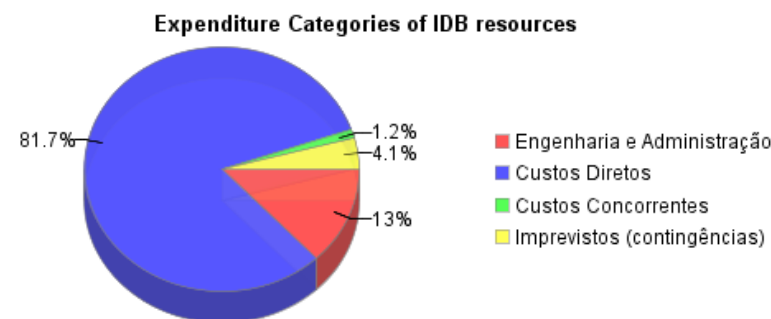
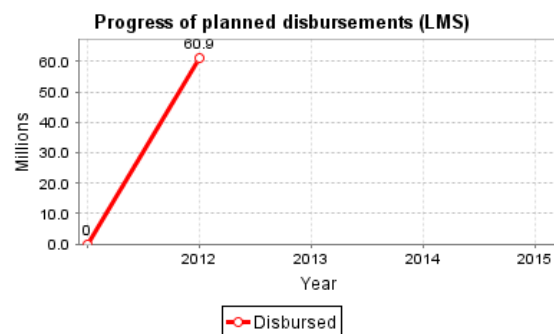



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	UGP Igarapes de Manaus				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2676/OC-BR	Current Approved Amount:	280.000.000,00	Original IDB:	280.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	60.901.500,00	Current IDB:	280.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	21,75	Pari-passu:	70,00
Related Operation(s):	BR-L1005, BR-L1164, BR-L1217, BR-X1017, RG-P1442	Balance:	219.098.500,00	Co-Financing/Country:	120.000.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	400.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: A	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 10-dic-2012 Validated by Country Representative: 10-dic-2012

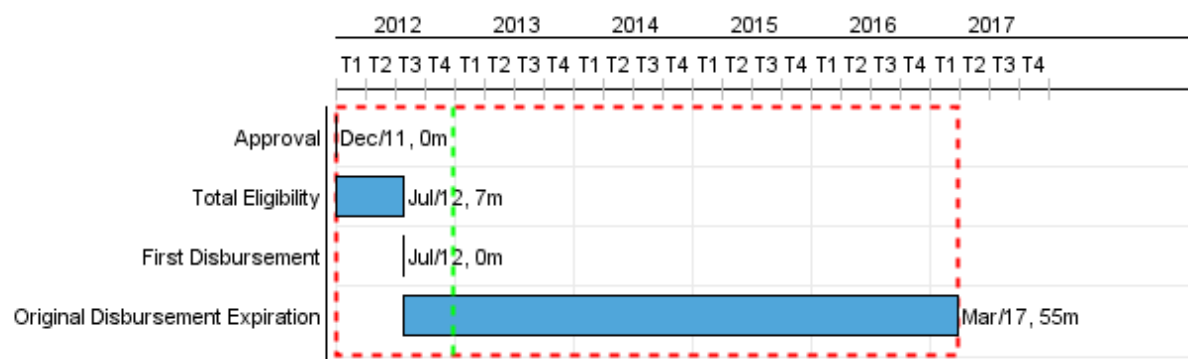

Accumulated Progress as of 2012

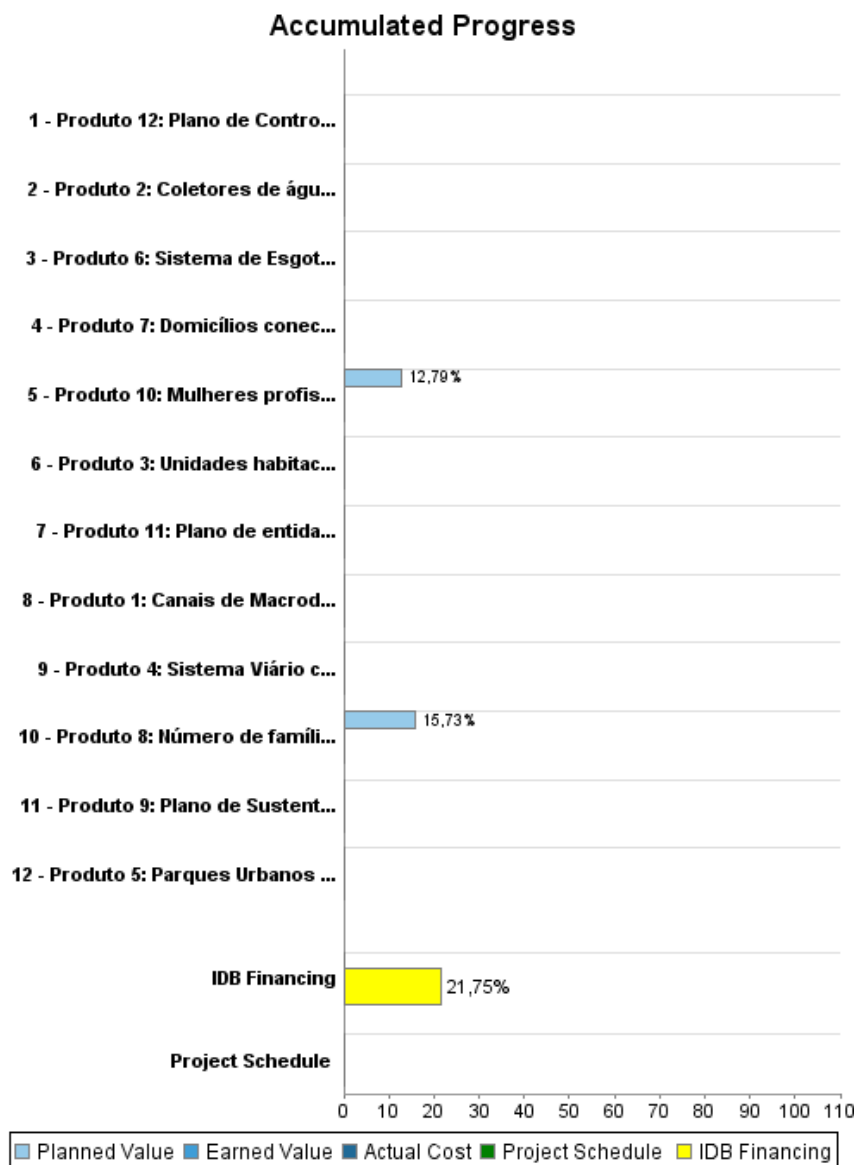

Outcomes

Outcome: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	End of project
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	22.40	2011	P							5.00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	59.00	2011	A							100.00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	67.00	2011	P							
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	430,000.00	2011	A							1,000.00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	42.80	2011	P							2.00
				A							

Outcome: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	End of project
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	45.00	2012	P							5.00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	15.00	2012	A							100.00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	139.00	2012	P							
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	930,000.00	2012	A							1,000.00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	4.60	2012	P							2.00
				A							

Outcome: Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	End of project
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	4.90	2011	P							5.00
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	3.00	2011	A							100.00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	21.00	2011	P							
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	36.00	2011	A							1,000.00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1.20	2011	P							2.00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1297 - Social and Environmental Program for the Igarapés in Manaus - PROSAMIM

III

2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 03/12/2012

				A							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Outcome:	Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	End of project
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	23.00	2012	P							5.00
				A							
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	8.00	2012	P							100.00
				A							
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	78.00	2012	P							
				A							
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	110,000.00	2012	P							1,000.00
				A							
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1.50	2012	P							2.00
				A							

Outcome:	Coleta e destinação adequada de esgoto das edificações das áreas das sub-bacia do São Raimundo realizada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Coleta e destinação adequada de esgoto das edificações das áreas da sub-bacia do São Raimundo	m3/dia		2011	P		1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	9.00
				A							

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional									
Produto 1: Canais de Macrodrenagem construídos	metros				2.491,00				20.616.000,00
Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	metros				27.584,00				3.686.000,00
Produto 3: Unidades habitacionais construídas	unidades habitacionais				1.242,00				91.656.000,00
Produto 4: Sistema Viário construído	metros				5.390,00				10.781.000,00
Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	m²				70.003,00				48.525.000,00
Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	sistema				1,00				51.509.000,00
Produto 7: Domicílios conectados	Domicílios				11.062,00				5.115.000,00
Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	famílias	152,00			3.959,00	9.260.000,00			58.862.000,00
Sustentabilidade Social e Institucional Ambiental									
Produto 9: Plano de Sustentabilidade Sociambiental implantado	plano				1,00				4.000.000,00
Produto 10: Mulheres profissionalmente capacitadas para inserção no mercado de trabalho	mulheres	22,00			172,00	54.230,00			424.000,00
Produto 11: Plano de entidades parceiras conveniadas e fortalecidas elaborado	plano				1,00				1.250.000,00
Produto 12: Plano de Controle Integral de Parasitose elaborado	plano				1,00				600.000,00
Outros									
Outros custos	N/A					5.176.000,00			102.976.000,00
TOTAL						14.490.230,00			400.000.000,00
