





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING				
Loan Number(s):	2797/OC-EC	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	96,00
Related Operation(s):	EC-L1074	Balance:	100.000.000,00	Co-Financing/Country:	4.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	104.000.000,00
				Amortization Period (months):	126

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 05-abr-2013 Validated by Country Representative: 08-abr-2013

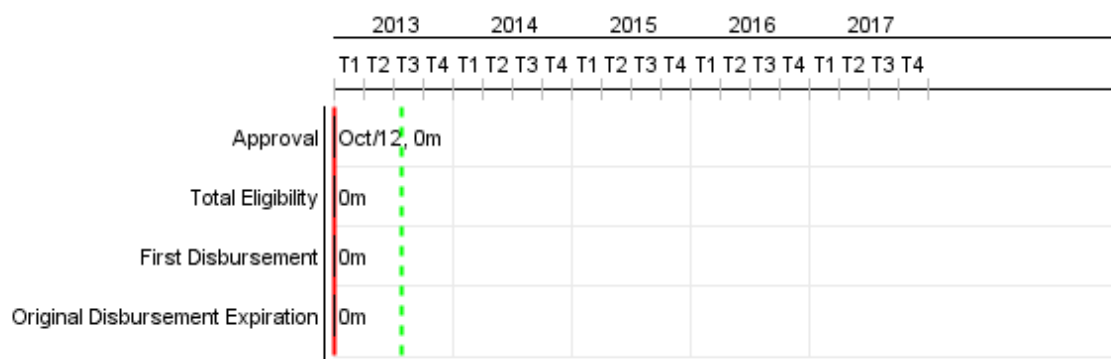

Accumulated Progress as of 2012

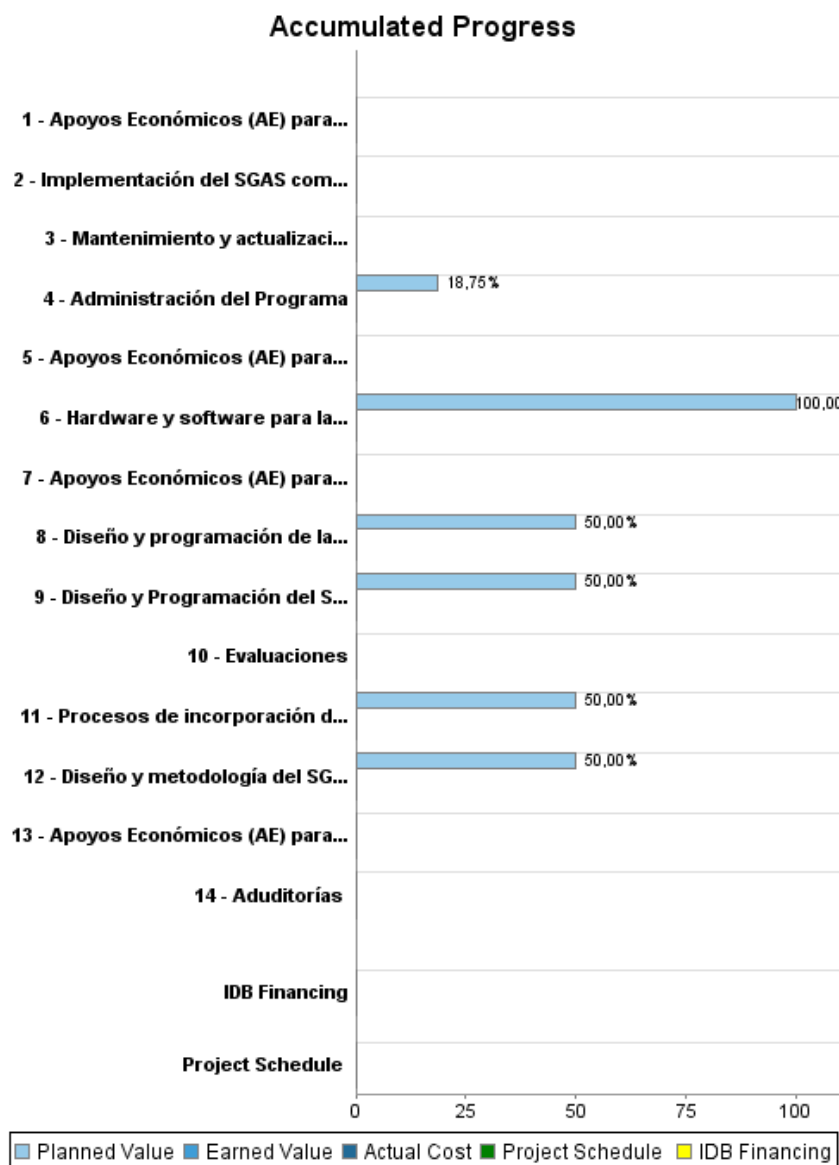

Outcomes

Outcome:	Condiciones habitacionales de las familias beneficiadas vulnerables en la zona de intervencion del proyecto, mejoradas
Suppositions:	Familias beneficiadas cuentan con escrituras o documentos legales en las zonas de intervencion y demas requerimientos o requisitos.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de hogares beneficiarios con jefe de hogar no compartido (priorizando mujeres jefas de hogar)	Porcentaje	5,00	2006	P A	10,00
Porcentaje de hogares beneficiarios miembros discapacitados.	Porcentaje	4,00	2006	P A	8,00
Porcentaje de hogares beneficiarios con tres niños y más.	Porcentaje	30,00	2006	P A	40,00
Porcentaje de hogares de los grupos vulnerables, beneficiarios del programa.	Porcentaje	58,00	2006	P A	100,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
COMPONENTE 1. APOYOS ECONOMICOS DE VIVIENDA									
Apoyos Económicos (AE) para viviendas rurales, entregados	Apoyos Económicos				13.166,00				78.996.000,00
Apoyos Económicos (AE) para provisión de agua para viviendas rurales	Hogares				2.008,00				1.004.000,00
Apoyos Económicos (AE) para viviendas urbano marginales, entregados	Apoyos Económicos				2.500,00				15.000.000,00
Apoyos Económicos (AE) para viviendas urbanas, entregados	Apoyos Económicos				666,00				4.000.000,00
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DEL MIDUVI									
Hardware y software para la operatividad del sistema SIIDUVI (Módulo 1 - Ingreso de información postulantes), entregado	Equipamiento				1,00				750.000,00
Procesos de incorporación de los criterios de vulnerabilidad para Asignar AE en el Módulo 2 - Calificación Postulantes del SIIDUVI, diseñados	Diseño				1,00				100.000,00
Diseño y programación de las Certificaciones Técnicas para el Módulo 4 - Contrataciones del SIIDUVI, en base al Sistema de Gestion Ambiental y Social SGAS, finalizadas	Programación				1,00				100.000,00
Diseño y Programación del Sistema de Seguimiento del Programa Postbeneficio para el Módulo 5 - Seguimiento Post Beneficio del SIIDUVI, finalizados	Programación				1,00				100.000,00
Mantenimiento y actualización del SIIDUVI en los módulos pertinentes, finalizada	Informe				1,00				50.000,00
Diseño y metodología del SGAS para el Módulo 4 - Contrataciones, completado	Metodología				1,00				200.000,00
Implementación del SGAS completada para el SIIDUVI	Implementación				1,00				2.000.000,00
COMPONENTE 3. GESTION DEL PROGRAMA									
Administración del Programa	Administración				5,00				1.100.000,00
Aduditorías	Auditorías				4,00				400.000,00
Evaluaciones	Evaluaciones				3,00				200.000,00
TOTAL									104.000.000,00
