

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	UGP Igarapes de Manaus
Secteur:	WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s):	2676/OC-BR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1005, BR-L1164, BR-L1217, BR-X1017, RG-P1442
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	280.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	62.248.483,38
% Décaissé:	22,23
Solde:	217.751.516,62

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	280.000.000,00
Courant BID:	280.000.000,00
Pari Passu:	70,00
Cofinancement/Pays:	120.000.000,00
Estimation Initiale:	400.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	A
---	---

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division:	26-sep-2013
Validé par le Représentant:	27-sep-2013

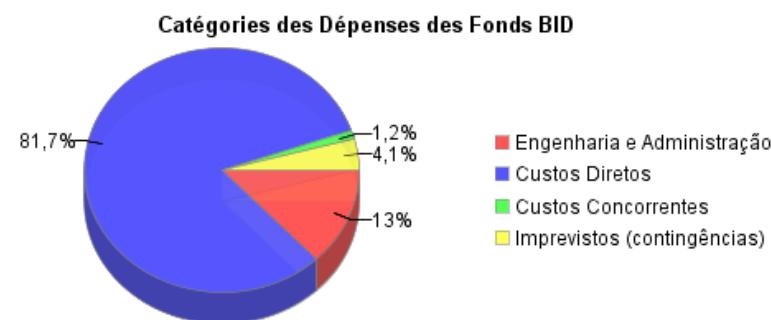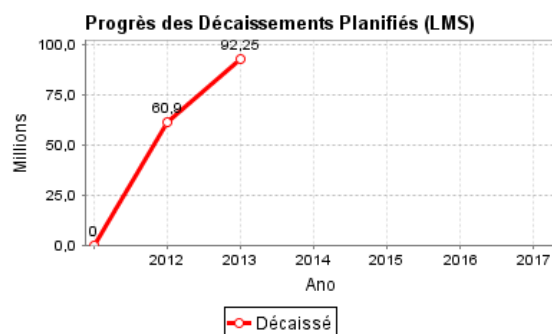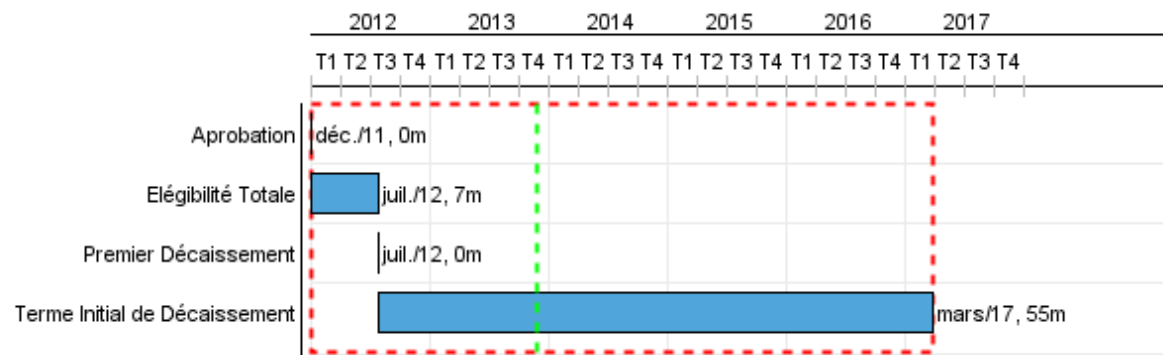

Progrès Cumulé à 2013

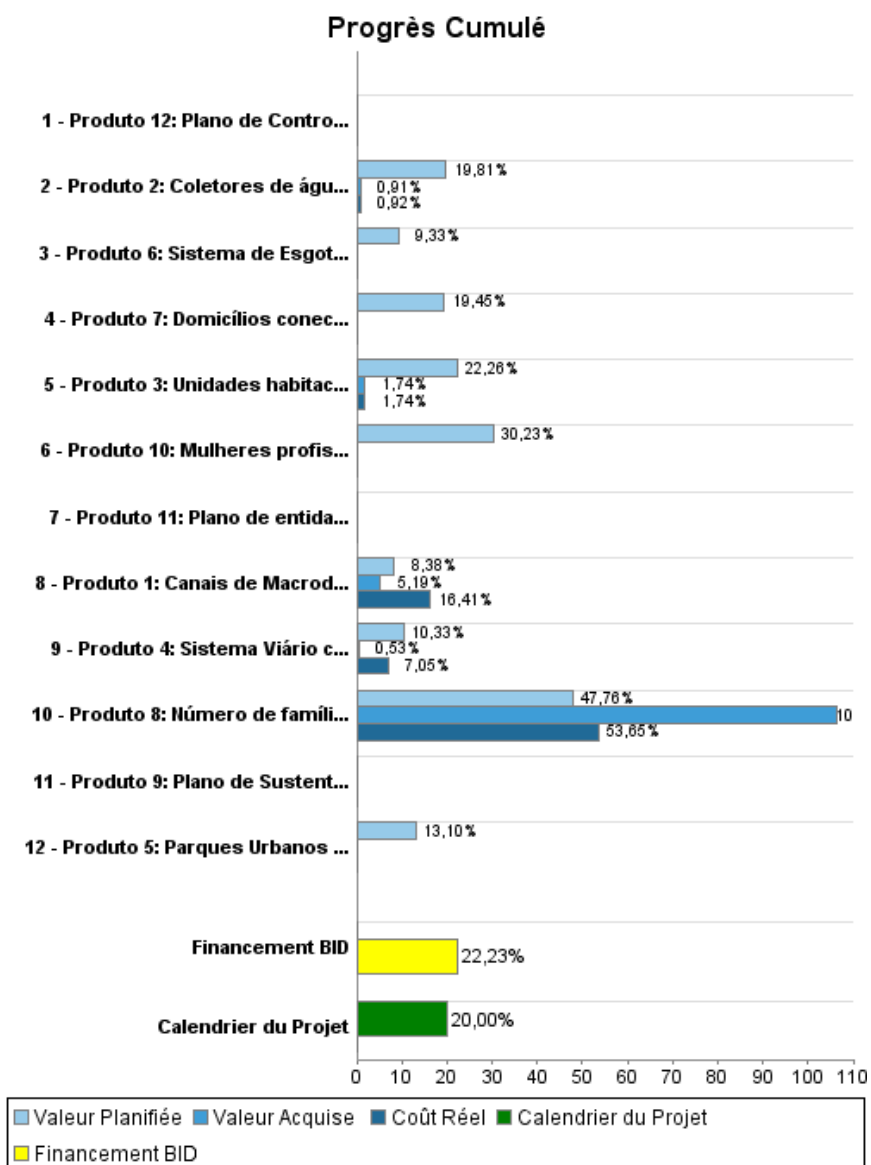

Résultats

Résultat: Qualité da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	22,40	2011	P A							5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	59,00	2011	P A							100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	67,00	2011	P A							
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	430.000,00	2011	P A							1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	42,80	2011	P A							2,00

Résultat: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	45,00	2012	P A		25,00					5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	15,00	2012	P A		22,00					100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	139,00	2012	P A		62,00					
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	930.000,00	2012	P A		43.000.000,00					1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	4,60	2012	P A		8,70					2,00

Résultat: Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	4,90	2011	P A							5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	3,00	2011	P A							100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	21,00	2011	P A							

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1297 - Social and Environmental Program for the Igarapés in Manaus - PROSAMIM
III

2013 1º período com cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 26/09/2013

Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	36,00	2011	P							1.000,00
				A							
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1,20	2011	P							2,00
				A							

Résultat:	Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	23,00	2012	P							5,00
				A		24,00					
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	8,00	2012	P							100,00
				A		76,00					
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	78,00	2012	P							
				A		65,00					
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	110.000,00	2012	P							1.000,00
				A		91.000.000,00					
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1,50	2012	P							2,00
				A		14,30					

Résultat:	Coleta e destinação adequada de esgoto das edificações das áreas das sub-bacia do São Raimundo realizada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Coleta e destinação adequada de esgoto das edificações das áreas da sub-bacia do São Raimundo	m3/dia		2011	P		1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	9,00
				A							
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Domicílios		2013	P							
				A							

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional									
Produto 1: Canais de Macrodrenagem construídos	metros	339,13	210,08		2.491,00	1.727.260,00	3.382.550,00		20.616.000,00
Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	metros	4.570,23	210,24		27.584,00	730.300,00	33.950,00		3.686.000,00
Produto 3: Unidades habitacionais construídas	unidades habitacionais	180,00			1.242,00	18.816.400,00			91.656.000,00
Produto 4: Sistema Viário construído	metros	388,05	20,00		5.390,00	1.114.210,00	759.660,00		10.781.000,00
Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	m²	13.295,24			70.003,00	6.359.180,00			48.525.000,00
Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	sistema				1,00	4.803.590,00			51.509.000,00
Produto 7: Domicílios conectados	Domicílios	3.012,00			11.062,00	994.890,00			5.115.000,00
Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	famílias	1.268,00	850,00		3.959,00	18.852.490,00	15.464.610,00		58.862.000,00
Sustentabilidade Social e Institucional Ambiental									
Produto 9: Plano de Sustentabilidade Sociambiental implantado	plano				1,00				4.000.000,00
Produto 10: Mulheres profissionalmente capacitadas para inserção no mercado de trabalho	mulheres	30,00			172,00	73.950,00			424.000,00
Produto 11: Plano de entidades parceiras conveniadas e fortalecidas elaborado	plano				1,00				1.250.000,00
Produto 12: Plano de Controle Integral de Parasitose elaborado	plano				1,00				600.000,00
Outros									
Outros custos	N/A					10.300.000,00	4.065.510,00		102.976.000,00
TOTAL						63.772.270,00	23.706.280,00		400.000.000,00
