
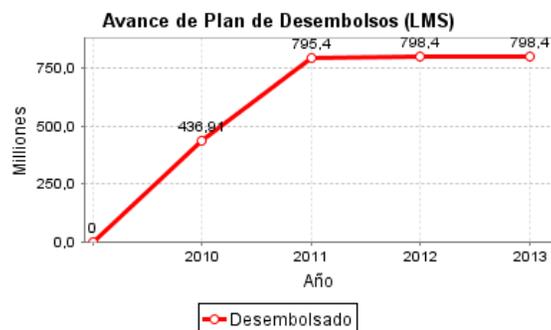


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)	Monto Aprobado Actual:	800.000.000,00	BID Original:	800.000.000,00
Sector:	ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS	Monto Desembolsado a la fecha:	798.404.416,99	Actual BID:	800.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	1686/OC-VE-1	% Desembolsado:	99,80	Pari-passu:	100,00
Etapas:	Approved	Saldo:	1.595.583,01	Co-financiamiento/País:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	800.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	VE-L1003			Período de Amortización (meses):	156
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 07-oct-2013 Validado por Representante de País:

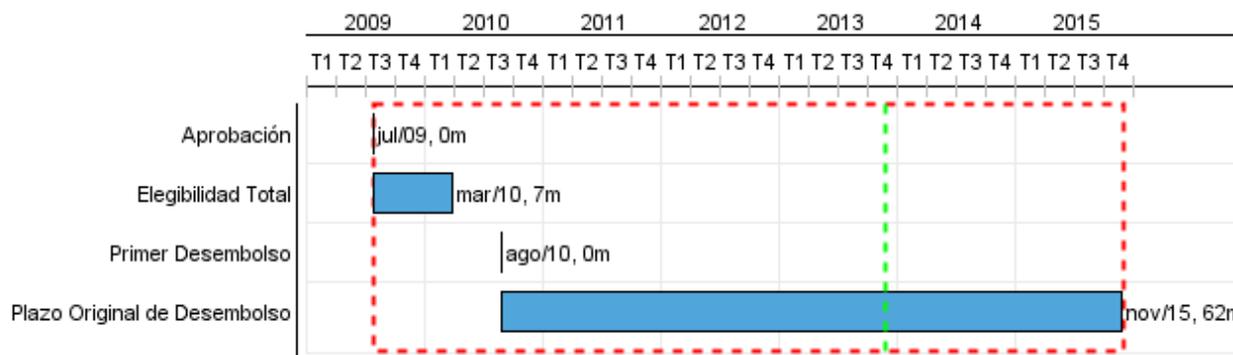

Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Producción Energética incrementada
Supuestos:	Considerando que se cumple con el inicio de operaciones de la primera unidad en octubre de 2012

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Producción Energética Anual TOCOMA	GWh		2003	P A	1.854,00	11.126,00	18.543,00	18.545,00	18.545,00

Resultado:	Costo Promedio de la Capacidad Instalada reducido
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Costo Promedio de la Capacidad Instalada	US\$/MW		2011	P A			2.245,00	2.245,00	2.245,00

Resultado:	Costo Promedio de la Energía Producida reducido
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Costo Promedio de la Energía Producida	US\$/KWh		2003	P A			5,87	5,87	5,87

Resultado:	Deuda de la empresa Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) reducida
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Relación entre deuda financiera total y EBITDA (Earning Before Interest , Tax Depreciation and Amortization) de EDELCA	Indice	1,80	2011	P A			2,99	2,99	2,99

Resultado:	Nivel de Ingreso de las Familias Reubicadas mantenido
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Nivel de Ingresos Anuales de las Familias reubicadas/compensadas a precios de 2003	Bs	250.000,00	2011	P A				250.000,00	250.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Central Hidroeléctrica					
Central Hidroeléctrica Operando	Unidad				1,00
Conjunto de Unidades de generación de 216 MW con operación comercial iniciada	Unidades de Generación				1,00
Líneas de Transmisión y Subestaciones					
Conjunto de Líneas de Transmisión de 400KV operando	unidad	1,00			1,00
Subestaciones Operando	unidad	2,00			2,00
Protección Ambiental					
Programa de Protección Ambiental Implementado	Informes				1,00
Ingeniería, Administración y Auditoría					
Ingeniería y Supervisión	N/A				
Administración	N/A				
Auditoría Externa	N/A				
Sin Asignación Específica					
Imprevistos	N/A				
Escalamiento	N/A				
Gastos Financieros					
Intereses	N/A				
Comisión de Compromiso	N/A				
