
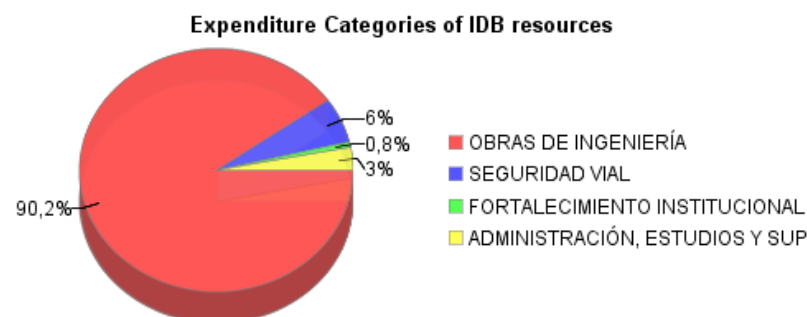
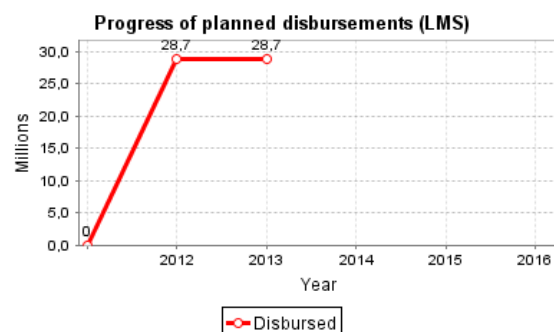



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Sector:	TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY				
Loan Number(s):	2698/OC-AR	Current Approved Amount:	300.000.000,00	Original IDB:	300.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	28.698.000,00	Current IDB:	300.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	9,57	Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):	AR-L1014, RG-P1478	Balance:	271.302.000,00	Co-Financing/Country:	33.500.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	333.500.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-oct-2013

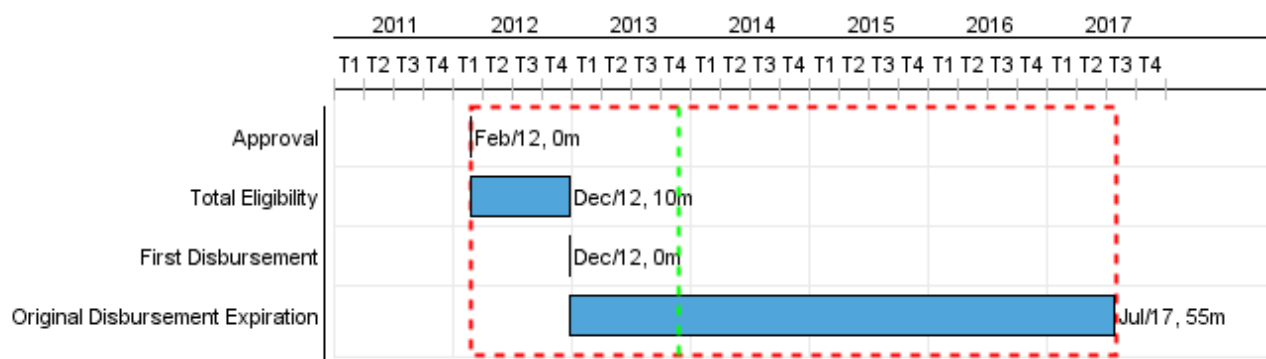

Accumulated Progress as of 2013

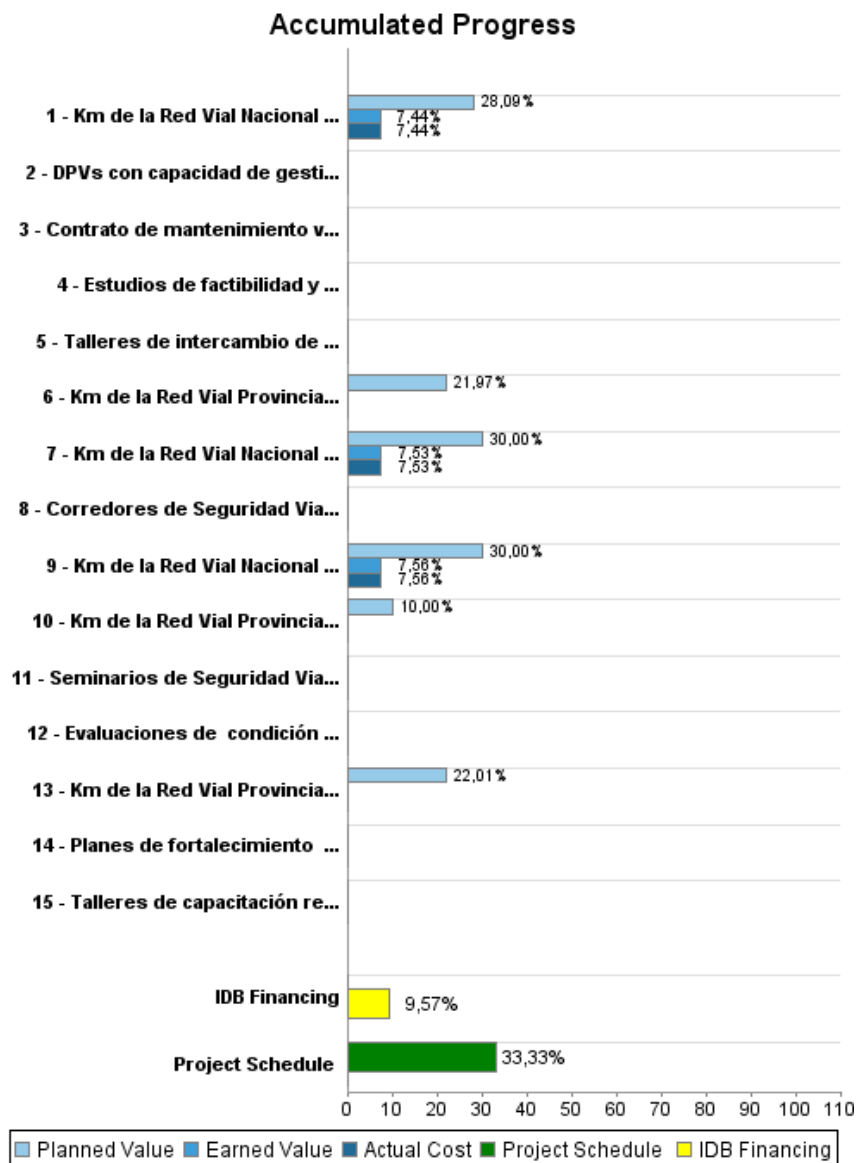

Outcomes

Outcome:	Mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la RVN y vías alimentadoras de la RVP en la RNG, mediante la ampliación, rehabilitación y mejora de corredores viales que conectan centros de producción con mercados locales y externos.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Costo de operación vehicular en los tramos mejorados y pavimentados por el Programa en la Provincia de Chaco	US\$ Constantes/ vehículo/kilómetro	0,63	2011	P A	0,41
Costo de operación vehicular en los tramos mejorados y pavimentados por el Programa en la Provincia de Jujuy (US\$ Constantes/ vehículo/kilómetro)	US\$ Constantes/ vehículo/kilómetro	0,39	2011	P A	0,34
Costo de operación vehicular en los tramos mejorados y pavimentados por el Programa en la Provincia de Salta (US\$ Constantes/ vehículo/kilómetro)	US\$ Constantes/ vehículo/kilómetro	0,75	2008	P A	0,59
Número de días por año de no transitabilidad (vías cerradas al tránsito) o con restricciones severas a la circulación en PR N°1, Chaco.	vías	18,00	2011	P A	
Índice de accesibilidad de las vías pavimentadas en la RNG (km de vías pavimentadas por cada 1000 km2 de superficie)	km de vías pavimentadas por cada 1000 km2 de superficie	24,01	2011	P A	24,05
Tránsito Medio Diario Anual en los tramos intervenidos (veh/día). (RN N° 16 Tramo 6, Salta)	veh/día	618,00	2009	P A	904,00
Tránsito Medio Diario Anual en los tramos intervenidos (veh/día). (RP N°1 Chaco)	veh/día	434,00	2011	P A	553,00
Tránsito Medio Diario Anual en los tramos intervenidos (veh/día). (RP N°1 Jujuy)	veh/día	6.547,00	2010	P A	7.526,00
Índice de Rugosidad Internacional (RN N° 16 Tramo 6, Salta)	Índice	4,33	2011	P A	1,97
Índice de Rugosidad Internacional (RN N°16 Tramo 7, Salta)	Índice	5,16	2011	P A	2,00
Índice de Rugosidad Internacional (RP N°1 Chaco)	Índice	11,06	2011	P A	2,47
Índice de Rugosidad Internacional (RN N° 16 Tramo 6, Salta)	Índice	3,60	2011	P A	2,10

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Obras de Ingenieria									
Km de la Red Vial Nacional en la Región del Norte Grande Rehabilitados. Ruta Nacional Nº 16 - Tramo "Saenz Peña-Limite con Santiago del Estero" Seccion 1: Fin Paso por Saenz Peña (Km 180,46) - Alte Brown (Km 220,85). Provincia de Chaco (40,40 Km)	Kilómetros				40,40	12.836.766,00	3.235.471,00		42.789.222,00
Km de la Red Vial Nacional en la Región del Norte Grande Rehabilitados. Ruta Nacional Nº 16 - Tramo "Saenz Peña-Limite con Santiago del Estero" Seccion 2: Alte Brown (Km 220,85) - Establ. Las Tres Marias (Km 262,00). (41, 15Km)	Kilómetros				41,15	13.369.054,00	3.542.071,00		47.596.849,87
Km de la Red Vial Nacional en la Región del Norte Grande Rehabilitados. Ruta Nacional Nº 16 - Tramo "Saenz Peña-Limite con Santiago del Estero" Seccion 3: Establ. Las Tres Marias (Km 262,00) - Lim. Chaco/ Santiago del Estero (Km 318,90). (56,9 Km)	Kilómetros				56,90	13.835.750,00	3.474.577,00		46.119.167,85
Km de la Red Vial Provincial en la Región del Norte Grande Ampliados. Ruta Provincial Nº 1, Tramo: San Salvador de Jujuy - Palpala. Provincia de Jujuy (7,51km)	Kilómetros				7,51	7.313.281,00			73.132.814,56
Km de la Red Vial Provincial de la Región del Norte Grande Mejorados. Ruta Provincial Nº20, Tramo: Intersección RP Nº3 - Intersección RN Nº95, Sección 1. Provincia de Formosa. (22, 38km)	Kilómetros				22,38	11.346.914,00			51.640.121,00
Km de la Red Vial Provincial de la Región del Norte Grande Mejorados. Ruta Provincial Nº20, Tramo: Intersección RP Nº3 - Intersección RN Nº95, Sección 2. Provincia de Formosa. (21, 11km)	Kilómetros				21,11	10.255.020,00			46.600.659,70
Contrato de mantenimiento vial por estándares de servicio finalizado	Contratos				1,00				
Componente 2: Seguridad Vial									

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1133 - NORTE GRANDE ROAD INFRASTRUCTURE PROGRAM II
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 20/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Evaluaciones de condición de seguridad vial en tramos de rutas seleccionadas aprobadas	Evaluaciones				2,00				10.000.000,00
DPVs con capacidad de gestión de seguridad vial mejorada	DPVs				4,00				2.000.000,00
Seminarios de Seguridad Vial realizados	Seminarios				4,00				4.000.000,00
Corredores de Seguridad Vial finalizados	Corredores				1,00				2.000.000,00
Componente 3: Fortalecimiento Institucional									
Planes de fortalecimiento Institucional para las DPVs finalizado. (9)	Planes				2,00				1.500.000,00
Talleres de capacitación realizados para el personal de la UEP, de las DPVs y la DNV.	Talleres				2,00				400.000,00
Talleres de intercambio de experiencias en gestión vial de las DPVs realizados.	Talleres				2,00				500.000,00
Componente 4: Administración, Estudios y Supervisión.									
Estudios de factibilidad y diseños finales de ingeniería disponibles para el llamado a licitación aprobados. (10)	Estudios				2,00				5.000.000,00
Gastos Administrativos y de Auditoría	N/A					500.000,00			4.000.000,00
TOTAL						69.456.785,00	10.252.119,00		337.278.834,98
