
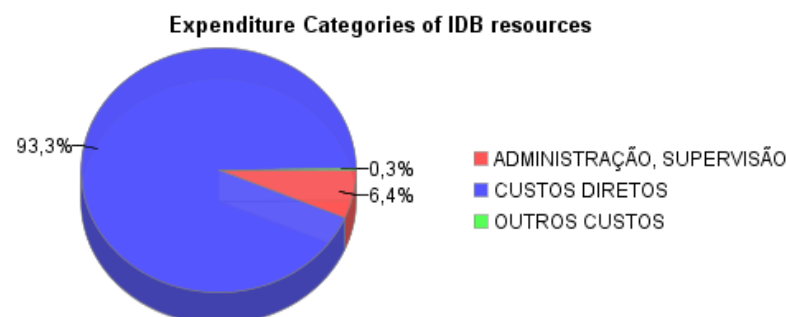
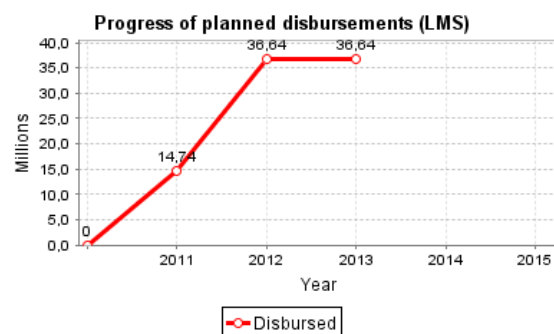



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO				
Sector:	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT				
Loan Number(s):	2321/OC-BR	Current Approved Amount:	150.000.000,00	Original IDB:	150.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	36.637.000,00	Current IDB:	150.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	24,42	Pari-passu:	60,00
Related Operation(s):	BR-X1008	Balance:	113.363.000,00	Co-Financing/Country:	100.000.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	250.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-sep-2013

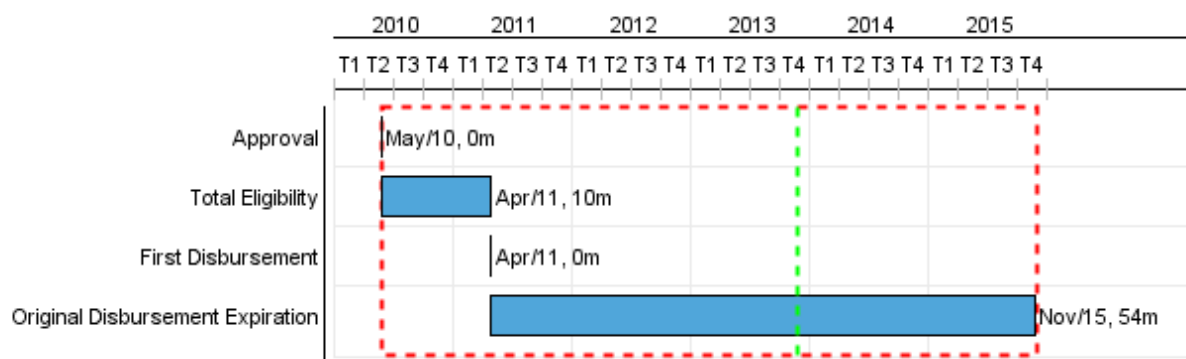


Accumulated Progress as of 2013

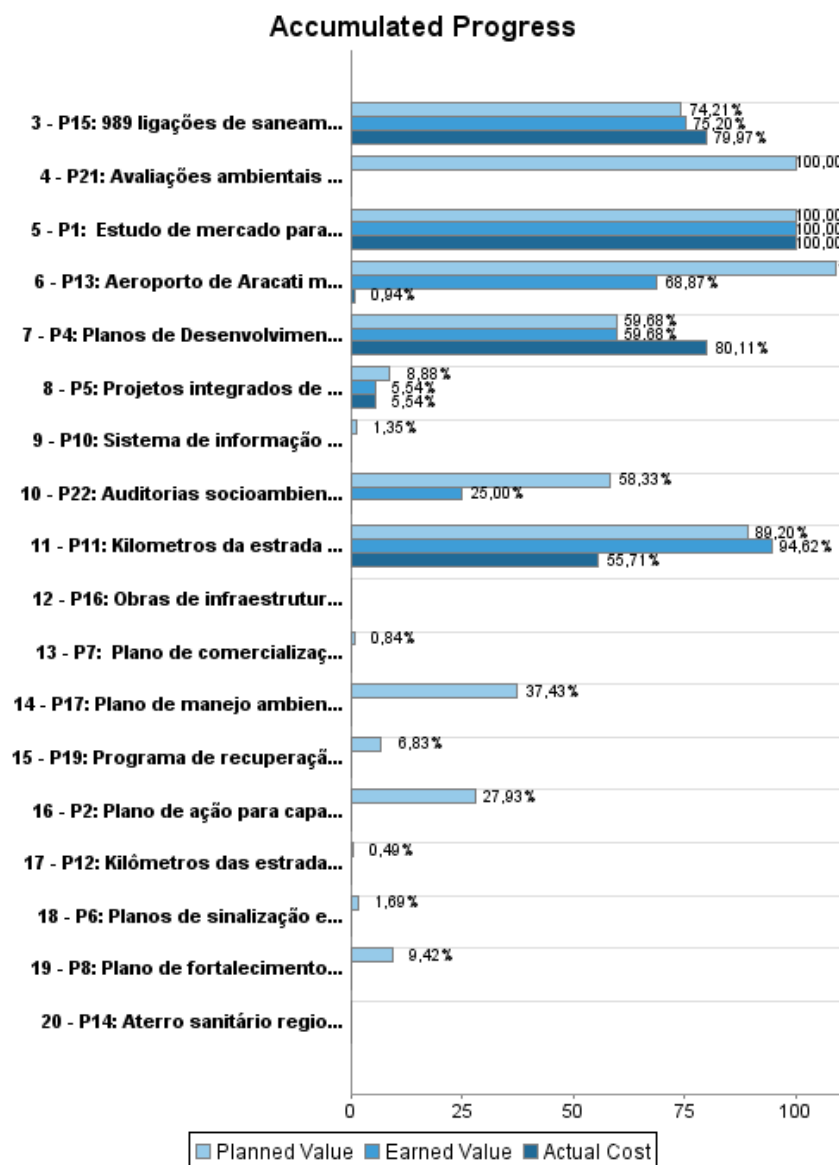

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1204 - National Tourism Development Program (PRODETUR-Ceará)
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Accumulated Progress

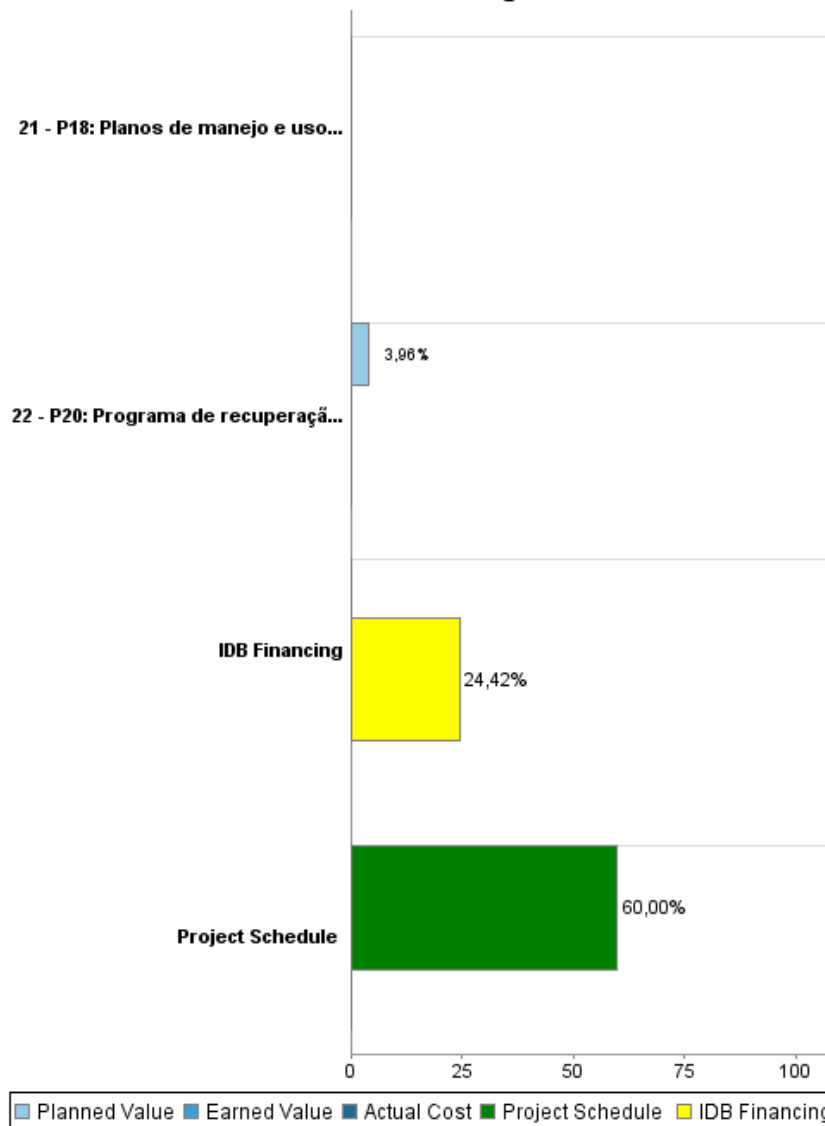

Outcomes

Outcome:	R1: Gastos Realizados pelos Turistas no Estado Incrementado
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Gasto médio diário de estadia por turista	R\$/Dia	132,20	2008	P A	156,30	156,30

Outcome:	R2: Oferta turística do Estado melhorada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Satisfação dos turistas pelos serviços turísticos oferecidos em cada destino do Programa	%		2009	P A	60,00	60,00
Investimentos privados em hotelaria	Milhões R\$	549,70	2008	P A	1.705,40	1.705,40

Outcome:	R4: Demanda turística do Litoral Leste e Serras diversificada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Novos sub-segmentos de turismo de sol e praia no litoral leste	Sub-segmentos		2009	P A	2,00	2,00
Novos sub-segmentos de atrativo natural e cultural em cada polo das serras	Sub-segmentos		2009	P A	1,00	1,00

Outcome:	R5: Administrações turísticas em todos os níveis dos destinos turísticos intervindos fortalecidas
Comments:	Os indicadores específicos e os meios de verificação serão propostos em função das intervenções necessárias que se identificarão a partir do diagnóstico institucional e do plano de fortalecimento que se levará a cabo.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Governos Municipais e subnacionais apoiados	Governos		2011	P A	9,00	9,00

Outcome:	R6: Serviços públicos dos destinos turísticos selecionados melhorados
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Turistas satisfeitos com a infraestrutura de cada destino turístico	%	41,70	2008	P A	67,00	67,00
Volume de esgoto tratado com respeito ao total gerado	%		2009	P A	70,00	70,00
Tempo médio do deslocamento entre as atrações turísticas	%		2006	P A	50,00	50,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1204 - National Tourism Development Program (PRODETUR-Ceará)
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 23/09/2013

Outcome: R7: Uso sustentável dos recursos naturais e culturais básicos do turismo melhorados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Turistas satisfeitos com o estado de conservação dos recursos naturais em cada um dos três polos	%	90,60	2009	P A	95,00	95,00
Zonas naturais de interesse turístico do litoral com uso regulamentado e processo de degradação controlado.	%	33,00	2009	P A	100,00	100,00

Outcome: R3: Oferta turística do estado diversificada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Novos produtos turísticos vinculados a natureza, aventura e/ou cultura comercializados por operadores	produtos		2009	P A	2,00	2,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I: Estrategia de producto turístico									
P1: Estudo de mercado para os três pólos realizado	estudos				1,00				1.563.000,00
P2: Plano de ação para capacitação de mão de obra do setor turístico implementado	Plano				1,00	169.000,00			605.000,00
P3: Plano de ação para apoiar o empresário turístico de pequena e média escala implementado	Plano				1,00	170.000,00			605.500,00
P4: Planos de Desenvolvimento Integral de Turismo Sustentável (PDITS) para os três pólos revisados	Planos	1,00			3,00	37.000,00			186.000,00
P5: Projetos integrados de valorização de atrativos turísticos em oitos destinos selecionados implementados.	projetos				8,00	1.641.000,00			53.895.000,00
P6: Planos de sinalização e interpretação turística nos três pólos implementados	Planos				3,00	30.000,00			1.778.000,00
Componente II: Estrategia de comercialización									
P7: Plano de comercialização dos três pólos implementado	planos				3,00	214.000,00			25.444.000,00
Componente III: Fortalecimiento institucional									
P8: Plano de fortalecimento institucional das entidades públicas e privadas que participam da atividade turística implementado	plano				1,00	300.000,00			5.000.000,00
P9: Bases cartográficas georeferenciadas realizadas.	Base Cartográfica				8,00				2.222.000,00
P10: Sistema de informação turística estatal compatível com os sistemas estatísticos a nível federal implementado.	sistema				1,00	30.000,00			2.222.000,00
Componente IV: Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo turístico									
P11: Kilometros da estrada CE-040, duplicados	Kilometers				100,00	6.043.000,00			55.753.000,00
P12: Kilômetros das estradas de acesso a importantes praias e lugares turísticos melhorados	Kilometers				61,00	54.000,00			11.061.400,00
P13: Aeroporto de Aracati melhorado	projeto	1,00	1,00		1,00	6.038.000,00			8.889.000,00
P14: Aterro sanitário regional dos resíduos sólidos em Aracati estabelecido	Projeto				1,00				2.507.000,00
P15: 989 ligações de saneamento básico para o setor hoteleiro e turístico do Porto das Dunas, implantado.	Households	300,00			989,00	5.550.000,00	1.066.000,00		22.382.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
P16: Obras de infraestrutura de interesse turístico nos pólos de Ibiapaba e de Maciço de Baturité para uso dos turistas realizadas	Obras				10,00				32.777.000,00
Componente V: Gestión ambiental									
P17: Plano de manejo ambiental do destino turístico de Canoa Quebrada implementado	plano				1,00	333.000,00			1.333.000,00
P18: Planos de manejo e uso público de áreas de interesse ambiental e turística dos destinos selecionados do Litoral, desenvolvidos	Planos				2,00				1.778.000,00
P19: Programa de recuperação ecológica de zonas de interesse turístico em processo de degradação no Maciço de Baturité implementado	programa				1,00	167.000,00			2.444.000,00
P20: Programa de recuperação ecológico da zona de interesse turístico em processo de degradação da Chapada da Ibiapaba implementado	programa				1,00	167.000,00			4.222.000,00
P21: Avaliações ambientais estratégicas realizadas	AAE	3,00			3,00	111.000,00			111.000,00
P22: Auditorias socioambientais da execução dos investimentos em obras selecionadas realizadas	Auditorias	1,00			4,00	74.000,00			222.000,00
Administración del Programa									
Administração, Auditoria e Avaliações	N/A					2.600.000,00	799.000,00		13.000.000,00
TOTAL						23.728.000,00	1.865.000,00		249.999.900,00
