
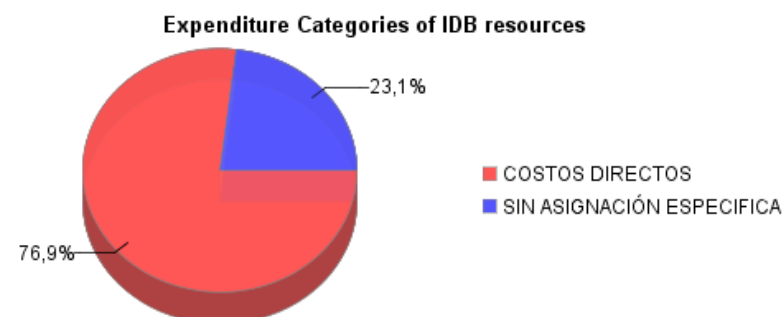
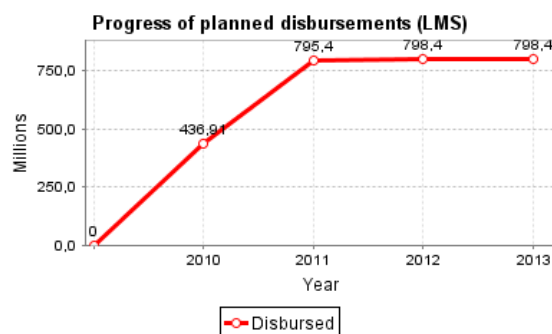


Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)				
Sector:	ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS				
Loan Number(s):	1686/OC-VE-1	Current Approved Amount:	800.000.000,00	Original IDB:	800.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	798.404.416,99	Current IDB:	800.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	99,80	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	VE-L1003	Balance:	1.595.583,01	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	SUP - Supplementary Financing			Original Estimate:	800.000.000,00
				Amortization Period (months):	156

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: A	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 07-oct-2013 Validated by Country Representative:

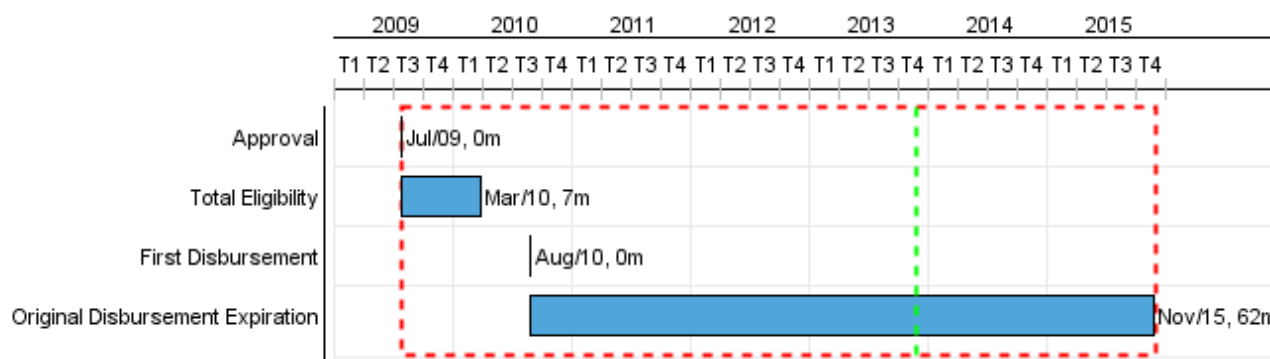

Accumulated Progress as of 2013

Accumulated Progress

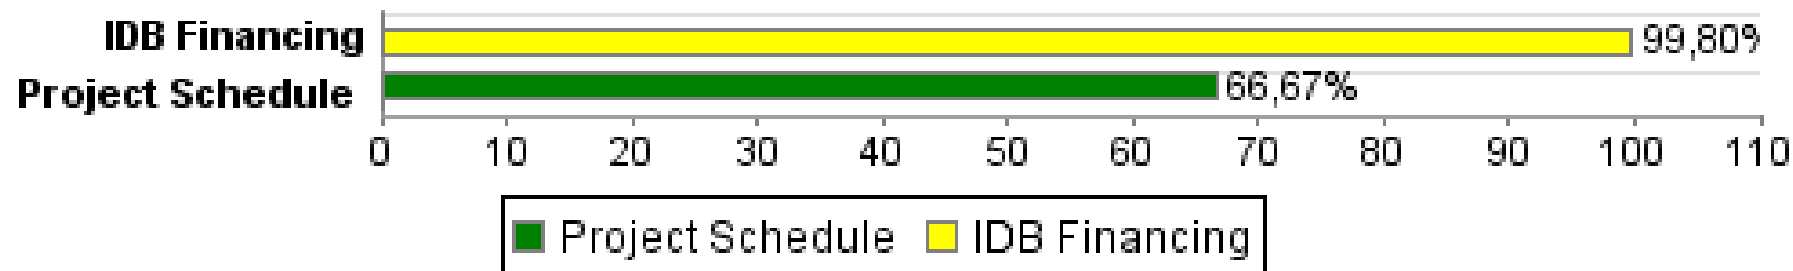

Outcomes

Outcome:	Producción Energética incrementada
Suppositions:	Considerando que se cumple con el inicio de operaciones de la primera unidad en octubre de 2012

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Producción Energética Anual TOCOMA	GWh		2003	P A	1.854,00	11.126,00	18.543,00	18.545,00	18.545,00

Outcome:	Costo Promedio de la Capacidad Instalada reducido
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Costo Promedio de la Capacidad Instalada	US\$/MW		2011	P A			2.245,00	2.245,00	2.245,00

Outcome:	Costo Promedio de la Energía Producida reducido
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Costo Promedio de la Energía Producida	US\$/KWh		2003	P A			5,87	5,87	5,87

Outcome:	Deuda de la empresa Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) reducida
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Relación entre deuda financiera total y EBITDA (Earning Before Interest , Tax Depreciation and Amortization) de EDELCA	Indice	1,80	2011	P A			2,99	2,99	2,99

Outcome:	Nivel de Ingreso de las Familias Reubicadas mantenido
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Nivel de Ingresos Anuales de las Familias reubicadas/compensadas a precios de 2003	Bs	250.000,00	2011	P A				250.000,00	250.000,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units
Central Hidroeléctrica					
Central Hidroeléctrica Operando	Unidad				1,00
Conjunto de Unidades de generación de 216 MW con operación comercial iniciada	Unidades de Generación				1,00
Líneas de Transmisión y Subestaciones					
Conjunto de Líneas de Transmisión de 400KV operando	unidad	1,00			1,00
Subestaciones Operando	unidad	2,00			2,00
Protección Ambiental					
Programa de Protección Ambiental Implementado	Informes				1,00
Ingeniería, Administración y Auditoría					
Ingeniería y Supervisión	N/A				
Administración	N/A				
Auditoría Externa	N/A				
Sin Asignación Específica					
Imprevistos	N/A				
Escalamiento	N/A				
Gastos Financieros					
Intereses	N/A				
Comisión de Compromiso	N/A				
