



Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Reducción de Vulnerabilidad en AUP en San Salvador	Loan Number:	2630/OC-ES
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		
Team Leader:	Tejerina,Luis R.	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1016	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1016	\$50,000,000.00	\$500,000.00	1.00%	\$49,500,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

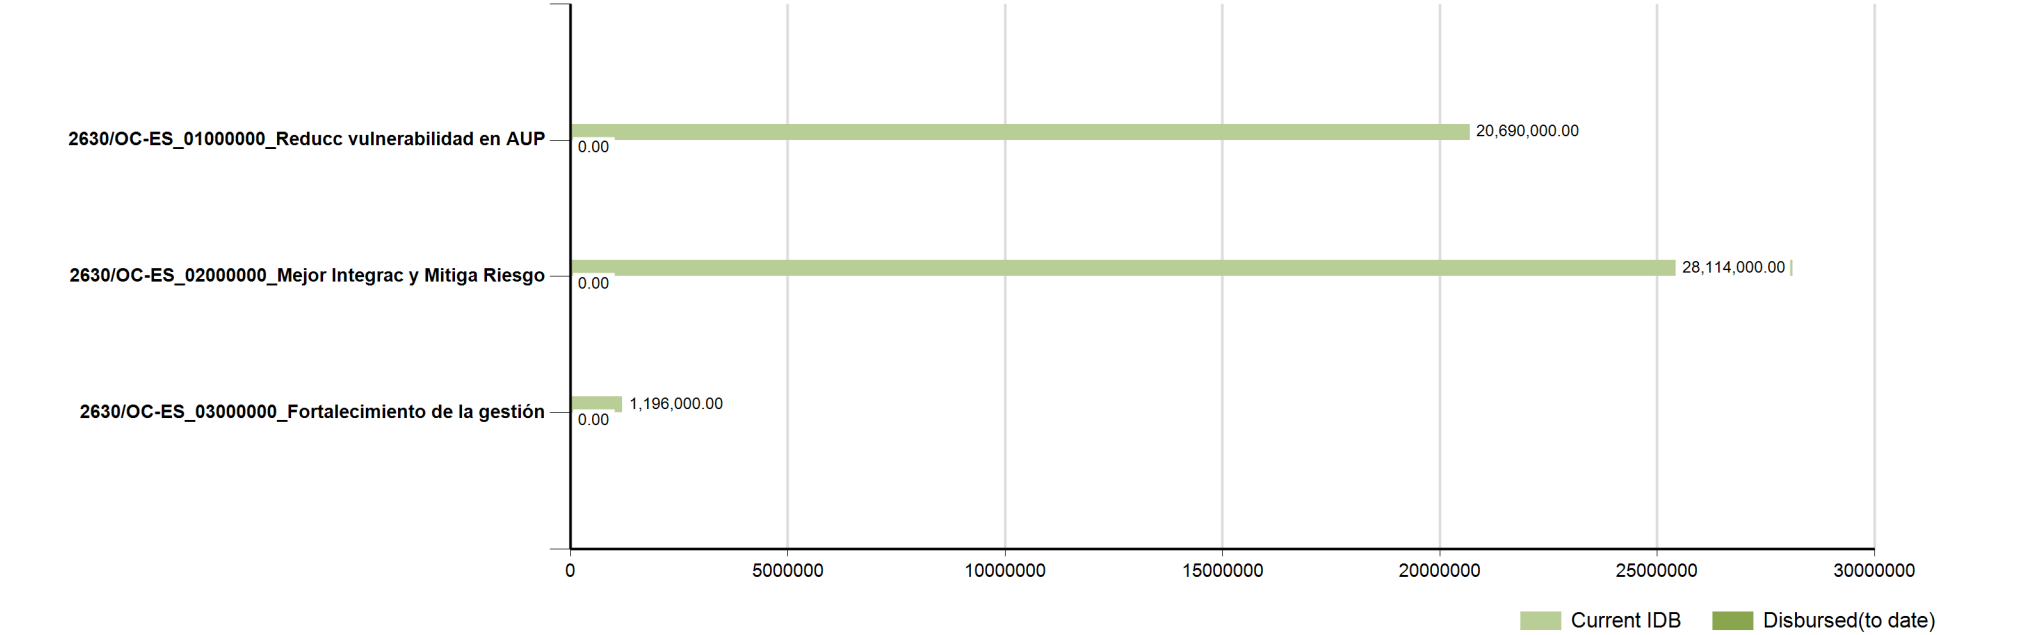

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mejoradas							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Familias afectadas por inundaciones y/o deslizamientos en un período de 12 meses en los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) seleccionados		Porcentaje	17.00	2011	Encuesta de vulnerabilidad	La meta está planteada en base a tormentas con un periodo de retorno de 50 años.	P	0.00
							P(a)	0.00
							A	
1.2 Incremento en el valor del terreno en Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) beneficiarios		Porcentaje	0.00	2011	Peritaje sobre precios de terrenos en AUP beneficiarios.		P	25.00
							P(a)	25.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Precarios Urbanos (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mejoradas
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) que han disminuido su nivel de susceptibilidad a riesgos por inundaciones		Número	0.00	2011	Información de visitas Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Se mide a nivel de AUP debido a que el indicador de vulnerabilidad del MARN identifica un punto en el mapa, el cual puede o no coincidir con un polígono correspondiente a un AUP. Los puntos de vulnerabilidad tienen tres niveles (alta, media y baja).	P	6.00
	P(a)					6.00		
	A							

1.2 Hogares incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud		Porcentaje	0.00	2011	Sistema Unico de información en Salud (SUIS) del Ministerio de Salud.	El estar incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud implica que el hogar ya tuvo una primera visita y asesoramiento de los ECOS familiares. Esto también implica que tienen un programa de seguimiento a la salud dependiendo del perfil demográfico de la familia.	P	90.00
							P(a)	90.00
							A	
1.3 Volúmenes de agua retenidos		Millones de m3	0.00	2011	Modelación hídrica de propuesta de lagunas	Monitoreos en tiempo real a ser instalados en las lagunas.	P	0.50
							P(a)	0.50
							A	
1.4 Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	 RF	Households	0.00	2011	informes semestrales de programa		P	1,574.00
							P(a)	1,574.00
			A					
1.4 Hogares con acceso a saneamiento básico nuevo o mejorado	 RF	Households	0.00	2011	Informes semestrales de progreso e Informe final de ejecución		P	1,574.00
							P(a)	1,574.00
			A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Mejoramiento integral y mitigación de riesgo de AUP de CSU en AMSS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Asentamientos Urbanos Precarios con obras de mejoramiento ejecutadas	Asentamientos	P		6.00	P	3,002,819.00	21,994,189.00
		P(a)		6.00	P(a)	3,002,819.00	21,994,189.00
		A			A	0.00	0.00
Reducción de vulnerabilidad en AUP a través de inversiones estructurales en el AMSS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Lagunas de laminación construidas	Lagunas	P		5.00	P		26,132,230.00
		P(a)		5.00	P(a)		26,132,230.00
		A			A		0.00
Proyecto de Reparación de Bóvedas	Proyecto	P		1.00	P		683,581.00
		P(a)		1.00	P(a)		683,581.00
		A			A		0.00
Fortalecimiento de la gestión de la operación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Sistema de monitoreo y seguimiento implementado (capacidad de generar al menos una Evaluación de Impacto)	Sistema	P		1.00	P		390,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		390,000.00
		A			A		0.00
Other Cost					2014	Cost	
Gastos administrativos				P	\$160,000.00	\$800,000.00	
				P(a)	\$160,000.00	\$800,000.00	
				A	\$99,000.00	\$99,000.00	
Total Cost					2014	Total Cost	
				P	\$3,162,819.00	\$50,000,000.00	
				P(a)	\$3,162,819.00	\$36,548,845.00	
				A	\$99,000.00	\$99,000.00	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
