
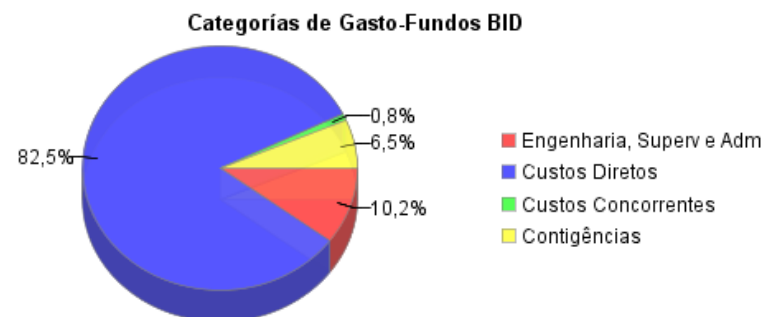




Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO		
Sector: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY		
Número da Operação: 2500/OC-BR	Atual: 115.700.000,00	Original BID: 115.700.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 115.700.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 58,00
Operação Relacionada:	Saldo: 115.700.000,00	Cofinanciamento/País: 84.080.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 199.780.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: A	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

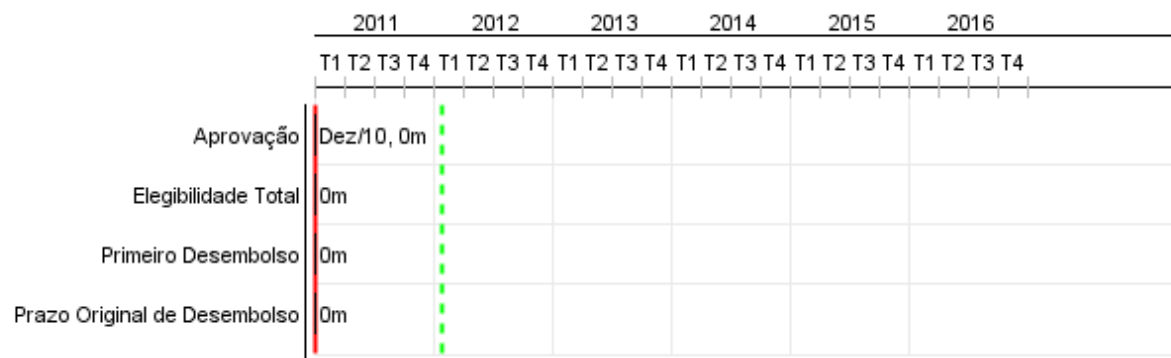

Progresso Acumulado até 2011

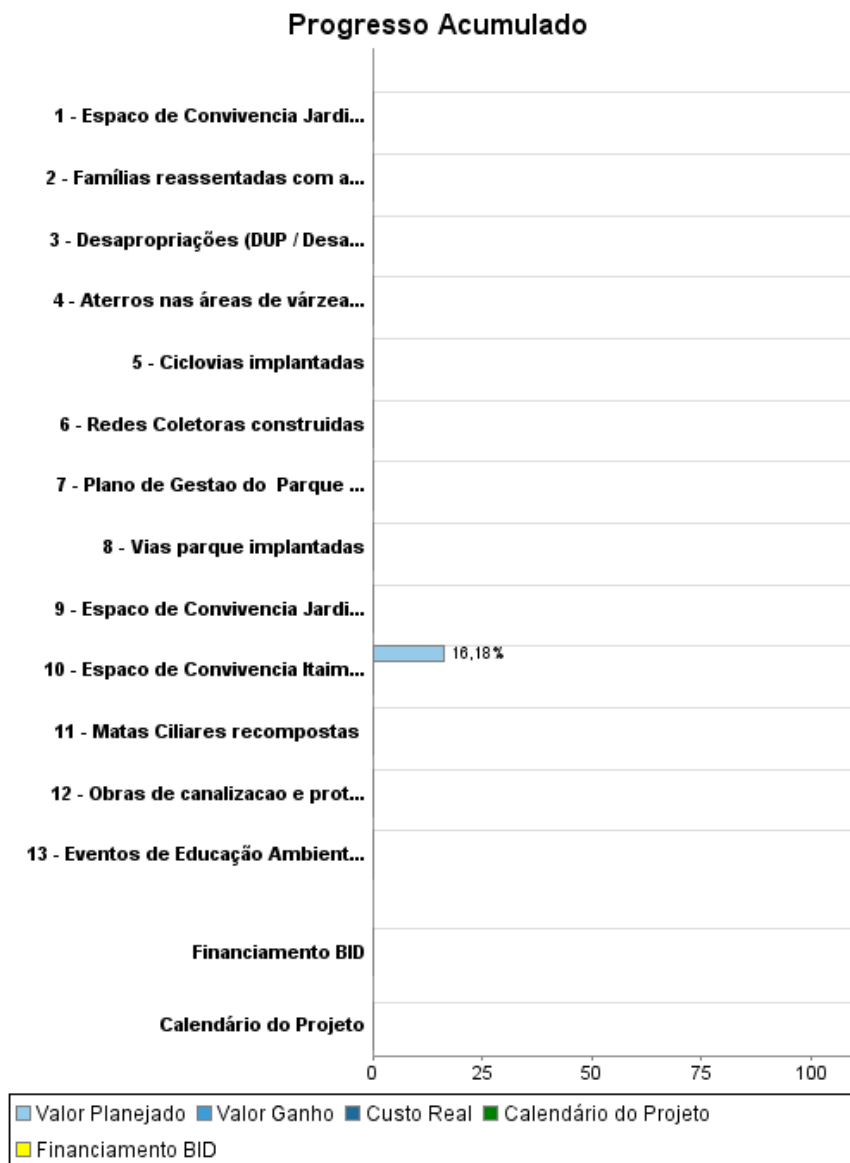

Resultados

Resultado: Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12,00	2010	P	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00
				A						
Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	10^6 m3		2011	P		0,80	1,30	1,80	2,80	2,80
				A						

Resultado: Opções de recreação na área do projeto incrementadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50,00	2010	P	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
OBRAS									
Obras de canalizacao e protecao de cursos d'agua executadas	m				2.000,00				11.523.000,00
Redes Coletoras construidas	m				18.000,00				4.212.000,00
Aterros nas áreas de várzeas removidos	10^3 m3	100,00			1.150,00				17.689.000,00
Espaco de Convivencia Jardim Helena construido	Espaco de Convivencia				1,00				16.450.000,00
Espaco de Convivencia Itaim Biacica construido	Espaco de Convivencia				1,00	1.928.000,00			11.919.000,00
Espaco de Convivencia Jardim Any Jaci construido	Espaco de Convivencia				1,00				10.181.000,00
Vias parque implantadas	km	8,00			41,00				17.620.000,00
Ciclovias implantadas	km	8,00			41,00				4.406.000,00
REASSENTAMENTO									
Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	m²	181.024,00			574.955,00				36.300.000,00
Famílias reassentadas com atendimento social	unidade habitacional				500,00				19.500.000,00
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL									
Matas Ciliares recompostas	ha				72,00				14.954.000,00
Plano de Gestao do Parque implantado	plano				1,00				1.498.000,00
Eventos de Educação Ambiental realizada	evento				15,00				2.168.000,00
OUTROS									
TOTAL						1.928.000,00			168.420.000,00
