

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Instituto Nacional de Vías
Secteur: TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS
Numéro(s) de Prêt(s): 2271/OC-CO
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): CO-T1142, CO-T1166, RG-P1374
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 53.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 37.947.341,58
% Décaissé: 71,60
Solde: 15.052.658,42

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 53.000.000,00
Courant BID: 53.000.000,00
Pari Passu: 26,00
Cofinancement/Pays: 150.000.000,00
Estimation Initiale: 203.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 198

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 09-abr-2013

Validé par le Représentant: 10-abr-2013

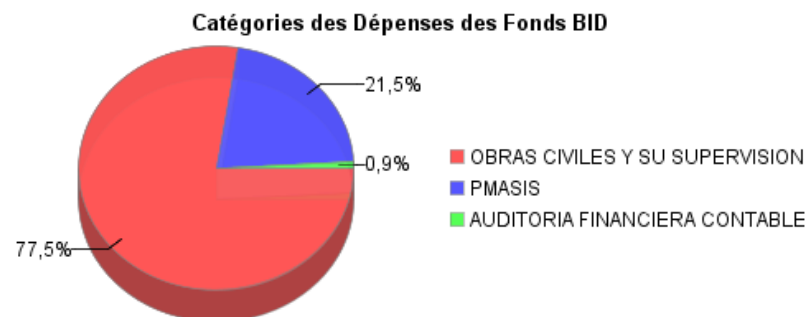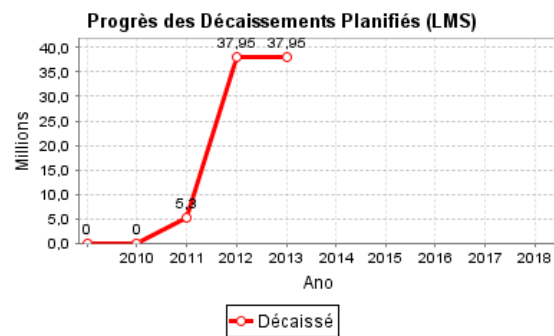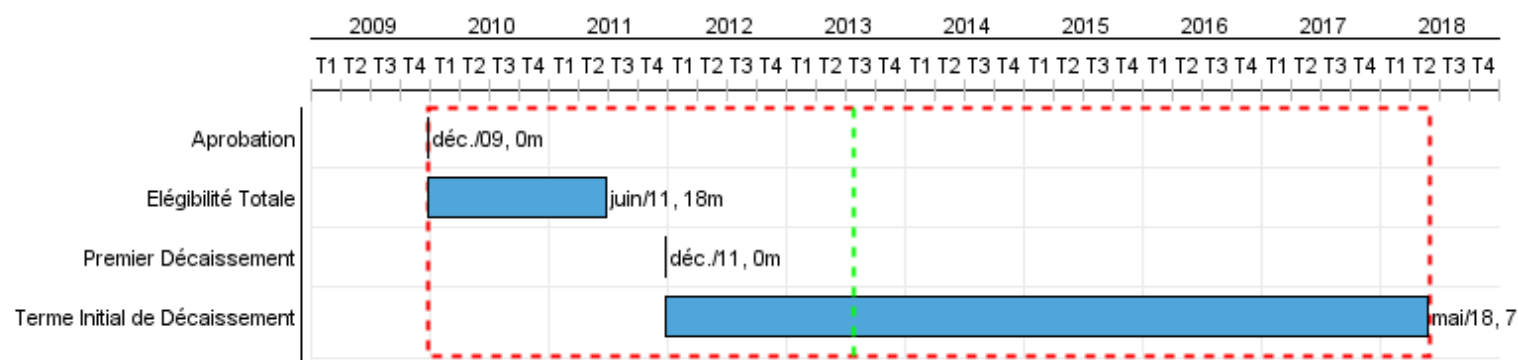

Progrès Cumulé à 2012

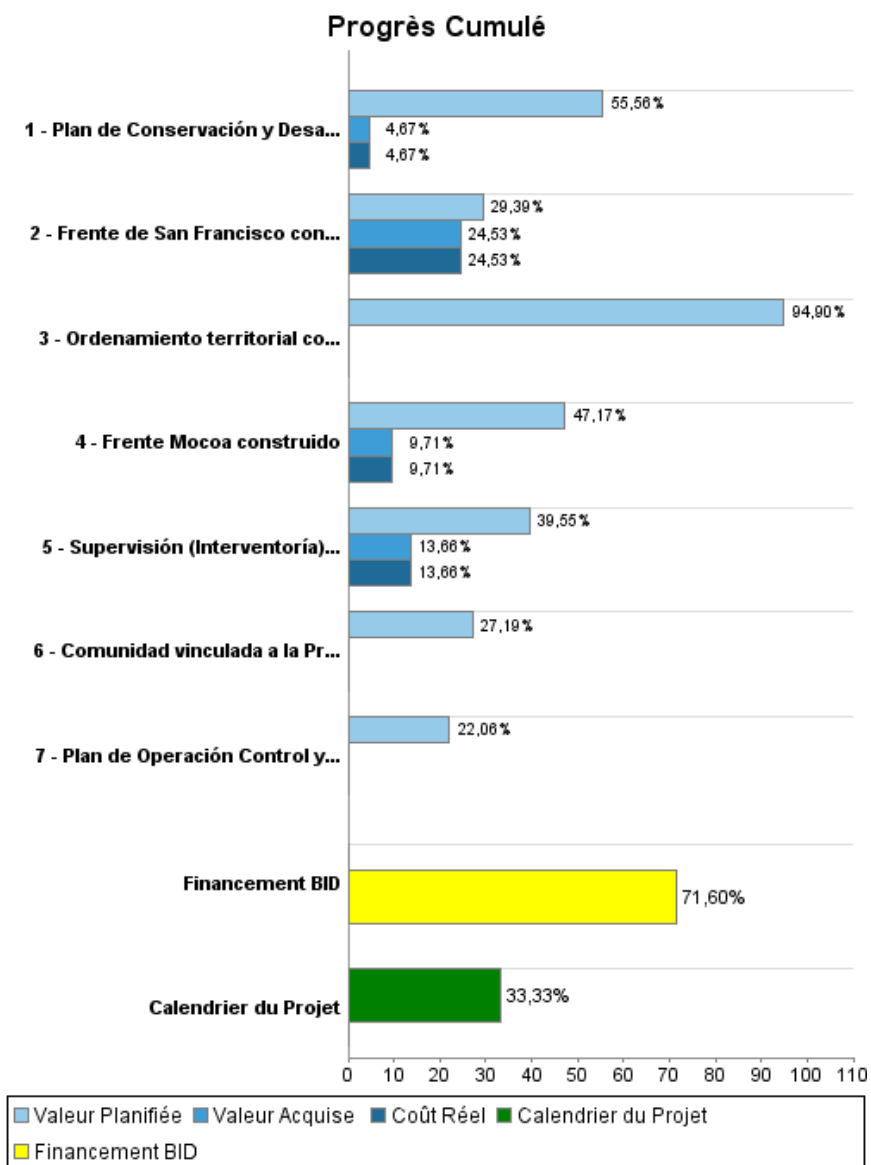

Résultats

Résultat:	Condiciones de eficiencia, conservación ambiental y seguridad del corredor vial Pasto - Mocoa mejoradas, mediante la construcción de la Variante San Francisco - Mocoa
Suposições:	INVIAS construye la variante cumpliendo con los estándares técnicos, ambientales y el cronograma previsto en la operación.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Número de días al año con restricciones severas de circulación de la vía entre San Francisco y Mocoa, al tránsito seguro y continuo de pasajeros y carga	Días	183,00	2009	P A	
Reducción del tiempo promedio de viaje entre San Francisco y Mocoa.	Horas	2,50	2009	P A	1,50
Reducción del costo promedio por Km de operación vehicular entre San Francisco y Mocoa	US\$/Km	105,00	2009	P A	61,00
Aumento de las áreas protegidas de la zona de influencia de la variante.	Ha	34.600,00	2009	P A	65.289,00
Reducción del número promedio de accidentes que se presentan al año actualmente entre San Francisco-Mocoa	No. accidentes/año	23,00	2009	P A	12,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Obras civiles y su supervisión									
Frente de San Francisco construido	Kilómetros				21,90	10.301.000,00	20.834.453,99		84.944.145,00
Frente Mocoa construido	Kilómetros				23,70	9.143.000,00	8.929.000,00		91.925.855,00
Supervisión (Interventoría) de obras contratada y operando	Supervisión		1,00		1,00	1.944.000,00	1.640.937,01		12.226.000,00
Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado Sostenible - PMASIS									
Ordenamiento territorial consolidado	Plan				1,00	558.000,00			1.252.948,00
Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas de Protegidas, implementado	Plan				1,00	975.000,00	194.084,39		5.249.052,00
Comunidad vinculada a la Protección de las Áreas Protegidas	Comunidad vinculada				1,00	198.000,00			1.869.000,00
Plan de Operación Control y Vigilancia de las áreas protegidas implementado	Plan				1,00	257.000,00			3.033.000,00
Auditoría Financiera y Contable									
Gerencia del Proyecto	N/A					630.000,00	569.081,04		2.500.000,00
Auditoría financiera y Contable									
TOTAL						24.006.000,00	32.167.556,43		203.000.000,00
