
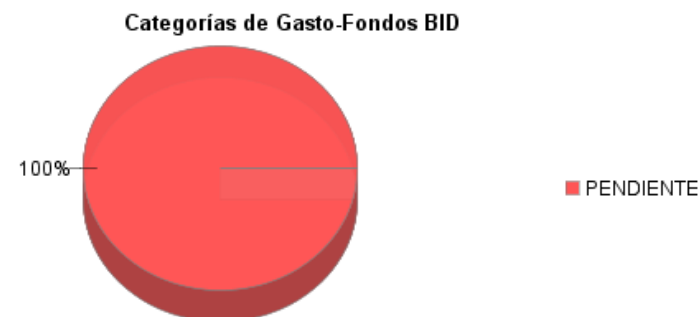



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	DISTRITO FEDERAL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAZIL				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Número(s) de Préstamo:	2957/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00	BID Original:	50.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	50.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	70,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-L1043, BR-T1225	Saldo:	50.000.000,00	Co-financiamiento/País:	21.430.000,00
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito			Estimado Original:	71.430.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 08-oct-2013 Validado por Representante de País: 09-oct-2013

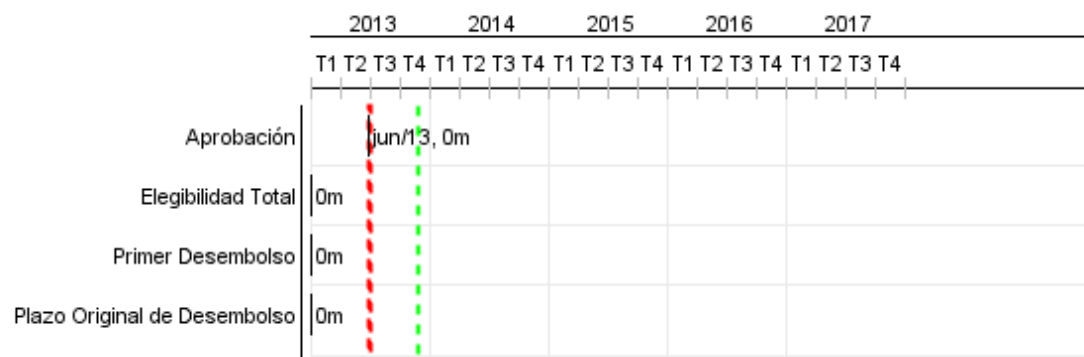

Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Melhorar o Ambiente de Negócios no Distrito Federal

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Número de Acessos (hits) mensais ao site da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF)	# de acessos		2009	P A	200,00

Resultado: Melhorar o Sistema de Promoção de Investimentos do Distrito Federal

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Investidores atendidos que fizeram negócios dentro do Programa Brasília Negócios	%		2009	P A	20,00
Investidores atendidos pelo Programa Brasília Negócios	# de investidores		2009	P A	100,00

Resultado: Aumento do número de empresas localizadas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) e melhora das condições das ADEs e proximidades (*)

Observaciones: * Total de conexões previstas nas ADEs: água (1.3160) e Rede de Esgoto (264)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Empresas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)	# de Empresas	474,00	2009	P A	570,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Desenvolvimento Institucional Estratégico									
Ferramentas Desenhadas para Fortalecer a Capacidade Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)	# Ferramentas				4,00				
Novo Site da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF) - Implantado	Site				1,00				
Proposta de uma Nova Estrutura do PRO-DF - Elaborada	Proposta				1,00				
Nova Plataforma Tecnológica de Gestão do PRÓ-DF - Implantada	Plataforma				1,00				
Programa de Atração de Investimentos - Brasília Global									
Plano Estratégico de Captação de Investimentos - Elaborado	Plano				1,00				
Plano de Negócios do Brasília Negócios - Elaborado	Plano				1,00				
Sistema "Client Relationship Management (CRM) - Desenvolvido	Sistema				1,00				
Eventos Comerciais e de Comunicação - Realizados	# de eventos				5,00				
Estudos de Pré-Factibilidade Preparados	# de Estudos				5,00				
Desenvolvimento Empresarial nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)									
Diagnósticos Setoriais - Elaborados	# diagnósticos				6,00				
Núcleos Avançados Fixos Instalados	# de Núcleos				2,00				
Empresários Capacitados nos Temas de Gestão e de Competitividade	# de Empresários				330,00				
Trabalhadores Capacitados	# de Trabalhadores				1.500,00				
Novos Empresários Capacitados nos temas de Gestão e de Competitividade nas ADEs	# de Empresários				110,00				
Certificações de Negócios Emitidas	# Certificações				40,00				
Empresas Âncoras Registradas	# de Empresas				3,00				
Empresas Provedoras Registradas	# de Empresas				30,00				
Site - COMPR-ADE Implantado	Site				1,00				
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE Centro-Norte									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1076 - PROCIDADES - Programa de Desarrollo Económico del Distrito Federal-
ADEs
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 08/10/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Rede de Esgoto - Implantada	Metros				10.554,00				
Ciclovías Implantadas	Metros				5.518,00				
Pontos de Ônibus - Implantados	# de pontos				4,00				
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros				23.701,00				
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros				49.538,00				
Parking Implantado	Metros				6.278,00				
Jogo de Equipamento e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo				1,00				
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Mat. de Construção									
Rede de Esgoto - Implantada	Metros				9.027,00				
Ciclovias Construídas	Metros				2.875,00				
Pontos de Ônibus Implantados	# de Pontos				7,00				
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros				94.000,00				
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros				92.000,00				
Parking Implantado	Metros				15.800,00				
Jogo de Equipamento e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo				1,00				
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Setor de Indústrias									
Implantação da Pavimentação	Metros				7.000,00				
Sistema de Drenagem - Implantado	Metros				13.573,00				
Ciclovias Construídas	Metros				9.485,00				
Pontos de Ônibus Implantados	# de Pontos				13,00				
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros				153.706,00				
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros				228.606,00				
Parking Implantado	Metros				36.086,00				
Jogo de Equipamentos e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo				1,00				
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Atividades do Gama									
Rede de Energia Elétrica Implantada	Metros				7.781,00				
Projeto de Urbanismo - Preparado	Projeto				1,00				
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Pólo JK									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1076 - PROCIDADES - Programa de Desarrollo Economico del Distrito Federal-
ADEs
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 08/10/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Projeto de Drenagem Pluvial - Preparado	# de Projetos				1,00				
Projeto de Urbanismo - Preparado	# de Projetos				1,00				
Rede de Energia Elétrica - Implantada	Metros				35.976,00				
Pavimentação Implantada	Metros				12.976,00				
Rede de Abastecimento de agua - Implantada	Metros				10.016,00				
Rede de Esgoto - Implantada	Metros				8.350,00				
TOTAL									
