




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE				
Loan Number(s):	2950/OC-EC	Current Approved Amount:	15.000.000,00	Original IDB:	15.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	15.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	EC-T1266, EC-T1276, RG-P1509	Balance:	15.000.000,00	Co-Financing/Country:	3.800.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	18.800.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-sep-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013

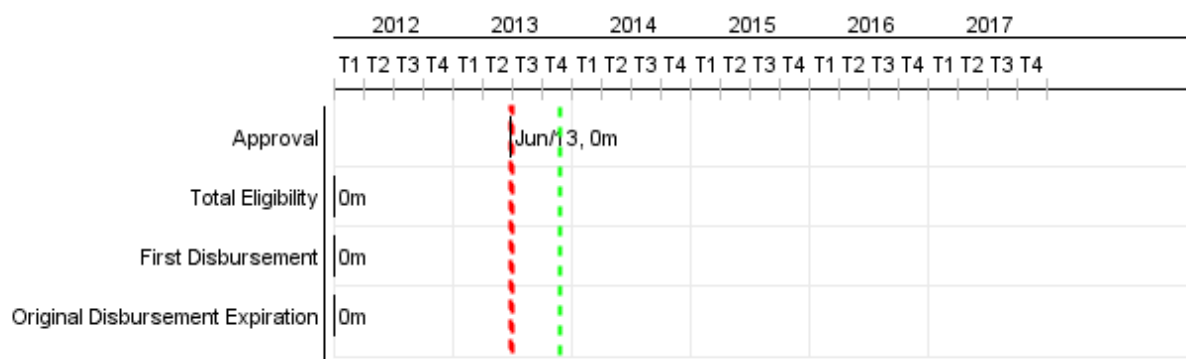

Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome: Eficiencia en conducción y en riego aumentada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Caudal de agua entregado a cabecera de parcela vs. caudal de agua captado.	Coeficiente promedio de Eficiencia	0,35	2013	P A			0,35	0,70
Hectáreas regadas efectivamente	Hectáreas	1.307,00	2013	P A		200,00	532,00	2.039,00
Agricultores a los que se les ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas	Agricultores		2013	P A			16.320,00	16.320,00

Outcome: Gestión integrada de micro cuencas de agua iniciada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Planes de manejo de los afluentes de sistema de riego con implementación iniciada	Planes de Manejo		2013	P A		11,00	4,00	15,00

Outcome: Gestión de riego sostenible implementada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Sistemas en los que las tarifas cobradas cubren su costo de operación y mantenimiento	Sistemas		2013	P A		10,00	9,00	19,00
Planes de gestión de agua de las juntas de usuario aprobados y en ejecución	Planes		2013	P A	10,00	9,00		19,00
Familias que aplican los sistemas de producción con prácticas mejoradas	Familias		2013	P A		300,00	516,00	816,00

Outcome: Participación de mujeres en las juntas de usuarios de riego incrementada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Juntas de Usuarios en las cuales se incrementa el número de mujeres en la directiva	Juntas de Usuarios		2013	P A			15,00	15,00

Outcome: Conectividad vial de usuarios y productores locales a los mercados locales provinciales mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Costos de operación vehicular en las vías intervenidas	USD/KM	0,21	2013	P A				0,16
Tiempo de ruta en la vía Pallatanga-Guamote	Minutos	255,00	2013	P A			178,00	178,00



PROGRESS MONITORING REPORT

EC-L1121 - Chimborazo Rural Development Investment Program
2013 1° period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 26/09/2013

Agricultores con mejores vías de acceso	Agricultores		2013	P			18.000,00	18.000,00
				A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de sistemas de riego									
Sistemas de riego, optimizados, rehabilitados y/o ampliados	Sistemas de riego				19,00				5.832.917,60
Fiscalización de obras de riego realizadas	Informes de fiscalización				19,00				312.832,53
Fincas modelo con apoyo productivo para manejo de cultivos bajo riego	Fincas				19,00				751.491,06
Juntas de usuarios de riego capacitadas en el manejo técnico de cultivos y frecuencias de riego	Juntas de Usuarios				19,00				100.000,00
Planes de manejo de los sistemas de riego y de la razón de recarga hídrica realizados	Planes de manejo				19,00				108.000,00
Prácticas y técnicas para el manejo de la zona de recarga hídrica, en 11 sistemas priorizados, implementados.	Sistemas de riego				11,00				110.000,00
Plantas forestales y frutales para los sistemas agroforestales (600 Has) instaladas	Plantas				240.000,00				72.000,00
Mejoramiento y rehabilitación vial									
Carretera Pallatanga-Guamote-Tramo Cuatro Esquinas-San Juan-Rodeo mejorada	km				34,40				5.137.830,00
Fiscalización de la Carretera Pallatanga-Guamote-Tramo Cuatro Esquinas - San Juan - Rodeo	Informe de fiscalización				1,00				350.000,00
Carretera Pallatanga- Guamote - Tramo Rodeo - Vaquería Buschud rehabilitada	km				4,50				720.000,00
Cinturón vial de Penipe rehabilitado	km				14,10				2.029.697,00
Fiscalización del Cinturón Vial de Penipe realizada	Informe de fiscalización				1,00				142.078,80
Gestión, evaluación del proyecto e imprevistos									
Administración del proyecto	N/A								1.380.911,00
Monitoreo y evaluación	N/A								250.000,00
Auditorías	N/A								200.000,00
Imprevistos sobre costos directos	N/A								1.302.242,02
TOTAL									18.800.000,01
