



Operation Number: **BR-L1389**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/4/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/18/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthening the Unified Health System in Salvador	Loan Number:	3262/OC-BR
Executing Agency (EA):	ESTADO DA BAHIA		
Team Leader:	Mac Arthur,Ian William	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DA BAHIA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1389	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$85,000,000.00		\$285,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1389	\$200,000,000.00	\$10,260,601.31	5.13%	\$189,739,398.69


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

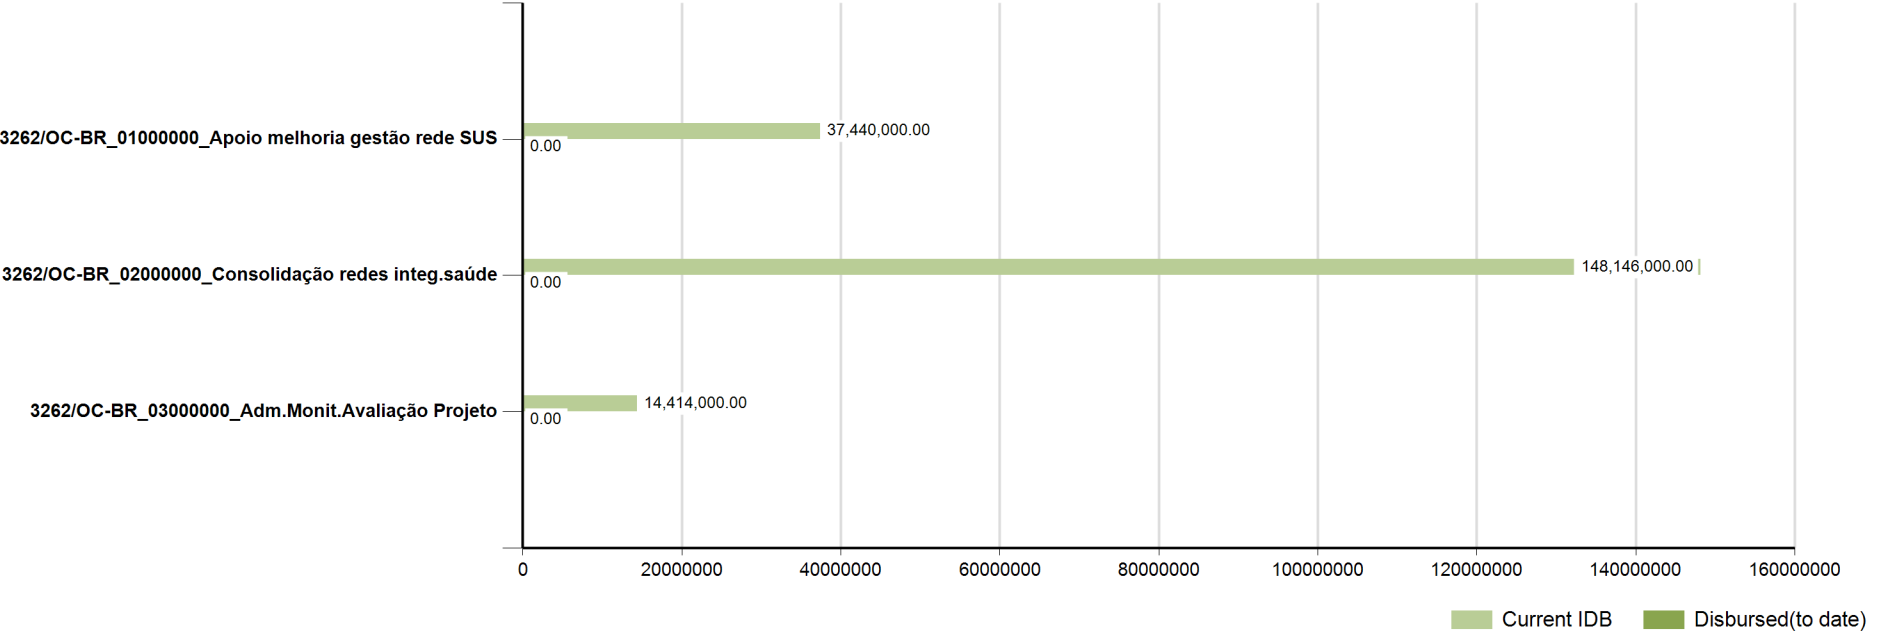

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Condições de Saúde da População do Estado da Bahia melhoradas								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Proporção de hospitalizações por condições sensíveis a atenção básica			Percentual	24.90	2015	DATASUS; ICSAB; SIH/SUS		P	21.90
								P(a)	
								A	
Disaggregation Categories								EOP	
Homens								P	22.72
								P(a)	
								A	
Disaggregation Categories								EOP	
Mulheres								P	21.06
								P(a)	
								A	
0.1 Taxa de mortalidade prematura por Diabetes Mellitus			Percentual	27.20	2015	DATASUS SIH/SUS IBGE		P	24.60
								P(a)	
								A	
Disaggregation Categories								EOP	
Homens								P	28.60
								P(a)	
								A	
Disaggregation Categories								EOP	
Mulheres								P	24.60
								P(a)	
								A	



Outcomes

Outco me:	1 Organização de uma rede integrada de serviços de saúde, focalizado na atenção primária para ampliar o acesso, a qualidade, a continuidade e a eficiencia dos serviços do SUS.							
Observ ation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	EOP	
							P	40.00
1.1 População cadastrada no PSF (Programa Saúde da Família)		percentual	23.29	2015	DATASUS		P	40.00
							P(a)	
							A	
1.2 Cobertura estimada do PSF na RMS		percentual	25.75	2015	DATASUS		P	50.00
							P(a)	
							A	

1.3 Mulheres adultos (maiores ou igual a 18 anos) que praticam volume recomendado de atividades físicas no seu tempo livre em Salvador		percentual	23.30	2015	VIGITEL		P	27.90
							P(a)	
							A	
1.4 Média de permanência de pacientes internados em hospitais estrategicos da RMS		dias	11.00	2015	DATASUS		P	8.00
							P(a)	
							A	
1.5 Razão de mulheres (na faixa etária de 25-64 anos) com exames citopatológicos realizados anualmente		pruebas por mulher	0.48	2015	SESAB/ SUVISA/ DIS – SIASUS, IBGE		P	0.70
							P(a)	
							A	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1: Apoio a melhoria da gestão da rede SUS na RMS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Sistema de Informação SESAB com o projeto lógico contratado e em funcionamento	Módulos	P		10.00	P	966,055.00	25,858,922.00
		P(a)		10.00	P(a)	984,568.00	25,858,922.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Modelo Assistencial do Hospital Metropolitano elaborado e avaliado	Modelo Assistencial	P	1.00	1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Profissionais do SUS capacitados	Pessoas	P	765.00	3,630.00	P	327,821.89	1,555,547.00
		P(a)		3,630.00	P(a)		1,555,547.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sede da SESAB reformada e equipada	Sede SESAB (m2)	P	80.00	500.00	P	836,412.56	5,227,578.51
		P(a)		500.00	P(a)	836,412.56	5,227,578.51
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Edifício Anexo da SESAB construído e equipado	Anexo SESAB (m2)	P		13,072.26	P		4,191,387.50
		P(a)		13,072.26	P(a)		4,191,387.50
		A		0.00	A	0.00	0.00
Modelagem da rede de atenção	Consultoria	P	1.00	1.00	P	404,761.71	404,761.71
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	404,761.71	404,761.71
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Observatório e Complexo Regulador equipados	Observatório	P		1.00	P		201,560.00
		P(a)		1.00	P(a)		201,560.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
C2. Consolidação das Redes Integradas de Saúde na RMS Componente II. Consolidação das Redes Integradas de Saúde na RMS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Unidades Básicas de Saúde construídas, equipadas e em funcionamento	UBS	P		11.00	P		9,905,623.01
		P(a)		11.00	P(a)		9,905,623.01
		A		0.00	A	0.00	0.00
Academias de Saúde Construídas, equipadas e em funcionamento	Academias de Saúde	P		13.00	P		2,451,424.00
		P(a)		13.00	P(a)		2,451,424.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Centros Integrals de Atenção a Saúde (CIAS) construídos, equipados e em funcionamento	CIAS	P		7.00	P		23,635,360.00
		P(a)		7.00	P(a)		23,635,360.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Hospital Metropolitano construído e em funcionamento	Hospital (m2)	P		18,496.50	P		64,897,278.00
		P(a)		18,496.50	P(a)		64,897,278.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Centros de Atenção Psicossocial e UAIJ construídos e equipados	CAPS/UAIJ	P		9.00	P		5,633,121.00
		P(a)		9.00	P(a)		5,633,121.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Hospitais reformados e ampliados (Hospital João Batista Caribé, Hospital Roberto Santos e Hospital São Jorge)	Hospital reformado	P		3.00	P		24,375,238.00
		P(a)		3.00	P(a)		24,375,238.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Unidades Móveis para Rede Hemoterápica adquiridos e postos em funcionamento	Unidade Móvel Hemoterapia	P		2.00	P	794,392.00	2,098,678.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	794,392.00	2,098,678.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Centro de referência do Trabalhador construido e equipado	CEREST	P		1.00	P		959,810.00
		P(a)		1.00	P(a)		959,810.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Instituto Couto Maia construido	Instituto	P		1.00	P	21,500,000.00	85,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		85,000,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Projetos executivos para obras de infraestrutura elaborados	Projetos arquitetonicos	P	18.00	40.00	P	2,332,275.00	4,664,550.00
		P(a)	18.00	40.00	P(a)	777,425.10	4,664,550.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Hospitais Equipados	Hospitais	P		4.00	P		9,524,880.00
		P(a)		4.00	P(a)		9,524,880.00
		A		0.00	A	0.00	0.00

C3. Administração, Monitoramento e Avaliação do Projeto

Other Cost		2016	Cost
Gerenciadora do Programa	P	\$3,977,295.50	\$14,095,233.00
	P(a)	\$1,577,484.90	\$14,095,233.00
	A	\$0.00	\$0.00
Avaliações do Programa	P	\$53,694.50	\$319,048.27
	P(a)	\$53,694.50	\$319,048.27
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$31,192,708.16	\$285,000,000.00
	P(a)	\$5,428,738.77	\$285,000,000.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
