




Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	UGP Igarapes de Manaus		
Setor:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação:	2676/OC-BR	Atual: 280.000.000,00	Original BID: 280.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 280.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada:	BR-L1005, BR-L1164, BR-L1217, BR-X1017, RG-P1442	Saldo: 280.000.000,00	Cofinanciamento/País: 120.000.000,00
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 400.000.000,00
			Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: A	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 15-mar-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012

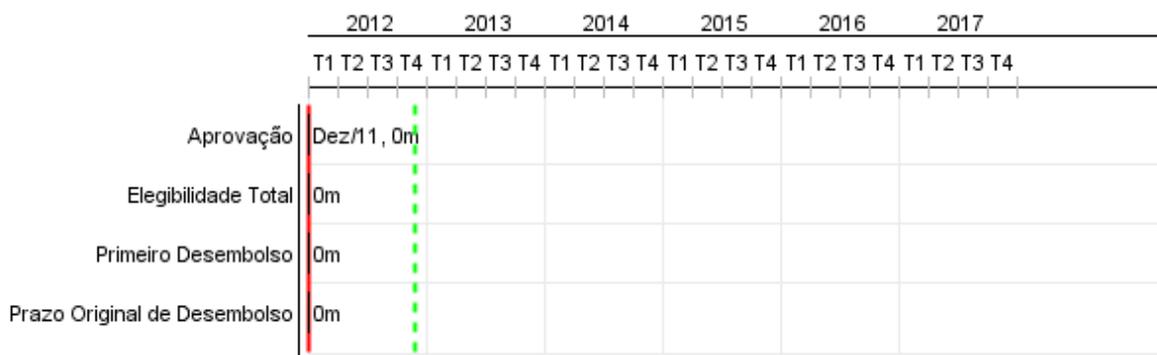

Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados
Resultado: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	22.40	2011	P A	5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	59.00	2011	P A	100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	67.00	2011	P A	0,00
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	430,000.00	2011	P A	1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	42.80	2011	P A	2,00

Resultado: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	45.00	2012	P A	5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 1	NTU	15.00	2012	P A	100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 1	mgO2/L	139.00	2012	P A	0,00
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 1	NMP/100mL	930,000.00	2012	P A	1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1	mgN/L	4.60	2012	P A	2,00

Resultado: Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	4.90	2011	P A	5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	3.00	2011	P A	100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	21.00	2011	P A	0,00
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	36.00	2011	P A	1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1.20	2011	P A	2,00

Resultado: Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	23.00	2012	P A	5,00
Turbidez (NTU) no Ponto 2	NTU	8.00	2012	P A	100,00
DQO (demanda química de oxigênio) no Ponto 2	mgO2/L	78.00	2012	P A	0,00
Coliformes fecais termotolerantes no Ponto 2	NMP/100mL	110,000.00	2012	P A	1.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2	mgN/L	1.50	2012	P A	2,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional									
Produto 1: Canais de Macrodrenagem construídos	metros				2.491,00				20.616.000,00
Produto 2: Coletores de águas pluviais construídos	metros				27.584,00				3.686.000,00
Produto 3: Unidades habitacionais construídas	unidades habitacionais				1.242,00				91.656.000,00
Produto 4: Sistema Viário construído	metros				5.390,00				10.781.000,00
Produto 5: Parques Urbanos e praças construídos	m²				70.003,00				48.525.000,00
Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	sistema				1,00				51.509.000,00
Produto 7: Domicílios conectados	Domicílios				11.062,00				5.115.000,00
Produto 8: Número de famílias em situação de riscos reduzido	famílias				3.959,00				58.862.000,00
Sustentabilidade Social e Institucional Ambiental									
Produto 9: Plano de Sustentabilidade Sociambiental implantado	plano				1,00				4.000.000,00
Produto 10: Mulheres profissionalmente capacitadas para inserção no mercado de trabalho	mulheres				172,00				424.000,00
Produto 11: Plano de entidades parceiras conveniadas e fortalecidas elaborado	plano				1,00				1.250.000,00
Produto 12: Plano de Controle Integral de Parasitose elaborado	plano				1,00				600.000,00
Outros									
TOTAL									297.024.000,00
