
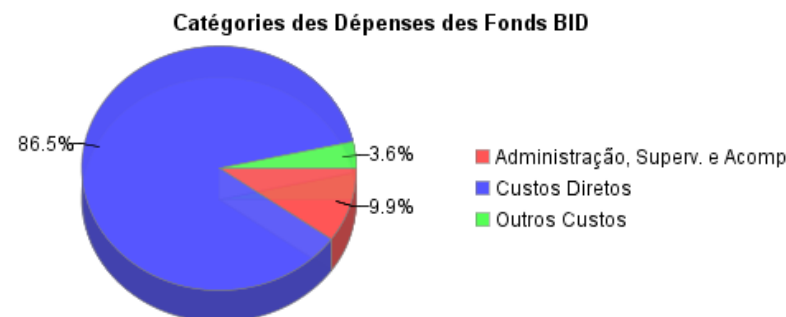
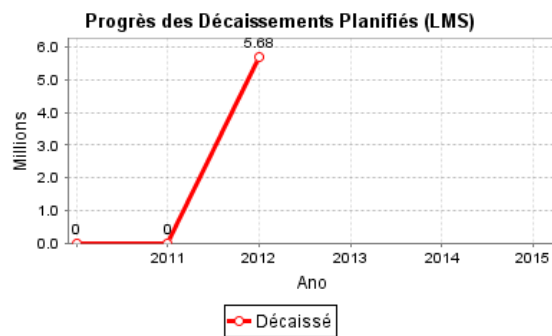



Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Secretaria de Estado de Turismo, Deporte y Ocio de Río de Janeiro				
Secteur:	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2411/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	112.000.000,00	Initial BID:	112.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	5.680.000,00	Courant BID:	112.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	5,07	Pari Passu:	60,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-X1008, RG-P1400	Solde:	106.320.000,00	Cofinancement/Pays:	75.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	187.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012

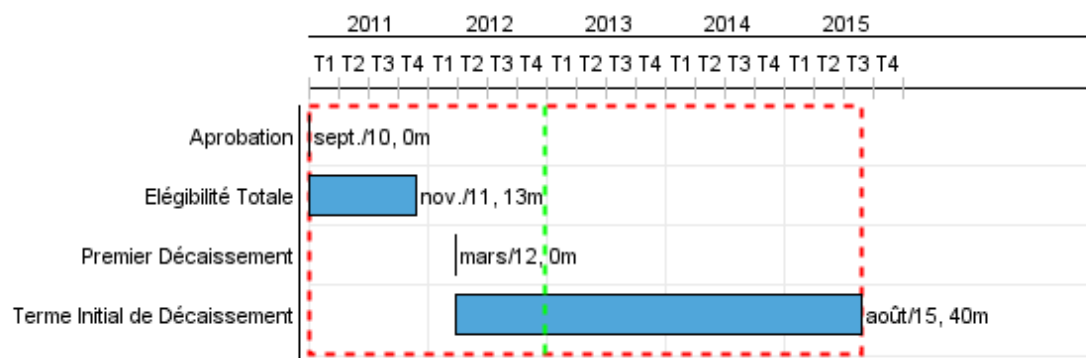

Progrès Cumulé à 2012

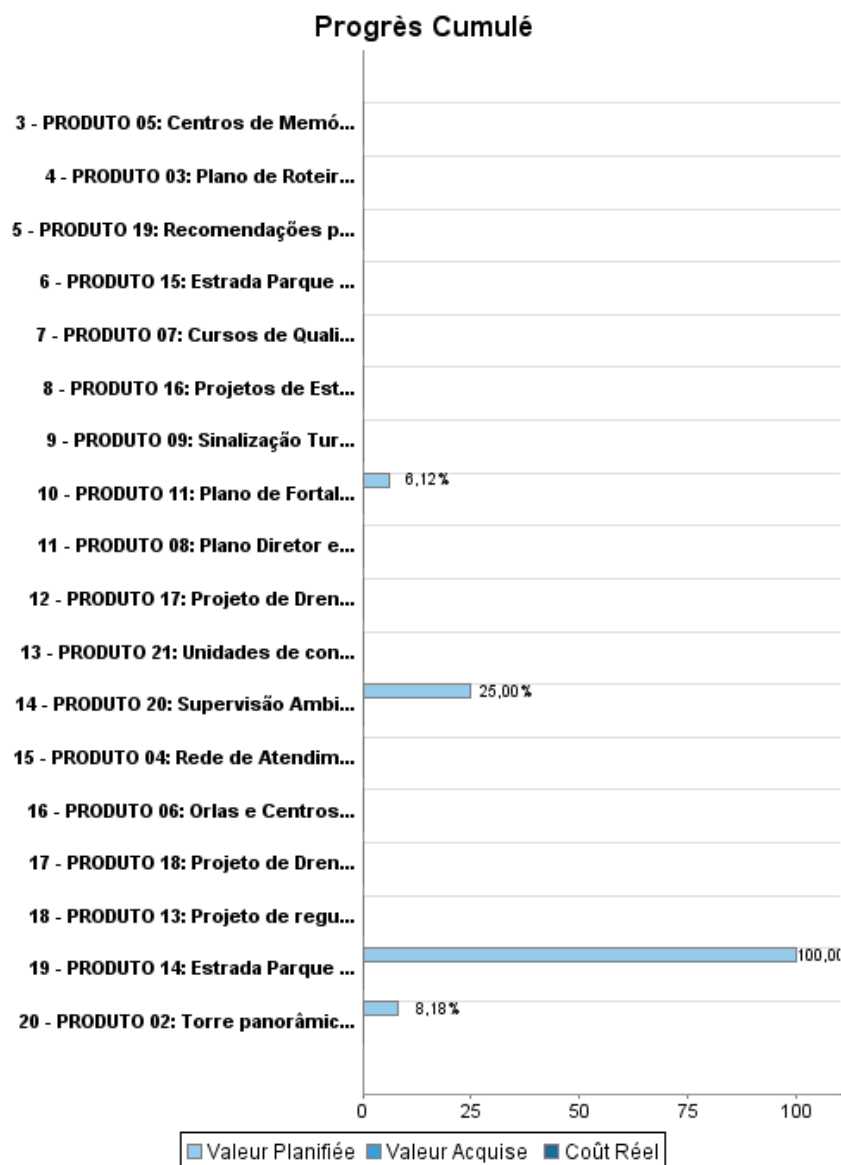

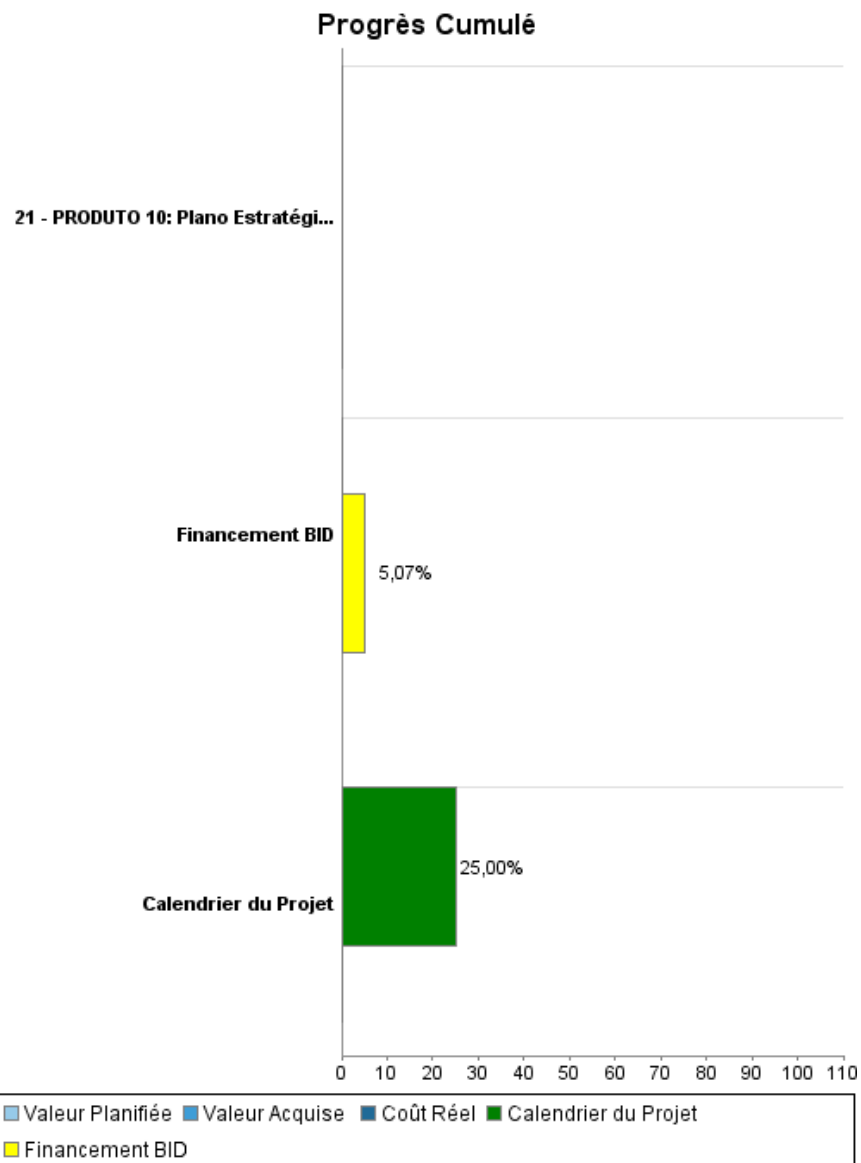

Résultats

Résultat:	RESULTADO 01: Setor Turístico no Estado, incrementado.
Suposições:	Crescimento da economia do País mantida.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Número médio de diárias dos turistas.	Dias	2.10	2009	P A		2.50	2.70	2.70
Tuistas, no polo litoral, interessados no turismo cultural.	%	11.00	2009	P A		14.00	15.00	15.00

Résultat:	RESULTADO 02: Capacidade de Gestão e Fiscalização do Setor Público, fortalecida.
Suposições:	N/a

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Fortalecimento dos Governos Estaduais e subnacionais.	Governments		2011	P A	1.00	1.00	1.00	3.00

Résultat:	RESULTADO 03: Capacidade de Gestão Ambiental das atividades Turísticas, estabelecida.
Suposições:	N/a

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Eficiência das redes de saneamento e drenagem nas vilas.	%	60.00	2009	P A			85.00	85.00
Novas Unidades de conservação de áreas vulneráveis, criadas pelo Governo.	Unidades de Conservação		2009	P A		1.00	2.00	3.00
Custo Operacional para Carros - RJ-163	R\$	1.84	2011	P A			0.63	0.63
Custo Operacional para carro - RJ-151	R\$	1.81	2011	P A			0.60	0.60

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 01: Estratégia de implementação dos Produtos Turísticos									
PRODUTO 01: Museu da Imagem e do Som, construído.	Museu				1,00	2.400.000,00			30.300.000,00
PRODUTO 02: Torre panorâmica - Caminho Niemayer -Niterói, construída.	Obra				1,00	900.000,00			11.000.000,00
PRODUTO 03: Plano de Roteiros Temáticos na Cidade do Rio de Janeiro, implementado.	Plano				1,00				700.000,00
PRODUTO 04: Rede de Atendimento ao Turista, operando.	Rede				4,00				3.550.000,00
PRODUTO 05: Centros de Memória, implantados.	Centro				4,00				3.350.000,00
PRODUTO 06: Orlas e Centros Históricos, adequados.	Obra				4,00				30.500.000,00
PRODUTO 07: Cursos de Qualificação profissional e empresarial, ministrados.	Participante				5.430,00				2.000.000,00
PRODUTO 08: Plano Diretor estadual de Turismo, atualizado.	Plano				1,00				500.000,00
PRODUTO 09: Sinalização Turística de acessibilidade aos destinos, melhorada.	Obra				1,00				4.300.000,00
COMPONENTE 02: Estratégia de Comercialização									
PRODUTO 10: Plano Estratégico de promoção e marketing, operando.	Plano				1,00				9.000.000,00
COMPONENTE 03: Fortalecimento institucional									
PRODUTO 11: Plano de Fortalecimento Institucional: SETUR, Gestores Públicos, Instâncias participativas; executado	Plano				2,00	150.000,00			2.450.000,00
PRODUTO 12: Sistema de Informação Turísticas do Estado, operando.	Sistema				1,00	30.000,00			5.350.000,00
PRODUTO 13: Projeto de regularização da informalidade da atividade turística em municípios selecionados, executado.	Projeto				1,00				1.200.000,00
COMPONENTE 04: Infraestrutura de acesso a destinos e serviços básicos									
PRODUTO 14: Estrada Parque Capelinha-Visconde de Mauá, melhorada.	Kilometers	15,80			15,80	29.000.000,00			29.000.000,00
PRODUTO 15: Estrada Parque Visconde de Mauá - Maringá, melhorada.	Kilometers				5,20				10.600.000,00
PRODUTO 16: Projetos de Estação/Pier, executados.	Projeto				2,00				4.000.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1210 - National Tourism Development Program-PRODETUR Nacional-Rio de Janeiro
2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 24/09/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
PRODUTO 17: Projeto de Drenagem, Urbanização de Vila do Abrão-Ilha Grande-Angra dos Reis, executado.	Projeto				1,00				7.000.000,00
PRODUTO 18: Projeto de Drenagem, Urbanização de Paraty, executado.	Projeto				1,00				4.500.000,00
COMPONENTE 05: Implantação de Gestão ambiental									
PRODUTO 19: Recomendações prioritárias da Avaliação ambiental estratégica, executadas.	Contrato				3,00				2.000.000,00
PRODUTO 20: Supervisão Ambiental de obras, executada.	Contrato	1,00			4,00	150.000,00			600.000,00
PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Unidade de conservação				3,00				10.000.000,00
COMPONENTE 06: Administração e outros									
PRODUTO 08: Administração e outros	N/A					4.350.000,00			15.100.000,00
TOTAL						36.980.000,00			187.000.000,00
