
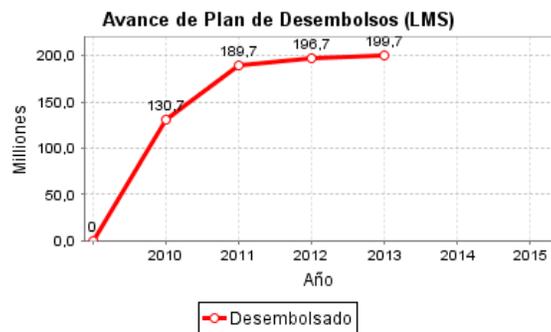


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ENERGIA				
Sector:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Número(s) de Préstamo:	1764/OC-AR-1	Monto Aprobado Actual:	300.000.000,00	BID Original:	300.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	199.700.000,00	Actual BID:	300.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	66,57	Pari-passu:	59,00
Operación(es) Relacionada(s):	AR-L1021	Saldo:	100.300.000,00	Co-financiamiento/País:	212.500.000,00
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario			Estimado Original:	512.500.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 09-abr-2013 Validado por Representante de País: 10-abr-2013

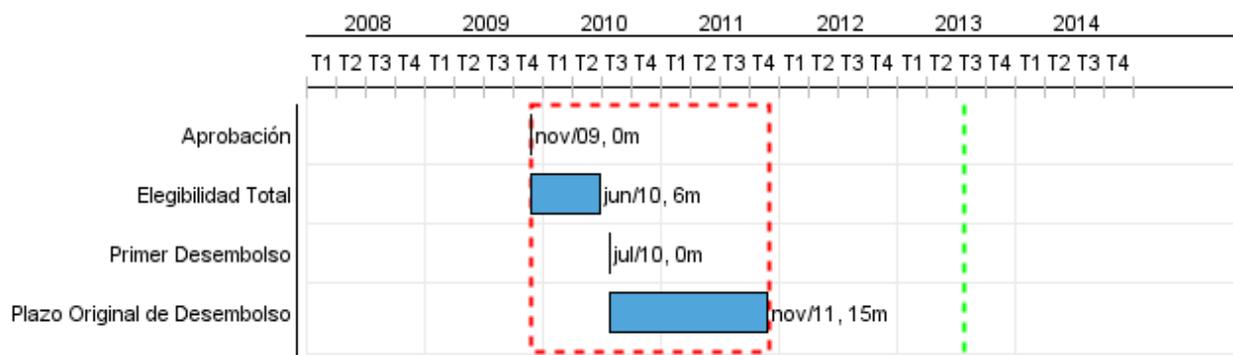

Categorías de Gasto-Fondos BID

Busca realizada con éxito, pero ningún registro fue encontrado.

Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado





INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 13/12/2012

Resultados

Resultado:	Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competencia en el mercado mayorista de generación.
-------------------	---

Resultado:	Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha
-------------------	--



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 13/12/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible
