
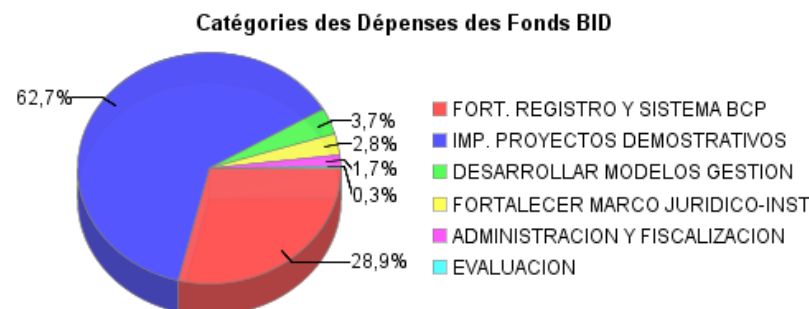
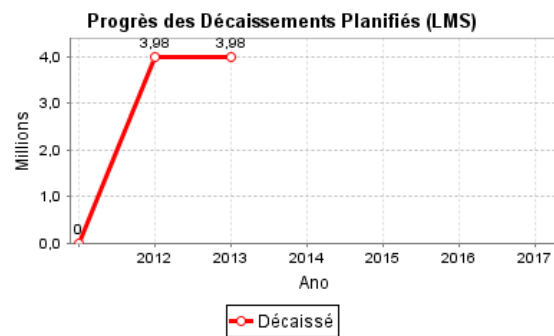



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Ministerio Coordinador de Patrimonio				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2678/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	37.840.000,00	Initial BID:	37.840.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.984.070,49	Courant BID:	37.840.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	10,53	Pari Passu:	95,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	33.855.929,51	Cofinancement/Pays:	2.160.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	40.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2013 Validé par le Représentant: 09-oct-2013

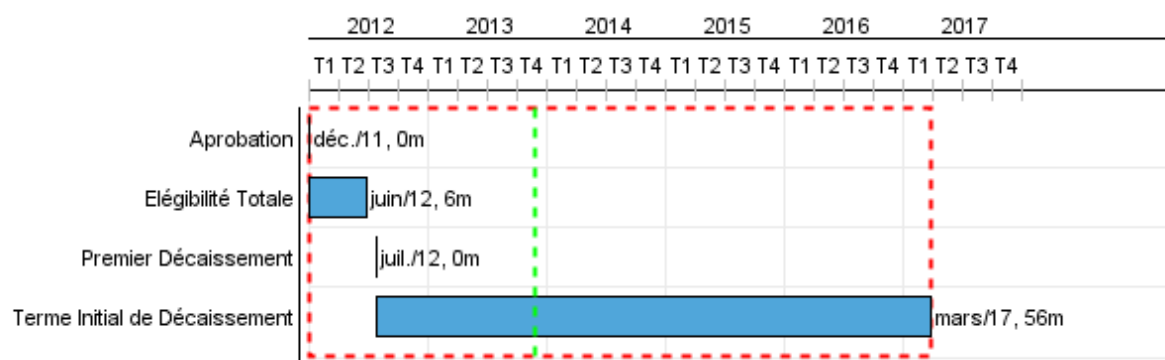

Progrès Cumulé à 2013

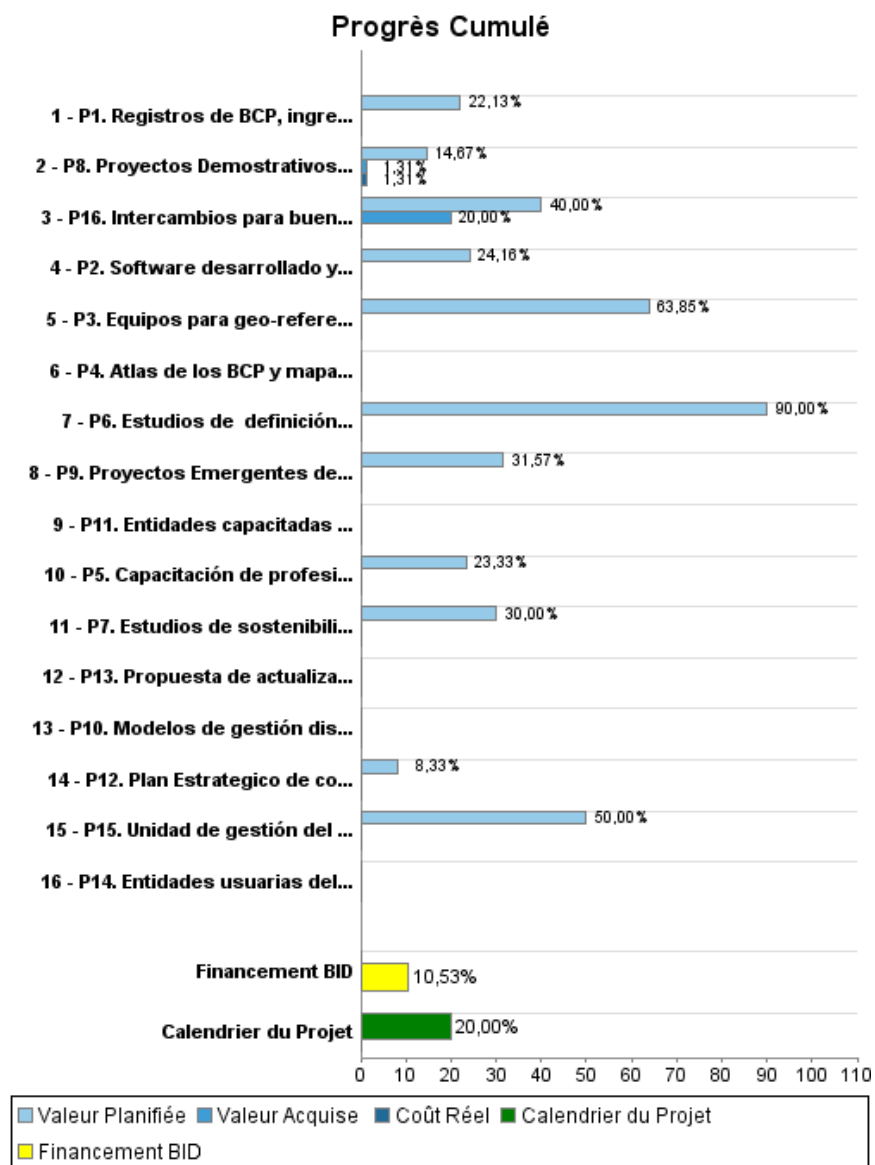

Résultats

Résultat:	Conocimiento sobre BCP incrementado y sistematizado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Porcentaje de BCP registrados en el SNBCP.	Porcentaje	2,70	2011	P			4,00			10,00
				A						
Consultas realizadas al SNBCP al año.	Consultas	90.000,00	2011	P	100.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00
				A						

Résultat:	Valorización de los BCP de los proyectos demostrativos y las intervenciones emergentes
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Inversiones conexas realizadas en Zaruma, Santa Elena y Pastaza-Puyo.	US\$		2010	P			1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00
				A						
% de mujeres que participaron en actividades vinculadas a la rehabilitación de bienes culturales	Porcentaje		2011	P						25,00
				A						

Résultat:	Modelos de gestión incorporados en los lineamientos de política del sector
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Modelos de gestión diseñados en base a mejores prácticas y aprobados	Modelos		2011	P					2,00	2,00
				A						

Résultat:	Capacidad del MCP para ejercer sus funciones de manera efectiva aumentada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Proyecto de Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP actualizada y presentada a la Presidencia de la República para ser remitida a la Asamblea Nacional.	Proyecto de Ley		2011	P			1,00			1,00
				A						
Reglamento de coordinación inter-institucional sobre el patrimonio cultural aprobado	Reglamento		2011	P					1,00	1,00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
C1. FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS BCP									
P1. Registros de BCP, ingresados y validados en el Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales	BCP	25.000,00			219.000,00	1.602.177,00			9.620.000,00
P2. Software desarrollado y adquirido.	Software	2,00			8,00	62.680,00			540.840,00
P3. Equipos para geo-referenciación y contingencia adquiridos	Equipos	1,00			2,00	30.000,00			426.000,00
P4. Atlas de los BCP y mapa patrimonial del Ecuador, desarrollado	Atlas				1,00				100.000,00
P5. Capacitación de profesionales para tareas de registro y sistematización de los BPC, implementada.	Personas	90,00			450,00	70.000,00			300.000,00
C2. IMPLEMENTACION PROYECTOS DEMOSTRATIVOS E INTERVENCIONES EMERGENTES									
P6. Estudios de definición de políticas de gestión por ámbito de BCP, realizados	Estudios				5,00	100.000,00			200.000,00
P7. Estudios de sostenibilidad para el sistema integral de BCP en las intervenciones demostrativas	Estudios				3,00	300.000,00			1.000.000,00
P8. Proyectos Demostrativos de BCP ejecutados.	Proyectos	2,00			25,00	2.340.000,00			17.520.000,00
P9. Proyectos Emergentes de BCP Ejecutados.	Proyectos	1,00			5,00	1.563.880,00			4.953.160,00
C3. DESARROLLO DE MODELOS DE GESTION SUSTENTABLES									
P10. Modelos de gestión diseñados y validados por el MCP y GAD (demostrativo, emergente y dos ámbitos)	Modelos				4,00				300.000,00
P11. Entidades capacitadas en aspectos técnicos institucionales (Plan de transferencia realizado).	Entidades				15,00				500.000,00
P12. Plan Estrategico de comunicación elaborado e implementado.	Plan				1,00	50.000,00			600.000,00
C4. FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL DE LOS BCP									
P13. Propuesta de actualización de la Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP, elaborada	Propuesta				1,00				50.000,00

RAPPORT DE SUIVI

EC-L1097 - Protection and Recovery of Cultural Heritage Assets program
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 11/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
P14. Entidades usuarias del Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales - SNBCP, capacidades	Entidades				10,00				350.000,00
P15. Unidad de gestión del conocimiento en el Ministerio de Coordinación del Patrimonio - MCP establecida	Unidad de Gestión				1,00	75.000,00			300.000,00
P16. Intercambios para buenas practicas de los BCP con instituciones internacionales afines realizados	Intercambios				5,00	70.000,00			350.000,00
C5. ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL PROGRAMA									
Administración del programa	N/A					285.000,00			1.960.000,00
Fiscalización	N/A					157.000,00			630.000,00
C6. EVALUACION									
Evaluación Intermedia y Final	N/A								100.000,00
C7. AUDITORIAS									
Auditorías Financieras	N/A					40.000,00			200.000,00
TOTAL						6.745.737,00			40.000.000,00
