





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	UNIDAD PROVINCIAL COORDINACION Y EJECUCION FINANCIAMIENTO EXTERNO		
Secteur:	TRANSPORTATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2491/OC-AR	Montant Courant Approuvé: 30.000.000,00	Initial BID: 30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 30.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu:
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1400, AR-T1084	Solde: 30.000.000,00	Cofinancement/Pays: 7.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation		Estimation Initiale: 37.500.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 31, 2011 Validé par le Représentant: Apr 28, 2011

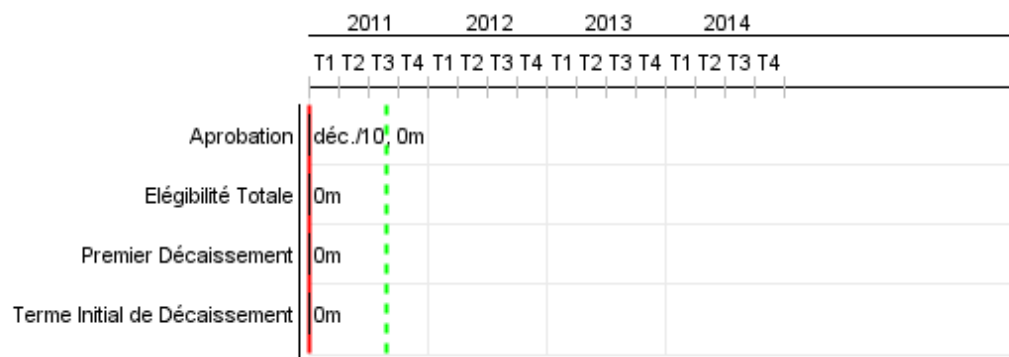

Progrès Cumulé à 2010

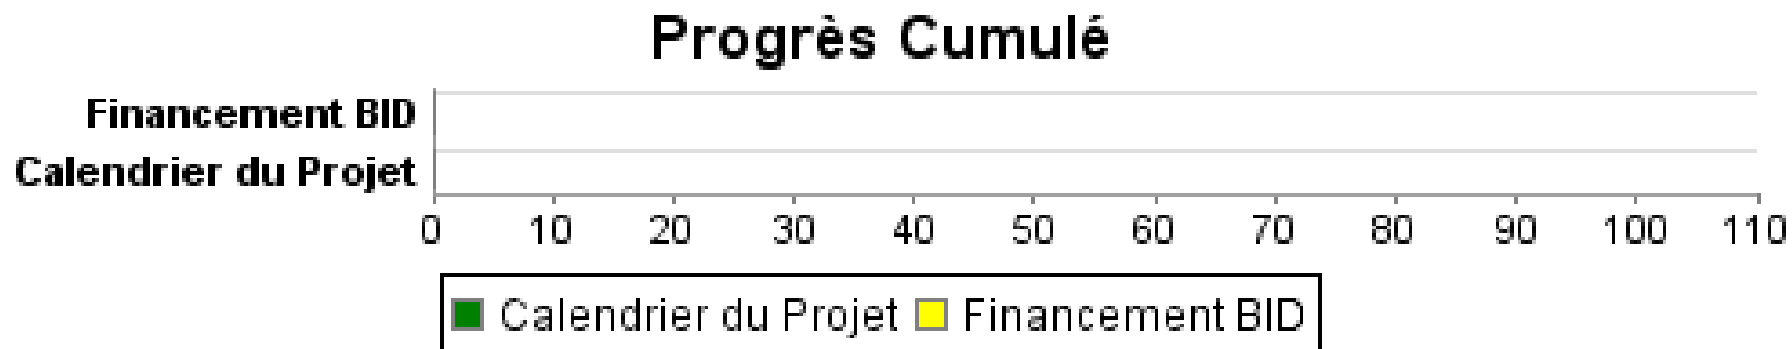

Résultats

Résultat:	Competitividad Puerto SAE, mantenida
------------------	--------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Volumen de Exportación del Puerto SAE	Toneladas	132.500,00	2009	P A	530.000,00

Résultat:	Oferta turística urbana, mejorada.
------------------	------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Turistas que llegan a Bariloche anualmente.	Personas	182.500,00	2009	P A	803.000,00
Valor patrimonial de las propiedades inmuebles frentistas de Calle Mitre	U\$S/Metro cuadrado		2010	P A	0,00
Actividad comercial de Calle Mitre	U\$S		2009	P A	0,00

Résultat:	Oferta de servicios médicos, ampliada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Relacion cirugías programadas/cirugías de urgencia.	%		2010	P A	0,00
Satisfacción con el servicio	A definir		2011	P A	0,00
Facturación del hospital a las obras Sociales y Prepagas	\$		2009	P A	0,00
Factor de ocupación de camas	Camas disponibles	140,00	2011	P A	154,00

Résultat:	Condiciones de inversión en infraestructura, mejoradas
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Nuevas ocupaciones irregulares en la zona de influencia directa de la RP1 eliminadas	Cantidad de ocupaciones		2011	P A	0,00
Uso irregular del área natural protegida (extracción de áridos, depósito de basuras, circulación de automóviles, etc) disminuido	de denuncias recibidas por CODEMA		2009	P A	0,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Infraestructura Productiva									
Playas de camiones mejoradas y ampliadas	Playas de camiones				1,00				830.000,00
Torres de amarre construidas	Torres				2,00				1.670.000,00
Plan de Manejo Integral de la Bahía de San Antonio implementado	Plan				1,00				420.000,00
Infraestructura turístico-productiva									
Derecho de vía de la RP N°1 adquirido	Ddv				1,00				1.000.000,00
Obras puntuales de infraestructura en la RP N°1, mejoras	Obras				1,00				830.000,00
Infraestructura urbana									
Calle Mitre en Bariloche, rehabilitada.	Obra				1,00				4.150.000,00
Calle Buenos Aires en Viedma, rehabilitada	Obra				1,00				1.250.000,00
Infraestructura hospitalaria									
Hospital Ramón Carrillo de Bariloche renovado y equipado	Obra				1,00				10.420.000,00
Sistema de gestión hospitalaria implementado	Plan				1,00				1.250.000,00
Estudios técnicos									
Estudios tecnicos elaborados	Estudios				7,00				250.000,00
Asistencia técnica estratégica; auditoria; seguimiento y monitoreo									
Asistencia técnica estratégica	Plan				1,00				325.000,00
Auditoria, seguimiento y monitoreo	Plan				3,00				1.520.000,00
Imprevistos y contingencias									
TOTAL									23.915.000,00
