

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1106 - Programa de Infraestructura Productiva y Turística de la Provincia de Río Negro
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID




Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 27/09/2012


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	UNIDAD PROVINCIAL COORDINACION Y EJECUCION FINANCIAMIENTO EXTERNO		
Sector:	TRANSPORT		
Número(s) de Préstamo:	2491/OC-AR	Monto Aprobado Actual: 30.000.000,00	BID Original: 30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 30.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 80,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1400, AR-T1084	Saldo: 30.000.000,00	Co-financiamiento/País: 7.500.000,00
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		Estimado Original: 37.500.000,00
			Período de Amortización (meses): 246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012 Validado por Representante de País: 17-oct-2012

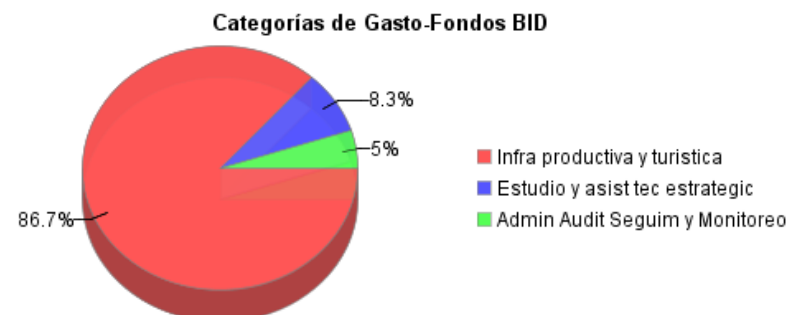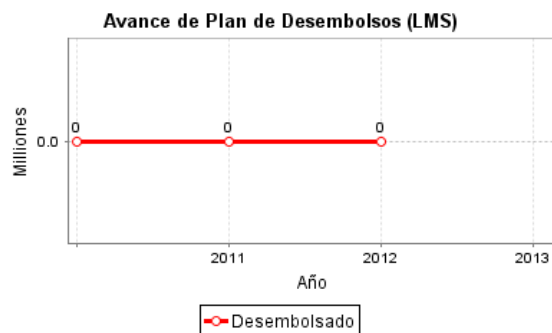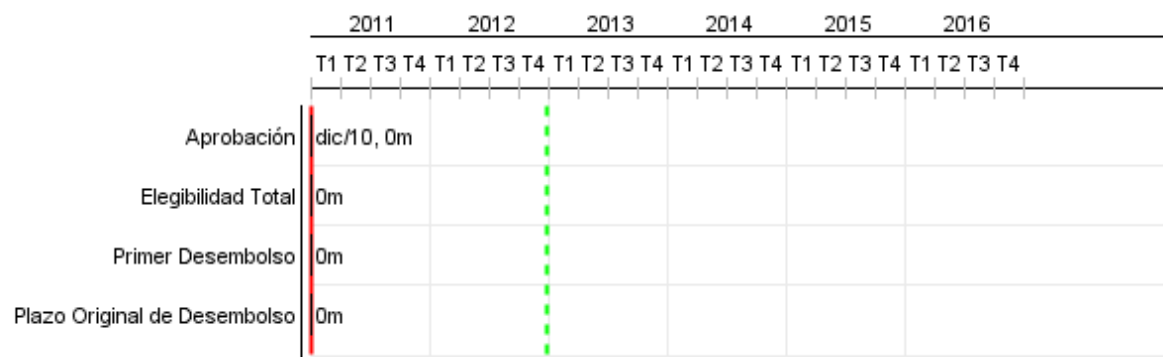

Progreso Acumulado al 2012

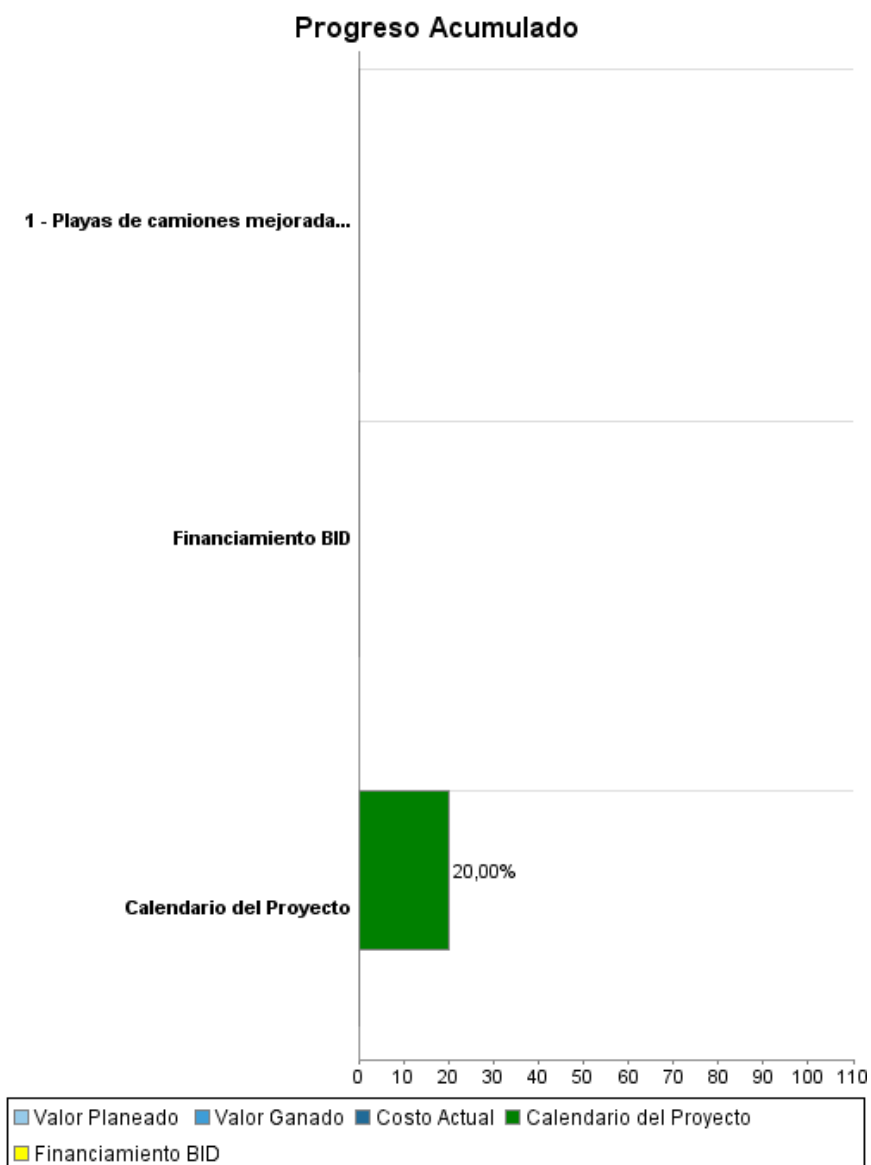

Resultados

Resultado: Competitividad Puerto SAE, mantenida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Volumen de Exportación del Puerto SAE	Toneladas	132,500.00	2009	P	530,000.00
				A	

Resultado: Oferta turística urbana, mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Turistas que llegan a Bariloche anualmente.	Personas	182,500.00	2009	P	803,000.00
				A	
Valor patrimonial de las propiedades inmuebles frentistas de Calle Mitre	U\$/Metro cuadrado		2010	P	
				A	
Actividad comercial de Calle Mitre	U\$S		2009	P	
				A	

Resultado: Oferta de servicios médicos, ampliada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Relacion cirugías programadas/cirugías de urgencia.	%		2010	P	
				A	
Satisfacción con el servicio	A definir		2011	P	
				A	
Facturación del hospital a las obras Sociales y Prepagas	\$		2009	P	
				A	
Factor de ocupación de camas	Camas disponibles	140.00	2011	P	154.00
				A	

Resultado: Condiciones de inversión en infraestructura, mejoradas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Nuevas ocupaciones irregulares en la zona de influencia directa de la RP1 eliminadas	Cantidad de ocupaciones		2011	P	
				A	
Uso irregular del área natural protegida (extracción de áridos, deposito de basuras, circulación de automóviles, etc) disminuido	de denuncias recibidas por CODEMA		2009	P	
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Infraestructura Productiva									
Playas de camiones mejoradas y ampliadas	Playas de camiones				1,00	1,00			830.000,00
Torres de amarre construidas	Torres				2,00				1.670.000,00
Plan de Manejo Integral de la Bahía de San Antonio implementado	Plan				1,00				420.000,00
Infraestructura turístico-productiva									
Derecho de vía de la RP N°1 adquirido	Ddv				1,00				1.000.000,00
Obras puntuales de infraestructura en la RP N°1, mejoras	Obras				1,00				830.000,00
Infraestructura urbana									
Calle Mitre en Bariloche, rehabilitada.	Obra				1,00				4.150.000,00
Calle Buenos Aires en Viedma, rehabilitada	Obra				1,00				1.250.000,00
Infraestructura hospitalaria									
Hospital Ramón Carrillo de Bariloche renovado y equipado	Obra				1,00				10.420.000,00
Sistema de gestión hospitalaria implementado	Plan				1,00				1.250.000,00
Estudios técnicos									
Estudios técnicos elaborados	Estudios				7,00				250.000,00
Asistencia técnica estratégica; auditoría; seguimiento y monitoreo									
Asistencia técnica estratégica	Plan				1,00				325.000,00
Auditoría, seguimiento y monitoreo	Plan				3,00				1.520.000,00
Imprevistos y contingencias									
Imprevistos y contingencias	N/A								6.085.000,00
TOTAL						1,00			30.000.000,00
