
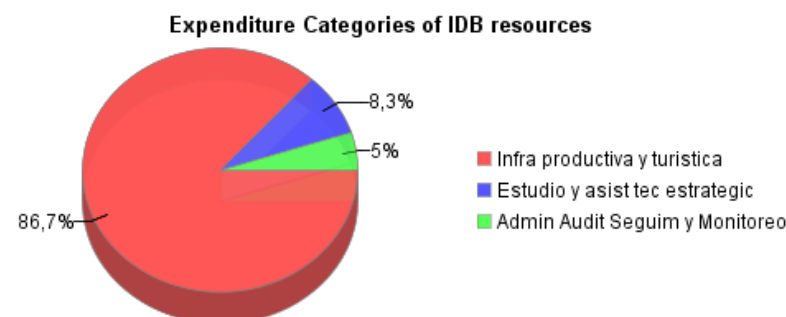
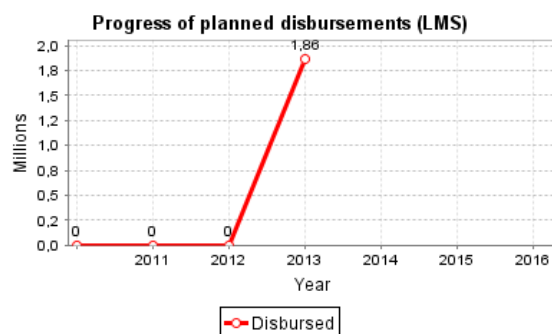


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	UNIDAD PROVINCIAL COORDINACION Y EJECUCION FINANCIAMIENTO EXTERNO				
Sector:	TRANSPORT				
Loan Number(s):	2491/OC-AR	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.856.907,00	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	6,19	Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	RG-P1400, AR-T1084	Balance:	28.143.093,00	Co-Financing/Country:	7.500.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	37.500.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-oct-2013

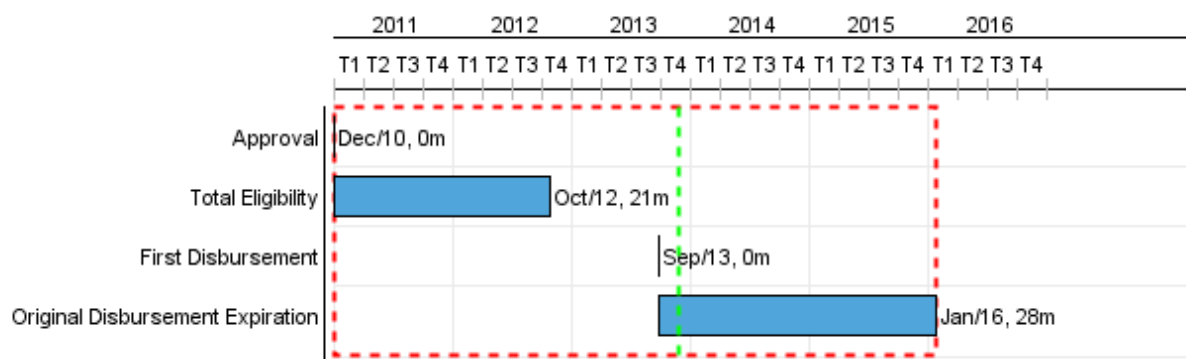

Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Competitividad Puerto SAE, mantenida
-----------------	--------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Volumen de Exportación del Puerto SAE	Toneladas	132.500,00	2009	P A	530.000,00

Outcome:	Oferta turística urbana, mejorada.
-----------------	------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Turistas que llegan a Bariloche anualmente.	Personas	182.500,00	2009	P A	803.000,00
Valor patrimonial de las propiedades inmuebles frentistas de Calle Mitre	U\$/Metro cuadrado		2010	P A	
Actividad comercial de Calle Mitre	U\$S		2009	P A	

Outcome:	Oferta de servicios médicos, ampliada.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Relacion cirugías programadas/cirugías de urgencia.	%		2010	P A	
Satisfacción con el servicio	A definir		2011	P A	
Facturación del hospital a las obras Sociales y Prepagas	\$		2009	P A	
Factor de ocupación de camas	Camas disponibles	140,00	2011	P A	154,00

Outcome:	Condiciones de inversión en infraestructura, mejoradas
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Nuevas ocupaciones irregulares en la zona de influencia directa de la RP1 eliminadas	Cantidad de ocupaciones		2011	P A	
Uso irregular del área natural protegida (extracción de áridos, deposito de basuras, circulación de automóviles, etc) disminuido	de denuncias recibidas por CODEMA		2009	P A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Infraestructura Productiva									
Playas de camiones mejoradas y ampliadas	Playas de camiones				1,00				830.000,00
Torres de amarre construidas	Torres								
Plan de Manejo Integral de la Bahía de San Antonio implementado	Plan				1,00				420.000,00
Infraestructura turístico-productiva									
Derecho de vía de la RP N°1 adquirido	Ddv								
Obras puntuales de infractura en la RP N°1, mejoras	Obras				1,00				830.000,00
Infraestructura urbana									
Calle Mitre en Bariloche, rehabilitada.	Obra				1,00				4.150.000,00
Calle Buenos Aires en Viedma, rehabilitada	Obra				1,00	0,25			1.250.000,00
Infraestructura hospitalaria									
Hospital Ramón Carrillo de Bariloche renovado y equipado	Obra				1,00				10.420.000,00
Sistema de gestión hospitalaria implementado	Plan				1,00				1.250.000,00
Estudios técnicos									
Estudios tecnicos elaborados	Estudios								
Asistencia técnica estratégica; auditoria; seguimiento y monitoreo									
Asistencia técnica estratégica	Plan								
Auditoria, seguimiento y monitoreo	Plan				3,00				1.520.000,00
Imprevistos y contingencias									
Imprevistos y contingencias	N/A								6.085.000,00
TOTAL						0,25			26.755.000,00
