

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO
Secteur:	WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s):	2500/OC-BR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	115.700.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	6.686.963,00
% Décaissé:	5,78
Solde:	109.013.037,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	115.700.000,00
Courant BID:	115.700.000,00
Pari Passu:	58,00
Cofinancement/Pays:	84.080.000,00
Estimation Initiale:	199.780.000,00
Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 03-oct-2013

Validé par le Représentant: 04-oct-2013

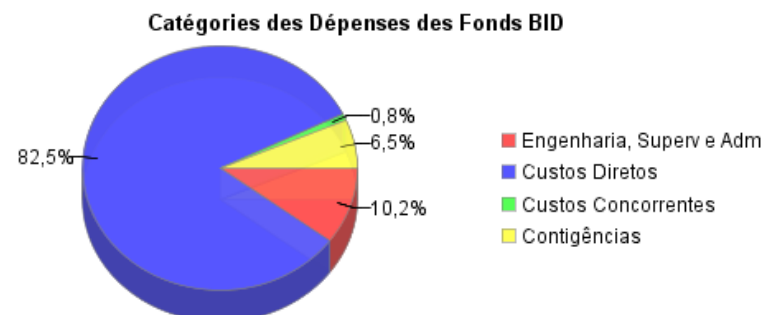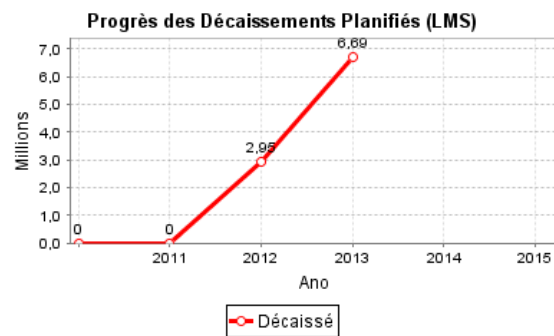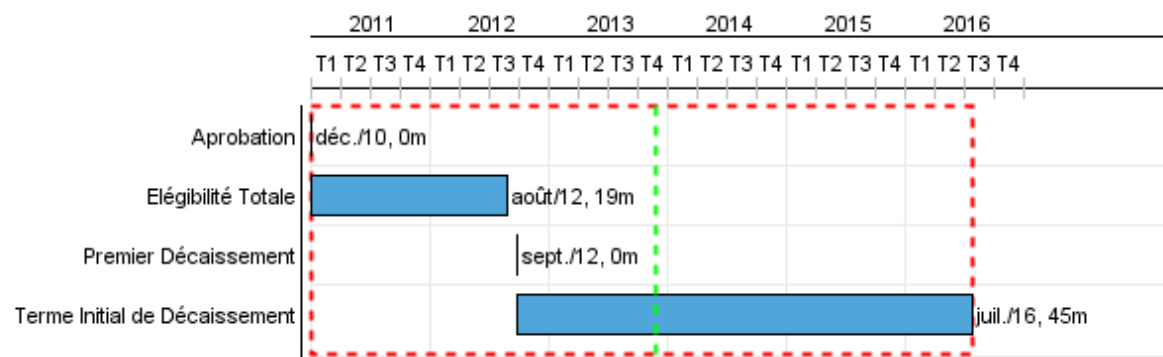

Progrès Cumulé à 2013

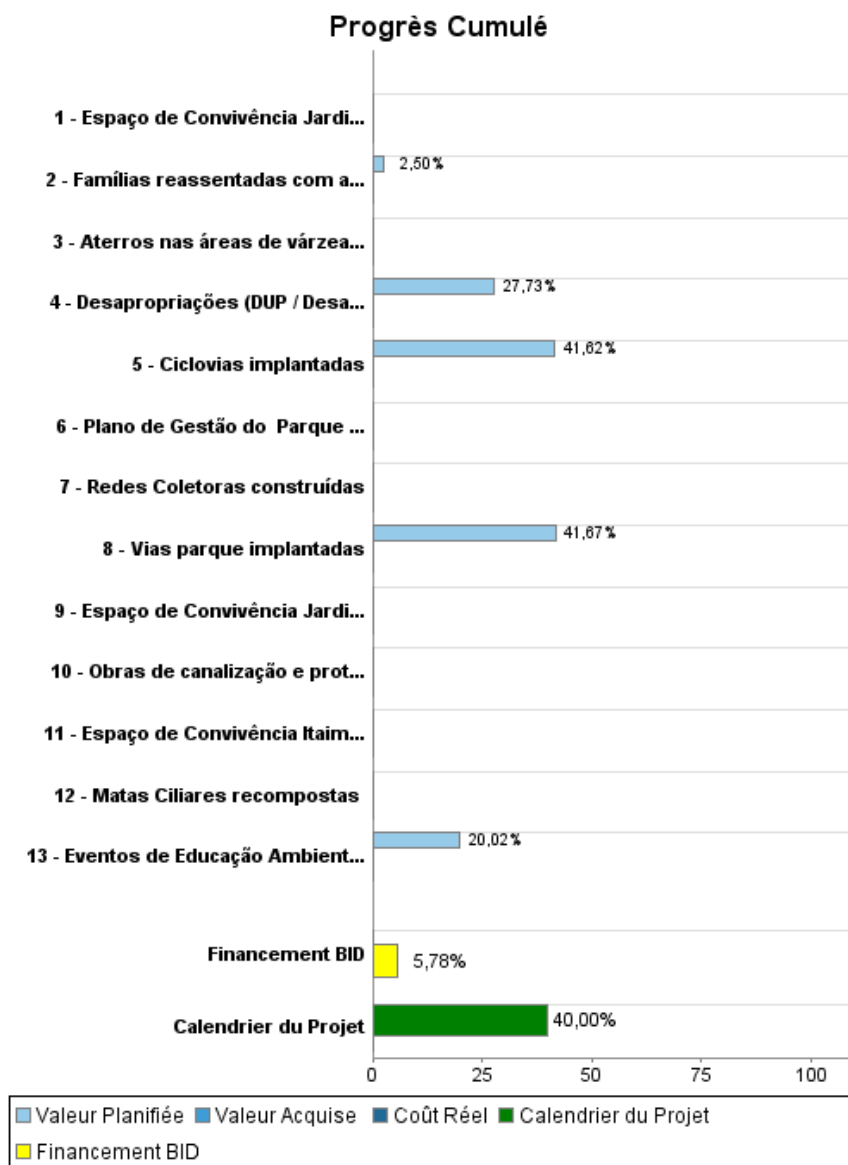

Résultats

Résultat:	Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12,00	2010	P	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00
				A		12,00				
Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	1.000.000 m3		2011	P		0,80	1,30	1,80	2,40	2,80
				A		0,80				

Résultat:	Opções de recreação na área do projeto incrementadas
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50,00	2010	P	50,00	50,00	50,00	60,00	80,00	80,00
				A		50,00				

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
OBRAS									
Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas	metro				2.000,00				11.523.000,00
Redes Coletoras construídas	metro				18.000,00				4.212.000,00
Aterros nas áreas de várzeas removidos	1.000.000 m3	50,00			1.150,00				17.689.000,00
Espaço de Convivência Jardim Helena construído	Espaço de Convivência				1,00				19.902.000,00
Espaço de Convivência Itaim Biacica construído	Espaço de Convivência				1,00				13.048.000,00
Espaço de Convivência Jardim Any Jaci construído	Espaço de Convivência				1,00				11.457.000,00
Vias parque implantadas	kilômetro	13,00			48,00	6.425.000,00			15.418.000,00
Ciclovias implantadas	kilômetro	13,00			48,00	2.750.000,00			6.608.000,00
REASSENTAMENTO									
Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	m²	500.000,00			1.081.172,00	8.500.000,00			30.657.000,00
Famílias reassentadas com atendimento social	Domicílios				500,00	500.000,00			20.020.000,00
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL									
Matas Ciliares recompostas	hectares				72,00				14.954.000,00
Plano de Gestão do Parque implantado	plano				1,35				1.498.000,00
Eventos de Educação Ambiental realizados	evento				15,00	434.000,00			2.168.000,00
OUTROS									
Estudos e Projetos	N/A					4.153.000,00			7.594.000,00
Gerência e Supervisão	N/A					6.714.000,00	1.733.000,00		22.132.000,00
Avaliação	N/A								450.000,00
Auditoria Financeira do Programa	N/A					135.000,00			450.000,00
Custos concorrentes, contingenciais e custos financeiros	N/A								
TOTAL						29.611.000,00	1.733.000,00		199.780.000,00
