





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2895/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	17.200.000,00	Initial BID:	17.200.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	17.200.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	HO-T1199	Solde:	17.200.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	17.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	285

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2013 Validé par le Représentant: 27-sep-2013

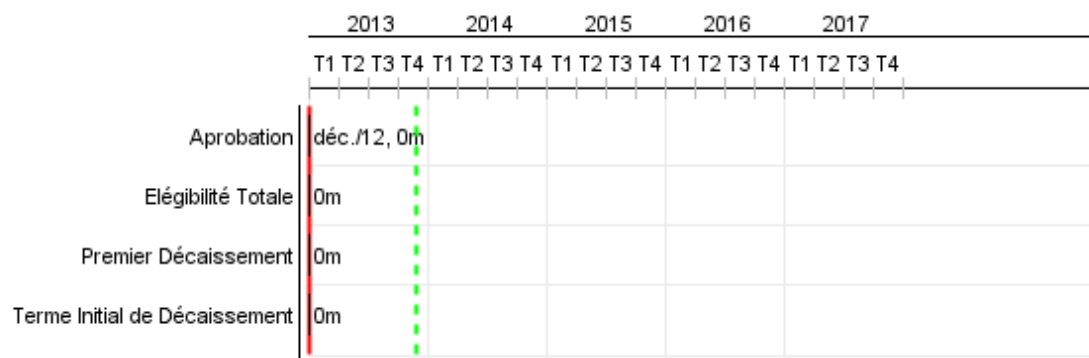

Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Fortalecer el capital social de las comunidades en los barrios atendidos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2017	Fin du Projet
Número de organizaciones comunitarias	Organizaciones		2013	P A		2,00
Participación de la comunidad en actividades sociales y comunitarias del programa	Porcentaje		2013	P A	30,00	30,00

Résultat: Aumentar las capacidades laborales de los habitantes de los barrios atendidos, especialmente de los grupos en riesgos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2017	Fin du Projet
Inserción laboral de jóvenes	Porcentaje		2013	P A	5,00	5,00

Résultat: Mejorar el acceso a los servicios urbanos básicos de los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2017	Fin du Projet
Cobertura de agua potable formal y alcantarillado sanitario	Hogares		2013	P A	2.975,00	2.975,00
Cobertura de drenaje pluvial	Porcentaje		2013	P A	95,00	95,00
Cobertura de accesos viales y peatonales	Porcentaje		2013	P A	95,00	95,00
Cobertura de alumbrado público	Porcentaje		2013	P A	95,00	95,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Mejora en la convivencia social									
Talleres de capacitación laboral en colonias de la Zona 1 que incluye los barrios: San Juan del Norte (1 y 2), Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Talleres completados				18,00				4.500,00
Talleres sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de la Zona 1 que incluye los barrios: San Juan del Norte (1 y 2), Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Talleres completados				18,00				4.500,00
Convivencias de integración para líderes comunitarios de las colonias de Zona 1	Retiros realizados				1,00				11.000,00
Convivencias de integración y convivencia para jóvenes de las colonias de Zona 1	Retiros completados				3,00				33.000,00
Eventos recreativos para niños de las colonias de la Zona 1	Eventos				4,00				44.000,00
Curso de capacitación laboral en colonias de la Zona 1	Cursos completados				1,00				235.000,00
Talleres capacitación laboral en colonias de la Zona 2 que incluye los barrios: David Betancourt, Arcieri (1 y 2), Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición	Talleres completados				29,00				11.600,00
Talleres sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de Zona 2	Talleres completados				29,00				11.600,00
Convivencias de integración para líderes comunitarios de las colonias de Zona 2	Retiros completados				1,00				11.000,00
Convivencias de integración y convivencia para jóvenes de las colonias de Zona 2	Retiros completados				3,00				33.000,00
Eventos recreativos para niños de la zona 2	Eventos realizados				4,00				44.000,00
Curso de capacitación laboral en colonias de la Zona 2	Cursos completados				2,00				470.000,00
Consultoría de Sistematización de las intervenciones sociales	Propuesta elaborada				1,00				35.000,00
Imprevistos	N/A								60.200,00
Convenio Bancario	N/A								9.000,00
Unidad de Enlace Técnico Comunitario (en campo)	N/A								417.600,00
Proyectos de integración urbana									

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Proyectos de Integración Urbana en Zona 1, Lote 1 que incluye barrios: San Juan del Norte 1 y 2, Buenas Nuevas	Barrio urbanizado				2,00				2.615.000,00
Proyectos de Integración Urbana en Zona 1, Lote 2 que incluye los barrios: Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Barrio urbanizado				3,00				2.417.000,00
Proyectos de integración urbana en la Zona 2 que incluye los barrios: David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición	Barrio urbanizado				4,00				8.036.840,00
Imprevistos	N/A								201.160,00
Culminación del Proyecto de integración urbana en la Colonia Villacristina	Barrio urbanizado				1,00				330.000,00
Gestión del Programa y Evaluación									
Gastos operativos, monitoreo (ETEC), equipamiento, auditoría externa e imprevistos	N/A								1.430.000,00
Consultorías para diseño de estrategia de comunicación, evaluación intermedia y final del programa, preparación de línea de base y evaluación de impacto del programa	N/A								235.000,00
Costos financieros									
Intereses	N/A								500.000,00
TOTAL									17.200.000,00
