



Operation Number: **HO-L1088**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **7/10/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/10/2014**
Division Chief validation date: **07/11/2014**
Country Representative validation date: **07/22/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program for integration and urban coexistence	Loan Number:	2895/BL-HO
Executing Agency (EA):	FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL		
Team Leader:	Perez Rincon,Belinda	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HONDURAS
Borrower:	REPUBLICA DE HONDURAS	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HO-L1088	\$17,200,000.00	\$17,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HO-L1088	\$17,200,000.00	\$300,000.00	1.74%	\$16,900,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

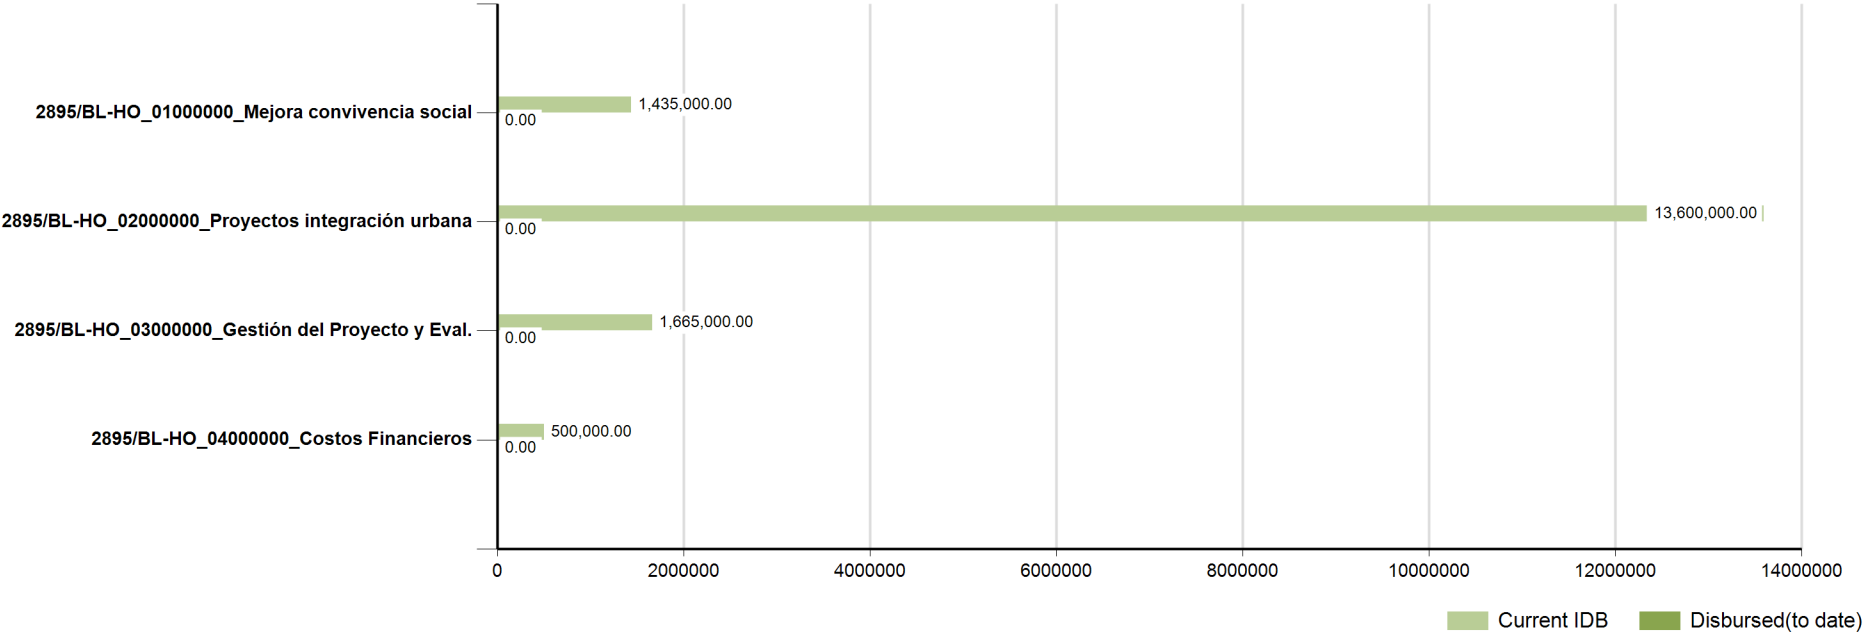

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones de seguridad de los barrios								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Percepción de seguridad de los habitantes de las comunidades atendidas			Porcentaje	0.00	2013	Informe de firma independiente para la elaboración de la línea de base y para la evaluación final del programa (incluye determinación de meta FDP)	La unidad de medida se refiere al número de habitantes que se sienten más seguros en el barrio (antes y después del programa) respecto al total de habitantes. Los datos discriminaran por género y por rango de edad	P	30.00
								P(a)	30.00
								A	
1.2 Hechos delictivos registrados por barrio intervenido			Número	86.50	2013	Datos recolectados por el observatorio local de violencia implementado con apoyo del programa	Preliminarmente, se asume como línea de base la tasa de homicidios de Tegucigalpa (2011) y una meta FDP de reducción del 30%. Incluye crímenes contra el patrimonio, contra personas y actos de violencia social y doméstica. Se implementará un observatorio l	P	61.00
								P(a)	61.00
								A	
Impact:	2 Valor de los inmuebles ubicados en los barrios atendidos								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	

2.1 Valor de los inmuebles residenciales						Se busca medir variaciones en los precios de las viviendas como consecuencia de mejoras en las características del barrio: vialidad, servicio de agua y saneamiento, transporte, seguridad, entre otros. La matriz de resultados establece una meta de aumento	P	26,650.00
							P(a)	26,650.00
							A	
		Lempiras por m2		2013	Encuesta específica en cada comunidad, a ser realizada por una firma independiente (línea de base y evaluación final del programa)			

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Fortalecer el capital social de las comunidades en los barrios atendidos
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
							P		2.00
1.1 Número de organizaciones comunitarias		Organizaciones	0.00	2013	Encuesta elaborada por firma independiente (para la línea de base y para la evaluación final del programa), lo que permitirá determinar la ambas metas	Se refiere a organizaciones que participan en las decisiones y actividades del programa. Se espera la participación del Patronato, la Junta de Agua, Sociedad de Padres y Representantes de la escuela y Comité de Emergencia Local (CODEL). Esto varía el bar	P(a)		2.00
	A								

1.2 Participación de la comunidad en actividades sociales y comunitarias del programa		Porcentaje	0.00	2013	Encuesta elaborada por firma independiente para la evaluación final del programa.	La unidad de medida se refiere al porcentaje de la población que participa en las actividades sociales y comunitarias respecto al total de habitantes de los barrios. Los datos sobre participación comunitaria serán discriminados por género y por rango de	P	30.00	30.00
						P(a)	30.00	30.00	
						A			
Outcome:	2 Aumentar las capacidades laborales de los habitantes de los barrios atendidos, especialmente de los grupos en riesgos								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
							P	5.00	5.00
2.1 Inserción laboral de jóvenes		Porcentaje	0.00	2013	Encuesta elaborada por firma independiente para la evaluación final del programa	La unidad de medida se refiere al número de jóvenes capacitados por el programa que están trabajando y han mantenido el empleo por más de tres meses respecto al total de jóvenes capacitados por el programa. Los datos serán discriminados por género y por r	P(a)	5.00	5.00
						A			
Outcome:	3 Mejorar el acceso a los servicios urbanos básicos de los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017			EOP
							P			
3.1 Cobertura de agua potable formal y alcantarillado sanitario	 RF	Hogares	0.00	2013	Informes final de la consultoría de supervisión de obras	La meta FDP equivale al 95% del total de viviendas ubicadas en los barrios seleccionados (3.132 viviendas). La línea de base deberá determinar el número exacto de hogares.	P	2,975.00	2,975.00	
							P(a)	2,975.00	2,975.00	
							A			
3.2 Cobertura de drenaje pluvial		Porcentaje	0.00	2013	Informes final de la consultoría de supervisión de obras	El número de viviendas en los barrios seleccionados se ha estimado en 3.132	P	95.00	95.00	
							P(a)	95.00	95.00	
							A			
3.3 Cobertura de accesos viales y peatonales		Porcentaje	0.00	2013	Informes final de la consultoría de supervisión de obras	El número de viviendas en los barrios seleccionados se ha estimado en 3.132	P	95.00	95.00	
							P(a)	95.00	95.00	
							A			
3.4 Cobertura de alumbrado público		Porcentaje	0.00	2013	Informes final de la consultoría de supervisión de obras	El número de viviendas en los barrios seleccionados se ha estimado en 3.132	P	95.00	95.00	
							P(a)	95.00	95.00	
							A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Mejora en la convivencia social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Talleres de capacitación laboral en colonias de la Zona 1 que incluye los barrios: San Juan del Norte (1 y 2), Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Talleres completados	P		18.00	P		11,200.00
		P(a)		18.00	P(a)		11,200.00
		A			A		
Talleres sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de la Zona 1 que incluye los barrios: San Juan del Norte (1 y 2), Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Talleres completados	P		18.00	P		11,200.00
		P(a)		18.00	P(a)		11,200.00
		A			A		
Convivencias de integración para líderes comunitarios de las colonias de Zona 1	Retiros realizados	P	1.00	1.00	P	2,100.00	2,100.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	2,100.00	2,100.00
		A	1.00	1.00	A	2,100.00	2,100.00
Convivencias de integración y convivencia para jóvenes de las colonias de Zona 1	Retiros completados	P		3.00	P		33,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		33,000.00
		A			A		
Eventos recreativos para niños de las colonias de la Zona 1	Eventos	P		4.00	P		44,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		44,000.00
		A			A		
Curso de capacitación laboral en colonias de la Zona 1	Cursos completados	P		1.00	P		180,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		180,000.00
		A			A		
Talleres capacitación laboral en colonias de la Zona 2 que incluye los barrios: David Betancourt, Arcieri (1 y 2), Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición	Talleres completados	P		29.00	P		11,600.00
		P(a)		29.00	P(a)		11,600.00
		A			A		
Talleres sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de Zona 2	Talleres completados	P		29.00	P		11,600.00
		P(a)		29.00	P(a)		11,600.00
		A			A		
Convivencias de integración para líderes comunitarios de las colonias de Zona 2	Retiros completados	P		1.00	P	2,100.00	2,100.00
		P(a)		1.00	P(a)	2,100.00	2,100.00
		A		1.00	A	2,100.00	2,100.00
Convivencias de integración y convivencia para jóvenes de las colonias de Zona 2	Retiros completados	P		3.00	P		33,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		33,000.00
		A			A		
Eventos recreativos para niños de la zona 2	Eventos realizados	P		4.00	P		44,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		44,000.00
		A			A		
Curso de capacitación laboral en colonias de la Zona 2	Cursos completados	P		2.00	P		210,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		210,000.00
		A			A		
Consultoría de Sistematización de las intervenciones sociales	Propuesta elaborada	P		1.00	P		35,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		35,000.00
		A			A		
Proyectos de integración urbana		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP

Proyectos de Integración Urbana en Zona 1, Lote 1 que incluye barrios: San Juan del Norte 1 y 2, Buenas Nuevas	Barrio urbanizado	P		2.00	P		1,700,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		1,700,000.00
		A			A		
Proyectos de Integración Urbana en Zona 1, Lote 2 que incluye los barrios: Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Barrio urbanizado	P		3.00	P		1,600,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		1,600,000.00
		A			A		
Proyectos de integración urbana en la Zona 2 que incluye los barrios: David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición	Barrio urbanizado	P		4.00	P		8,800,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		8,800,000.00
		A			A		
Culminación del Proyecto de integración urbana en la Colonia Villacristina	Barrio urbanizado	P		1.00	P		330,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		330,000.00
		A			A		
Gestión del Programa y Evaluación							
Costos financieros							

Other Cost		2013	Cost
Imprevistos - Componente 1	P		\$357,200.00
	P(a)		\$357,200.00
	A		
Unidad de Enlace Técnico Comunitario (en campo)	P	\$13,600.00	\$449,000.00
	P(a)	\$13,600.00	\$449,000.00
	A	\$13,600.00	\$13,600.00
Imprevistos - Componente 2	P		\$1,170,000.00
	P(a)		\$1,170,000.00
	A		
Gastos operativos, monitoreo (ETEC), equipamiento, auditoría externa e imprevistos	P	\$81,800.00	\$1,395,000.00
	P(a)	\$81,800.00	\$1,395,000.00
	A	\$81,800.00	\$81,800.00
Consultorías para diseño de estrategia de comunicación, evaluación intermedia y final del programa, preparación de línea de base y evaluación de impacto del programa	P		\$270,000.00
	P(a)		\$270,000.00
	A		
Intereses	P		\$500,000.00
	P(a)		\$500,000.00
	A		
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$99,600.00	\$17,200,000.00
	P(a)	\$99,600.00	\$5,125,400.00
	A	\$99,600.00	\$99,600.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
