





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	2242/BL-GU	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	50.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	GU-P1043, GU-T1134, GU-X1005	Saldo:	50.000.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		
		BID Original:	50.000.000,00
		Actual BID:	50.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	50.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	288

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 21-mar-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013

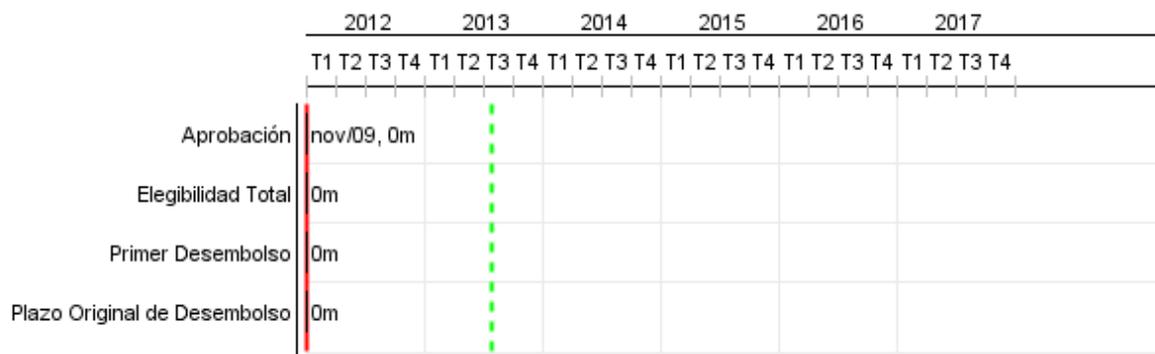

Progreso Acumulado al 2012

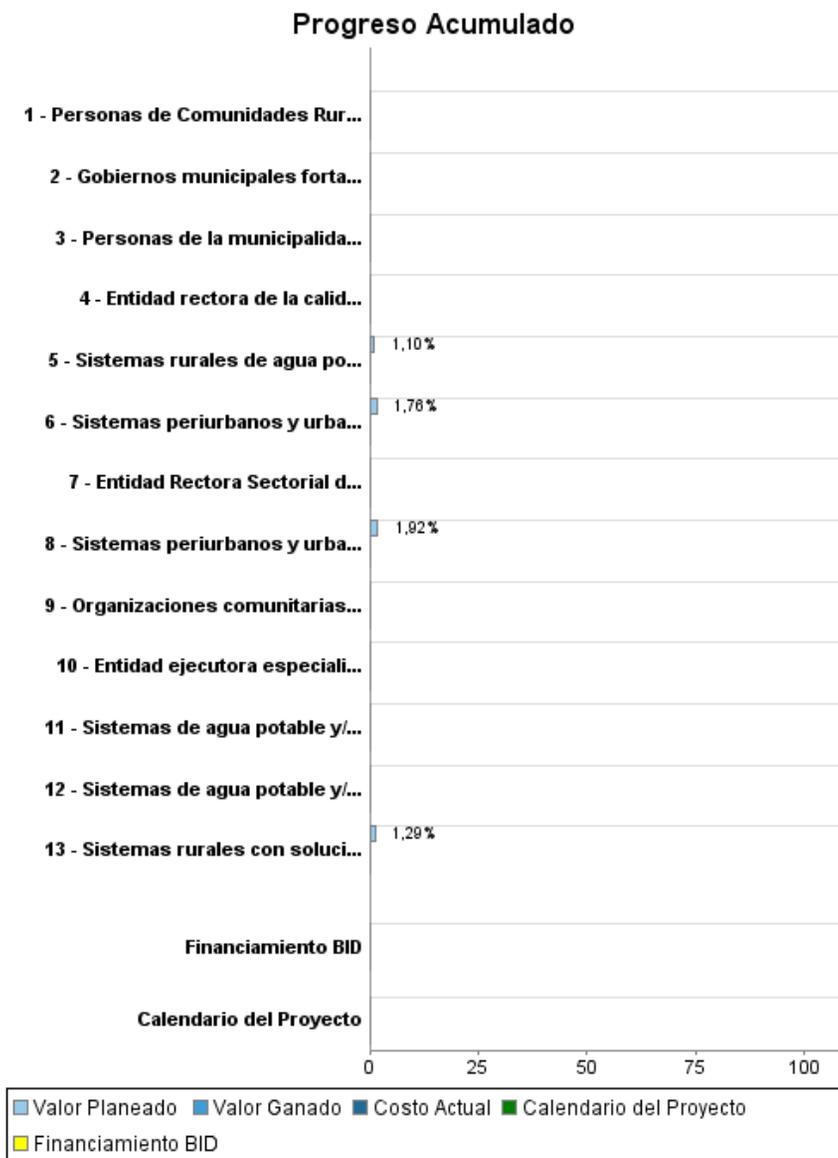

Resultados

Resultado:	Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Pública y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada
Supuestos:	Apoyo del Ministro de Salud para el alcance de las metas trazadas y el reconocimiento del sector de agua potable.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Rectoría sectorial fortalecida y funcionando	Entidades		2012	P A						1,00	1,00

Resultado:	Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central
Supuestos:	Apoyo del Gobierno Central para la consolidación de la Unidad.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Entidad ejecutora de Programas sectoriales autónoma funcionando	Entidad		2012	P A						1,00	1,00

Resultado:	Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala
Supuestos:	Priorización del tema por parte del Gobierno Central, Municipalidades y Comunidades Rurales

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Hogares rurales con sistema de agua potable contruidos o rehabilitados	Hogares		2012	P A		200,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.160,00	18.260,00
Hogares rurales con solución de saneamiento básico contruidos o rehabilitados	Hogares		2012	P A		300,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	5.340,00	23.240,00
Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruidos o rehabilitados	Hogares		2012	P A		500,00	7.000,00	7.000,00	6.100,00	5.400,00	26.000,00
Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruidos o rehabilitados	Hogares		2012	P A		600,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	7.400,00	34.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector									
Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad				1,00				1.500.000,00
Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad				1,00				1.500.000,00
Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad				1,00				700.000,00
Componente 2. Inversiones en Infraestructura									
Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas				100,00				400.000,00
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas				30,00				600.000,00
Sistemas rurales de agua potable contruídos o rehabilitados	sistemas				220,00				35.772.000,00
Sistemas rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	sistemas				280,00				17.148.000,00
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruídos o rehabilitados	sistemas				26,00				23.848.000,00
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruídos o rehabilitados	sistemas				34,00				11.432.000,00
Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización				280,00				1.500.000,00
Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas				2.240,00				750.000,00
Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Gobiernos				34,00				1.500.000,00
Personas de la municipalidad capacitadas	Personas				204,00				750.000,00
Administración del programa									
2600000	N/A								2.600.000,00
TOTAL									100.000.000,00
