
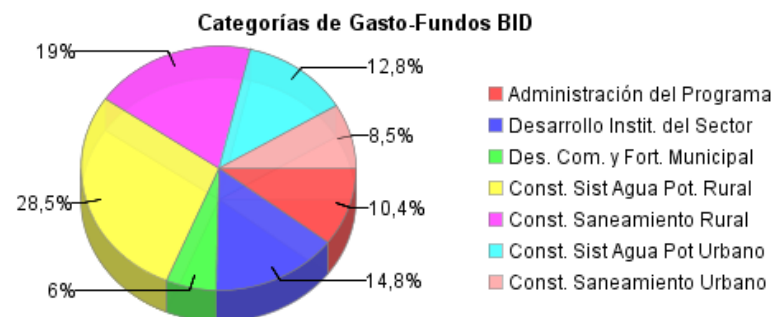
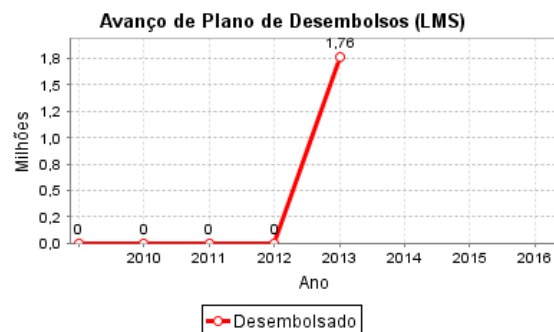



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 2242/BL-GU	Atual: 50.000.000,00	Original BID: 50.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.756.750,00	Corrente BID: 50.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 3,51	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: GU-P1043, GU-T1134, GU-X1005, GU-T1215	Saldo: 48.243.250,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 50.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 288

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 02-oct-2013

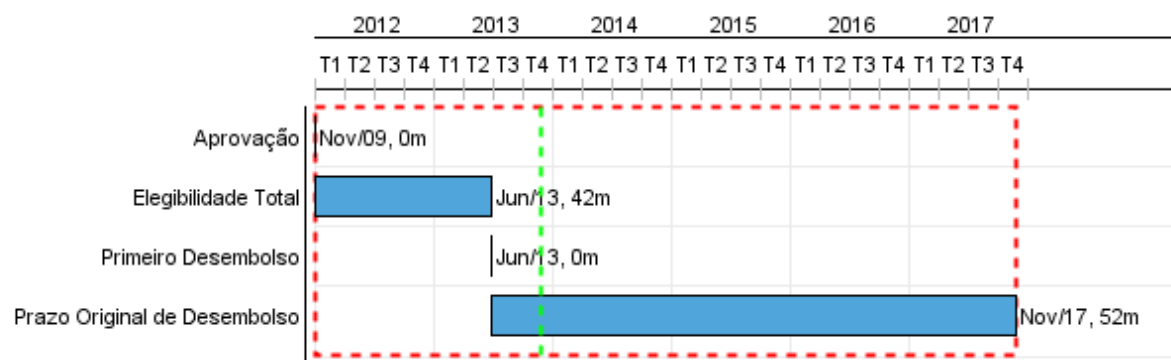

Progresso Acumulado até 2013

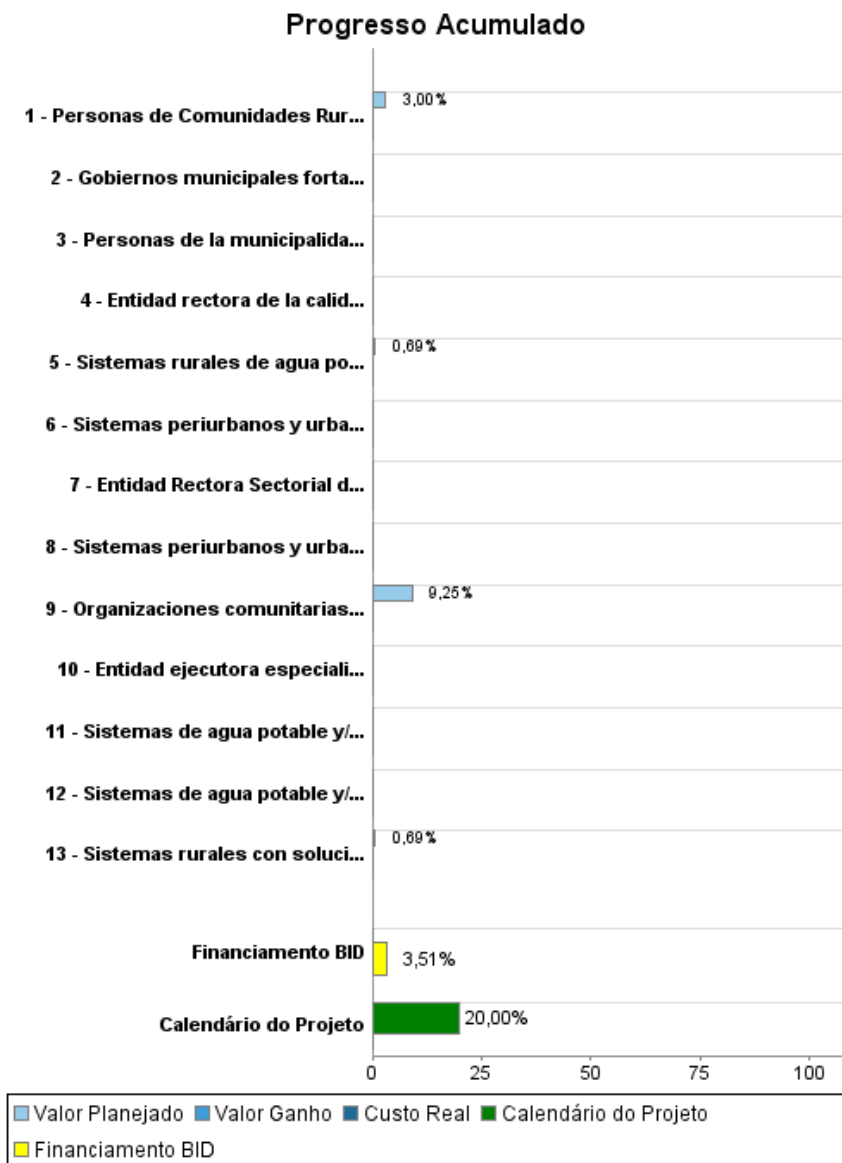

Resultados

Resultado:	Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Publica y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada
Suposições:	Apoyo del Ministro de Salud para el alcance de las metas trazadas y el reconocimiento del sector de agua potable.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Rectoria sectorial fortalecida y funcionando	Entidades		2012	P A						1,00	1,00

Resultado:	Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central
Suposições:	Apoyo del Gobierno Central para la consolidación de la Unidad.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Entidad ejecutora de Programas sectoriales autonoma funcionando	Entidad		2012	P A						1,00	1,00

Resultado:	Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala
Suposições:	Priorización del tema por parte del Gobierno Central, Municipalidades y Comunidades Rurales

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Hogares rurales con sistema de agua potable contruídos o rehabilitados	Hogares		2012	P A		200,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.160,00	18.260,00
Hogares rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	Hogares		2012	P A		300,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	5.340,00	23.240,00
Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable construídos o rehabilitados	Hogares		2012	P A				6.000,00	15.000,00	5.000,00	26.000,00
Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construídos o rehabilitados	Hogares		2012	P A				9.000,00	18.000,00	7.000,00	34.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector									
Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad				1,00				1.500.000,00
Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad				1,00				1.500.000,00
Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad				1,00				700.000,00
Componente 2. Inversiones en Infraestructura									
Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas				335,00				3.400.000,00
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas				32,00				3.000.000,00
Sistemas rurales de agua potable contruídos o rehabilitados	sistemas	2,00			220,00	240.000,00			34.908.000,00
Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruídos o rehabilitados	sistemas	2,00			280,00	160.000,00			23.272.000,00
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruídos o rehabilitados	sistemas				32,00				13.272.000,00
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruídos o rehabilitados	sistemas				32,00				8.848.000,00
Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización				280,00	370.000,00			4.000.000,00
Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas				84.000,00	30.000,00			1.000.000,00
Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Gobiernos				32,00				1.500.000,00
Personas de la municipalidad capacitadas	Personas				320,00				500.000,00
Administración del programa									
Administración del Programa	N/A					200.000,00			2.600.000,00
TOTAL						1.000.000,00			100.000.000,00
