




Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEDIO AMBIENTE DO ESTADO DE TOCANTINS				
Setor:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE				
Número da Operação:	2438/OC-BR	Atual:	99.000.000,00	Original BID:	99.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	99.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	
Operação Relacionada:	RG-P1400	Saldo:	99.000.000,00	Cofinanciamento/País:	66.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	165.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	


Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 25, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

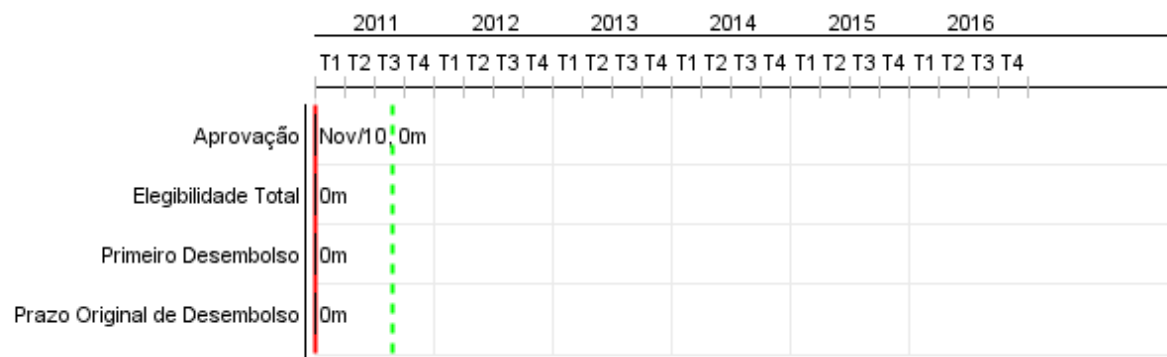

Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado

Financiamento BID
Calendário do Projeto

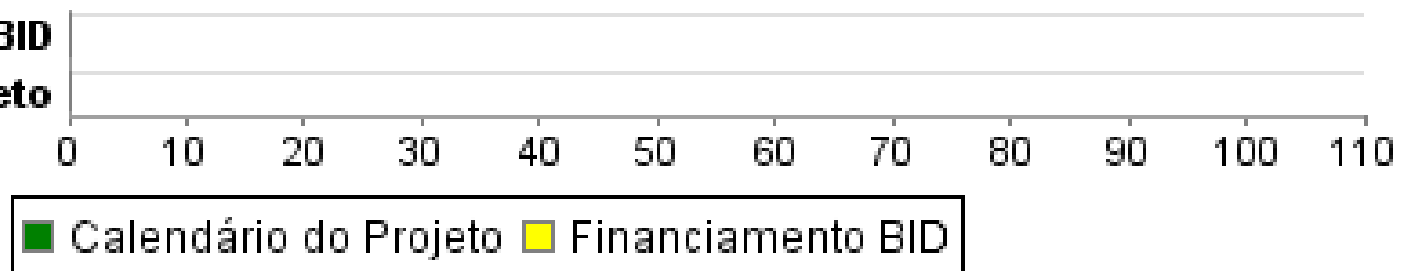

Resultados

Resultado:	Modelo de aproveitamiento hidro-agrícola sustentable en las cuencas de los ríos Pium y Riozinho adoptado.
Suposições:	Que tenga información adecuada cadastrada en el Informe Anual del Distrito de Riego
Observações:	Se medirá la cantidad de hectáreas con infraestructura de riego en operación en zona beneficiada por el proyecto. La meta al final del Año 5 es de 7100 hectáreas con riego operativo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	Final do Projeto
Hectáreas con infraestructura de riego en operación en zona beneficiada por el proyecto.	hectáreas	3.433,00	2009	P A	4.500,00	6.200,00	7.100,00

Resultado:	Aumenta el número de propiedades en la zona beneficiada por el proyecto (cuenca del Rio Pium y áreas irrigada de la cuenca de Riozinho) con regularización ambiental.
Suposições:	Se supone una medición confiable al inicio, al tercer año y al final del programa con base en informes de NATURATINS.
Observações:	Se medirá el aumento del % de propiedades del área beneficiada que cumplan con la norma legal vigente (Código forestal)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	Final do Projeto
Propiedades de la zona beneficiada por proyecto en acuerdo con la reglamentación ambiental vigente incrementadas	%	2,00	2009	P A	50,00		100,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Infraestrutura Productiva y Complementaria									
Producto 1: Embalse de acumulación con capacidad de 179 M metros cúbicos de agua construida.	millones de metros cúbicos				179,00				121.300.000,00
Producto 2: Red de infrasestructura sanitaria en los municipios de Pium y Lagoa da Confusão implantado .	red				2,00				2.100.000,00
Producto 3: Extensión de red vial mejorada en zona del proyecto.	km				63,00				4.200.000,00
Componente 2: Promoción y Apoyo al Desarrollo Regional									
Producto 4: Programas de desarrollo agrícola y promoción de cadenas agropecuarias implementados.	programas				5,00				2.700.000,00
Componente 3: Gestión Ambiental y Fortalecimiento Institucional									
Producto 5: Programas de monitoreo y evaluación de gestión ambiental implementados	Programas				10,00				3.500.000,00
Producto 6: Instituciones de gestión de recursos hídricos fortalecidas.	Instituciones				10,00				2.500.000,00
Costos de Administración del Programa									
TOTAL									136.300.000,00
