
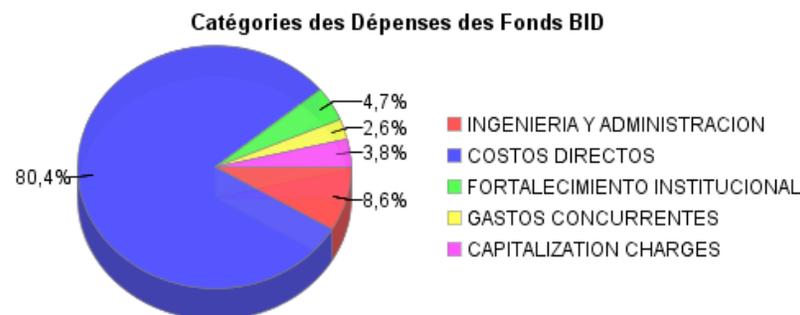
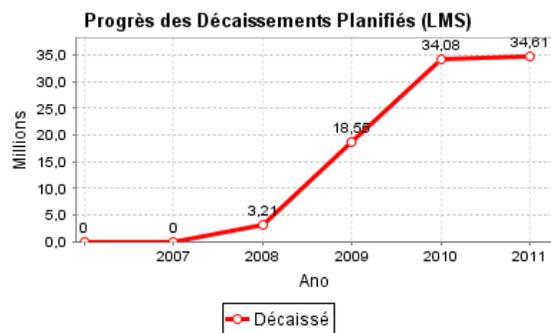



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Administradora Boliviana de Carreteras	Montant Courant Approuvé:	120.000.000,00	Initial BID:	120.000.000,00
Secteur:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS	Montant Décaissé à ce Jour:	34.368.676,61	Courant BID:	120.000.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	1833/SF-BO	% Décaissé:	28,64	Pari Passu:	100,00
Étape:	Approved	Solde:	85.631.323,39	Cofinancement/Pays:	
Type d' Opération:	INV - Investissement			Estimation Initiale:	120.000.000,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1054			Période d'Amortissement (mois):	354
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation				

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 23, 2011
		Validé par le Représentant: Sep 30, 2011

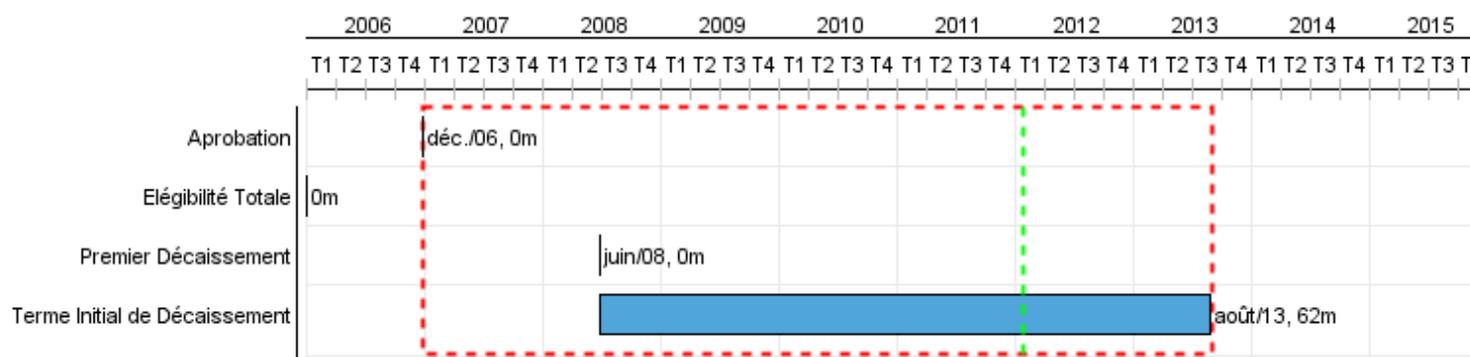

Progrès Cumulé à 2011

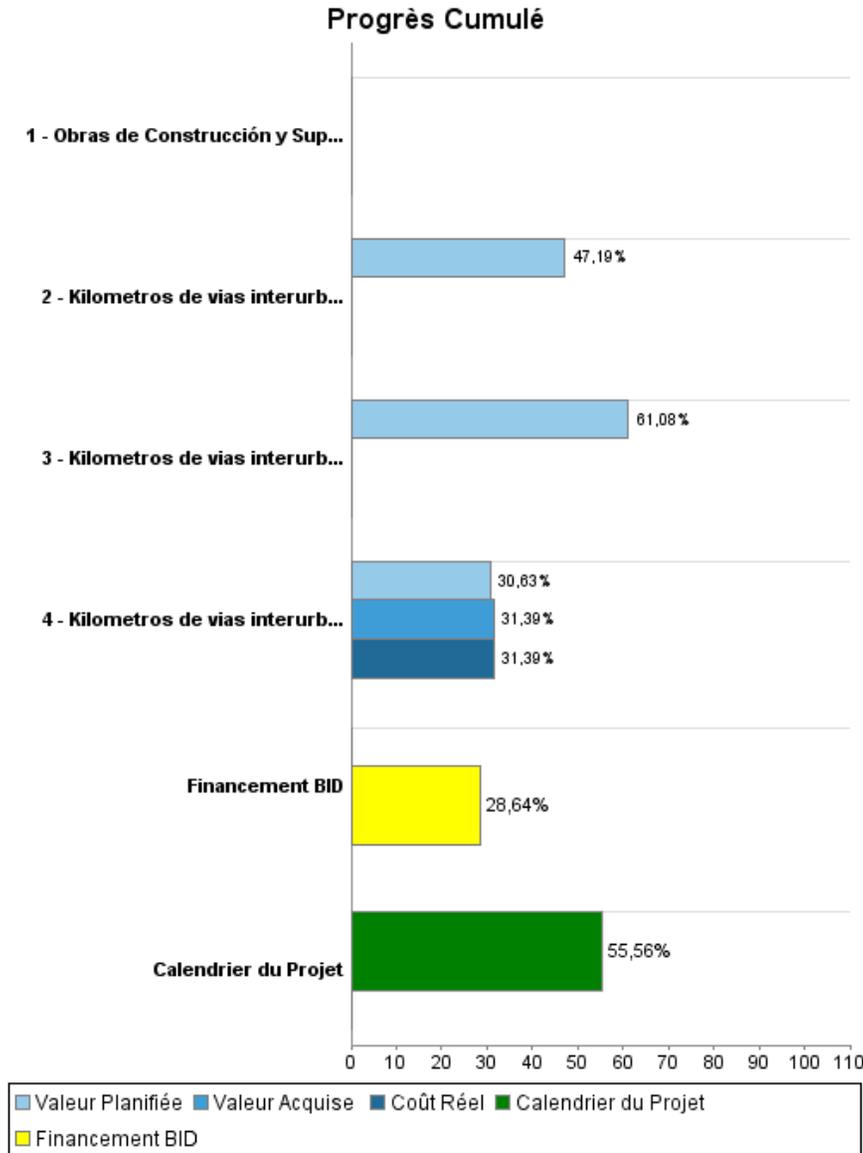

Résultats

Résultat: Red vial en el corredor Quiquibey -Yucumo - Rurrenabaque mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Tiempo de viaje de vehículos pesados.	Hrs	18,50	2010	P A		12,00
IRI	IRI	6,50	2010	P A		3,00
Tráfico vehicular diario en tramo Yucumo - Rurrenabaque.	Vehículos	209,00	2007	P A		575,00
Tráfico vehicular diario en tramo Yucumo - San Borja.	Vehículos	360,00	2007	P A		575,00
Costos de operación vehicular tramo Yucumo - Rurrenabaque.	Porcentaje	100,00	2011	P A	20,00	80,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 1:Mejoramiento, Rehabilitación y Pavimentación Vial									
Kilometros de vias interurbanas construidas (Tramo Quiquibey-Yucumo rehabilitado y pavimentado)	Kilómetros				41,00	4.680.000,00			18.273.020,00
Kilometros de vias interurbanas construidas (Tramo Yucumo-Rurrenabaque pavimentado)	Kilómetros				101,00	4.531.000,00	1.993.610,00		70.884.660,00
Kilometros de vias interurbanas construidas (Tramo Yucumo-San-Borja mejorado en afirmado)	Kilómetros				53,00	1.250.000,00			4.092.680,00
Componente 2: Construcción del Puente Rurrenabaque - San Buenaventura.									
Obras de Construcción y Supervisión Técnica del Puente Rurrenabaque - San Buenaventura y sus Accesos.	Puente				1,00				17.000.000,00
Componente 3: Fortalecimiento Institucional.									
Componente 4: Otros									
TOTAL						10.461.000,00	1.993.610,00		110.250.360,00
