
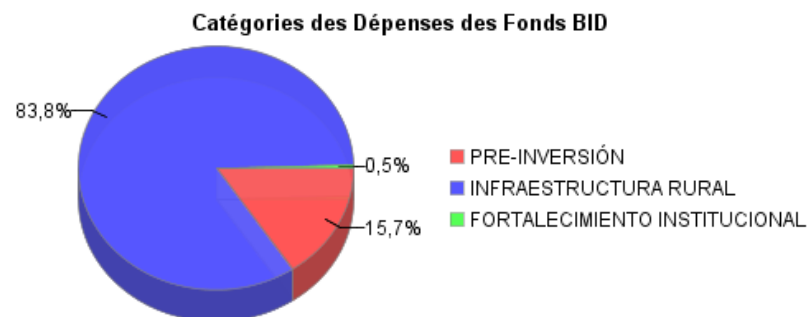


Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	BANCO DEL ESTADO		
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY		
Numéro(s) de Prêt(s):	2377/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	
Opération(s) Connexe(s):	EC-X1006, EC-T1218, RG-P1400	Solde:	30.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	30.000.000,00
		Courant BID:	30.000.000,00
		Pari Passu:	74,00
		Cofinancement/Pays:	10.600.000,00
		Estimation Initiale:	40.600.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 30, 2011 Validé par le Représentant: Oct 3, 2011

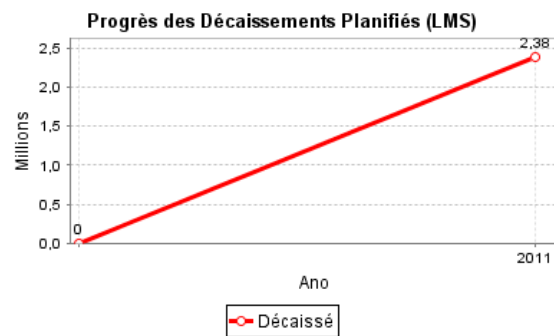

Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Prestadores de servicios fortalecidos en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Suposições:	El prestador de servicio desea participar del programa de Fortalecimiento.
Observações:	Se consideran Prestadores de Servicios: Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado-JAAPs, Comités, Prestadores comunitarios, y otros tipos de prestadores

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Prestadores de Servicio intervenidos	Prestadores		2010	P A	210,00
Juntas o prestadores de servicios que cuentan con mujeres miembros	juntas		2011	P A	100,00

Résultat:	Cobertura de Servicios de agua potable, mejorada o incrementada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Viviendas con abastecimiento de agua potable nuevo o mejorado	Hogares		2010	P A	50.000,00
Sistemas de agua potable que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminas las obras	sistemas		2011	P A	60,00
Sistemas de agua potable donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación	sistemas		2011	P A	60,00

Résultat:	Cobertura de Servicio y soluciones de saneamiento, mejorada o incrementada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Viviendas con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Viviendas		2010	P A	50.000,00
Sistemas de saneamiento donde los ingresos cubren los costos de operación	sistemas		2011	P A	60,00
Sistemas de saneamiento que disponen de un plan de operación y mantemiento en ejecución al terminar las obras	sistemas		2011	P A	60,00

Résultat:	Comunidades rurales y/o pequenas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Comunidades rurales y/o pequenas ciudades intervenidas	comunidades		2011	P A	210,00
Mujeres beneficiadas de la capacitación en los procesos de Desarrollo Comunitario	mujeres		2011	P	20.000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 1: Pre-inversión									
Diseños de obras realizados	Diseños	10,00			57,00	300.000,00			4.700.000,00
Composante 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento									
Sistemas de agua potable construidos	Sistemas				57,00	2.358.000,00			46.150.000,00
Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	UBS				3.000,00				4.500.000,00
Composante 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario									
Organizaciones comunitarias responsables de la operación y mantenimiento, creadas y capacitadas	Organizaciones				57,00				1.250.000,00
Guía de Desarrollo Comunitario o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria promulgado.	Guía				1,00				250.000,00
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas				40.000,00				1.250.000,00
Funcionarios del MIDUVI fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios				100,00				50.000,00
Administración del programa									
TOTAL						2.658.000,00			58.150.000,00
