
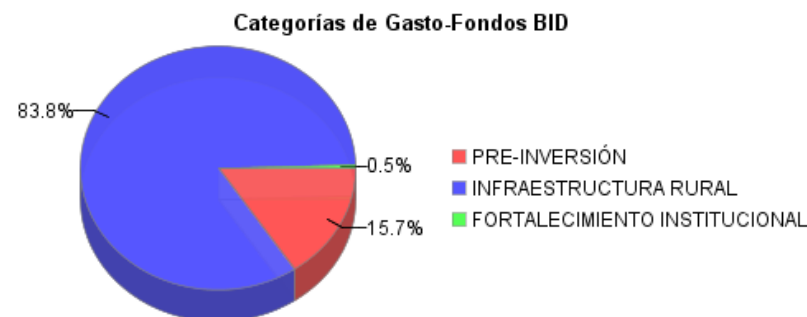
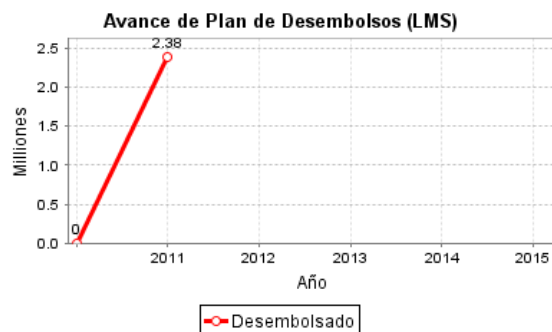


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	BANCO DEL ESTADO		
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY		
Número(s) de Préstamo:	2377/OC-EC	Monto Aprobado Actual: 30.000.000,00	BID Original: 30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 2.384.203,39	Actual BID: 30.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 7,95	Pari-passu: 74,00
Operación(es) Relacionada(s):	EC-X1006, EC-T1218, RG-P1400	Saldo: 27.615.796,61	Co-financiamiento/País: 10.600.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 40.600.000,00
			Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 03-may-2012 Validado por Representante de País: 03-may-2012

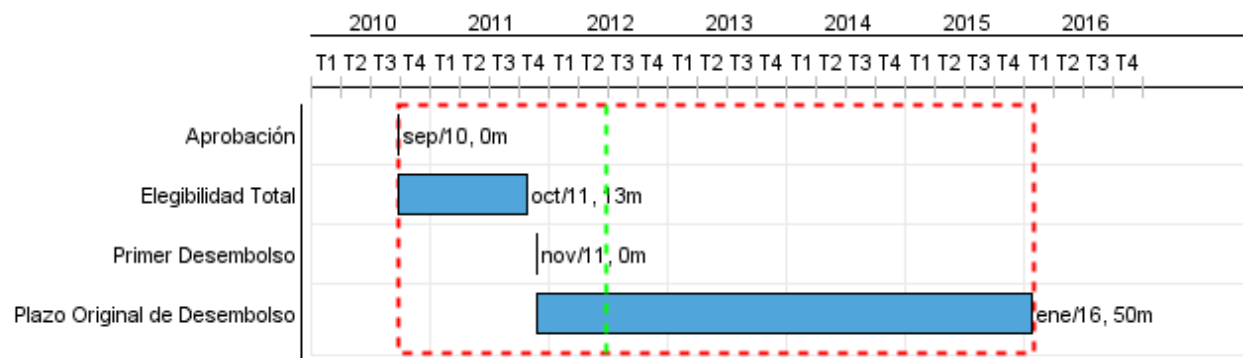

Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Prestadores de servicios fortalecidos en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Supuestos:	El prestador de servicio desea participar del programa de Fortalecimiento.
Observaciones:	Se consideran Prestadores de Servicios: Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado-JAAPs, Comités, Prestadores comunitarios, y otros tipos de prestadores

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57,00
Mujeres en puestos de administración de sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial)	%		2010	P A	4.00	7.00	4.00	5.00	20,00

Resultado:	Cobertura de servicios de agua potable y saneamiento incrementada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares	288,400.00	2010	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40.000,00
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares	166,400.00	2010	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40.000,00
Sistemas de agua potable y saneamiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57,00
Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57,00

Resultado:	Comunidades rurales y/o pequeñas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Comunidades rurales intervenidas	Comunidades		2010	P A	22.00	74.00	66.00	48.00	210,00
Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Mujeres		2010	P A	4,210.00	6,877.00	4,210.00	4,303.00	19.600,00
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Habitantes		2011	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Pre-inversión									
Estudios elaborados	Estudios				57,00				4.700.000,00
Componente 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento									
Sistemas de agua potable operando	Sistemas				29,00				15.321.792,00
Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	UBS				3.000,00				4.684.623,00
Sistemas de saneamiento	Sistemas				28,00				30.643.585,00
Componente 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores				57,00				1.250.000,00
Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Guía				1,00				
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas				40.000,00				1.250.000,00
Funcionarios del MIDUVI fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios				100,00				300.000,00
Administración del programa									
TOTAL									58.150.000,00
