
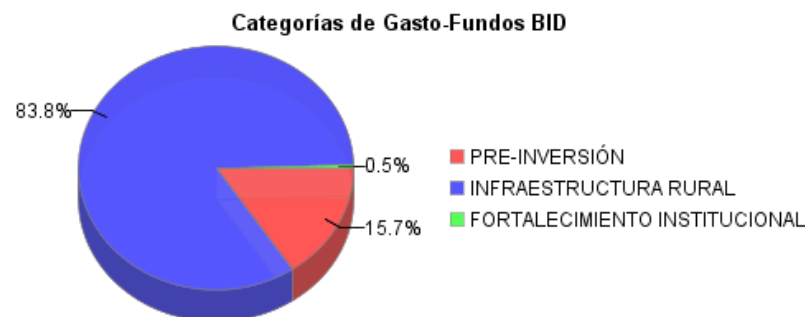
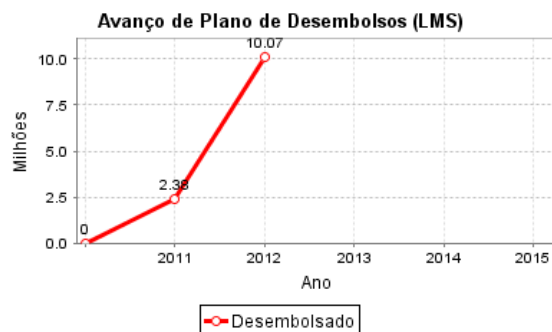



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	BANCO DEL ESTADO		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número da Operação:	2377/OC-EC	Atual:	30.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	10.069.723,39
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	33,57
Operação Relacionada:	EC-X1006, EC-T1218, RG-P1400	Saldo:	19.930.276,61
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	30.000.000,00
		Corrente BID:	30.000.000,00
		Pari-passu:	74,00
		Cofinanciamento/País:	10.600.000,00
		Original Estimado:	40.600.000,00
		Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2012

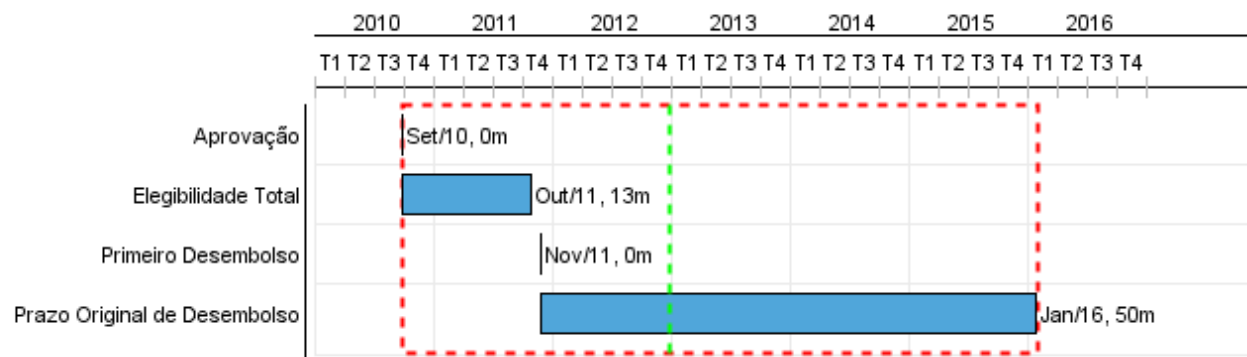

Progresso Acumulado até 2012

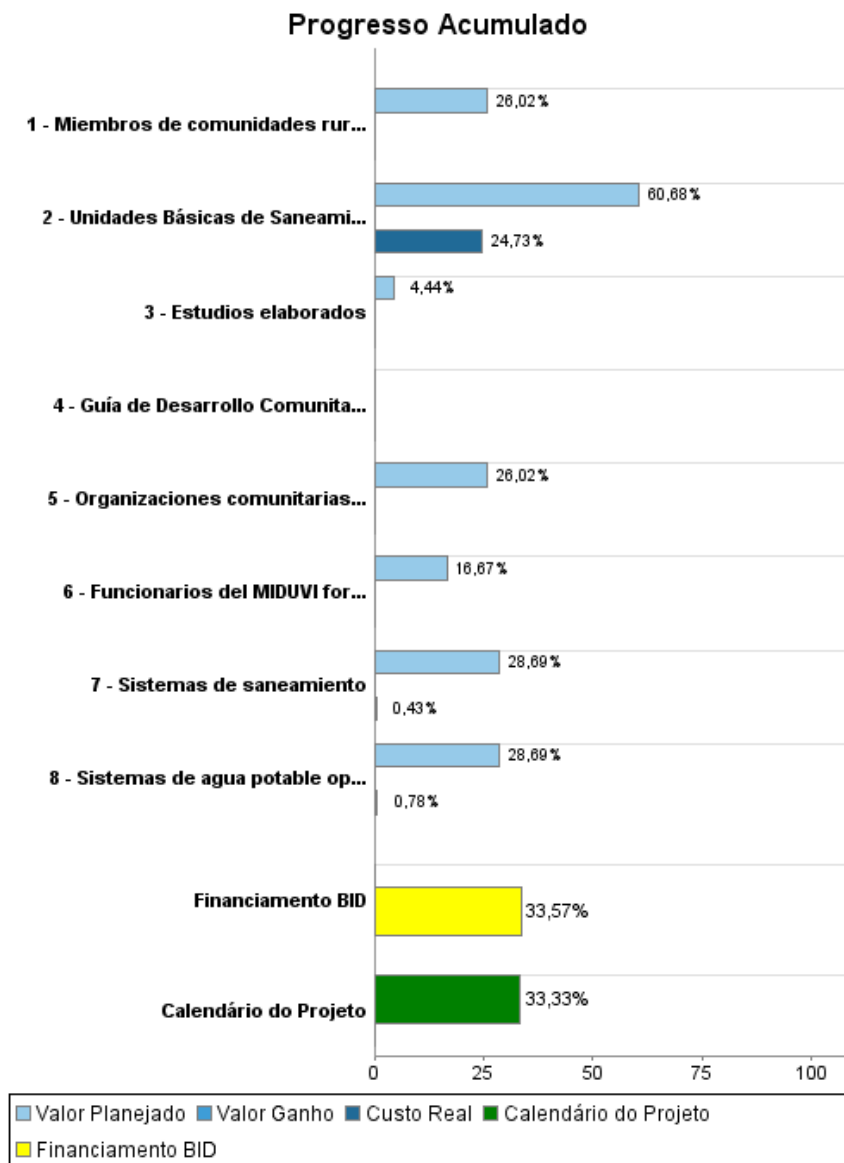

Resultados

Resultado:	Prestadores de servicios fortalecidos en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Suposições:	El prestador de servicio desea participar del programa de Fortalecimiento.
Observações:	Se consideran Prestadores de Servicios: Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado-JAAPs, Comités, Prestadores comunitarios, y otros tipos de prestadores

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57.00
Mujeres en puestos de administración de sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial)	%		2010	P A	4.00	7.00	4.00	5.00	20.00

Resultado:	Cobertura de servicios de agua potable y saneamiento incrementada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares	288,400.00	2010	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40,000.00
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares	166,400.00	2010	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40,000.00
Sistemas de agua potable y saneamiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57.00
Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57.00

Resultado:	Comunidades rurales y/o pequenas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Comunidades rurales intervenidas	Comunidades		2010	P A	22.00	74.00	66.00	48.00	210.00
Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Mujeres		2010	P A	4,210.00	6,877.00	4,210.00	4,303.00	19,600.00
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Habitantes		2011	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40,000.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Pre-inversión									
Estudios elaborados	Estudios	10,00			57,00	208.712,00			4.700.000,00
Componente 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento									
Sistemas de agua potable operando	Sistemas	3,00			29,00	4.395.194,00	119.229,30		15.321.792,00
Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	UBS	2.000,00			3.000,00	2.842.477,00	1.158.314,00		4.684.623,00
Sistemas de saneamiento	Sistemas	3,00			28,00	8.790.387,00	132.235,54		30.643.585,00
Componente 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores	16,00			57,00	325.209,00			1.250.000,00
Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Guía	1,00	1,00		1,00				
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas	8.421,00			40.000,00	325.209,00			1.250.000,00
Funcionarios del MIDUVI fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios	50,00			100,00	50.000,00			300.000,00
Administración del programa									
Administración del Programa	N/A					799.804,00	3.300,00		2.450.000,00
TOTAL						17.736.992,00	1.413.078,84		60.600.000,00
