
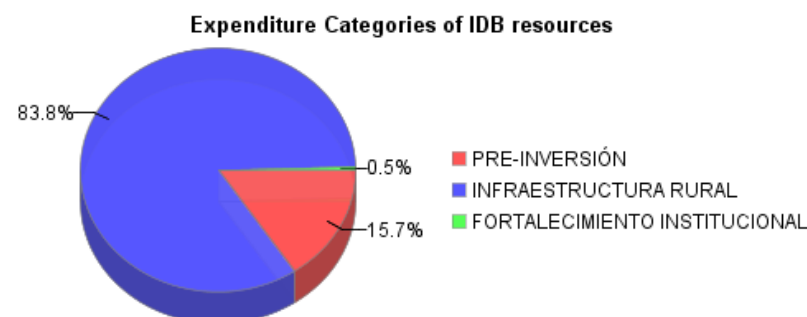
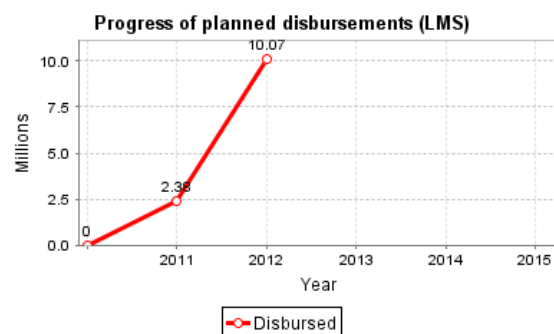



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	BANCO DEL ESTADO				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2377/OC-EC	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	10.069.723,39	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	33,57	Pari-passu:	74,00
Related Operation(s):	EC-X1006, EC-T1218, RG-P1400	Balance:	19.930.276,61	Co-Financing/Country:	10.600.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	40.600.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2012 Validated by Country Representative: 27-sep-2012

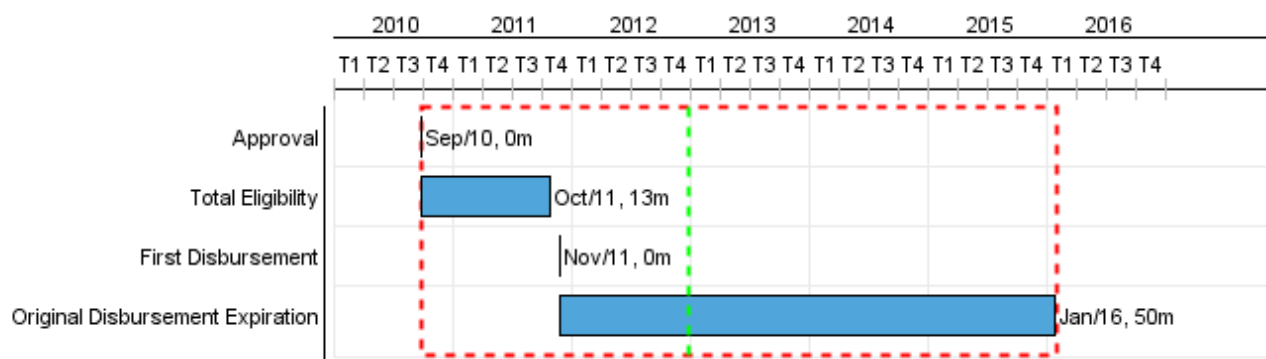

Accumulated Progress as of 2012

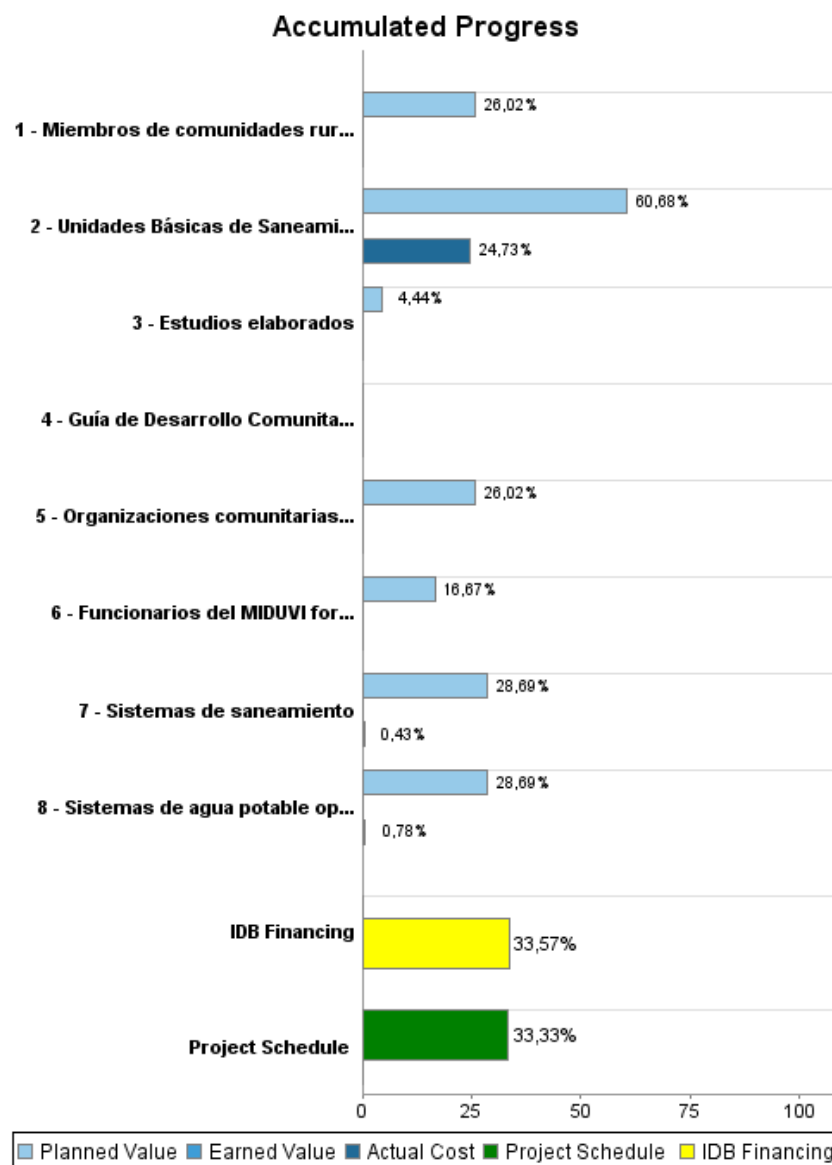

Outcomes

Outcome:	Prestadores de servicios fortalecidos en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Suppositions:	El prestador de servicio desea participar del programa de Fortalecimiento.
Comments:	Se consideran Prestadores de Servicios: Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado-JAAPs, Comités, Prestadores comunitarios, y otros tipos de prestadores

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57.00
Mujeres en puestos de administración de sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial)	%		2010	P A	4.00	7.00	4.00	5.00	20.00

Outcome:	Cobertura de servicios de agua potable y saneamiento incrementada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares	288,400.00	2010	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40,000.00
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares	166,400.00	2010	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40,000.00
Sistemas de agua potable y saneamiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57.00
Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas		2010	P A	6.00	26.00	12.00	13.00	57.00

Outcome:	Comunidades rurales y/o pequeñas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Comunidades rurales intervenidas	Comunidades		2010	P A	22.00	74.00	66.00	48.00	210.00
Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Mujeres		2010	P A	4,210.00	6,877.00	4,210.00	4,303.00	19,600.00
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Habitantes		2011	P A	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	40,000.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Pre-inversión									
Estudios elaborados	Estudios	10,00			57,00	208.712,00			4.700.000,00
Componente 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento									
Sistemas de agua potable operando	Sistemas	3,00			29,00	4.395.194,00	119.229,30		15.321.792,00
Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	UBS	2.000,00			3.000,00	2.842.477,00	1.158.314,00		4.684.623,00
Sistemas de saneamiento	Sistemas	3,00			28,00	8.790.387,00	132.235,54		30.643.585,00
Componente 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores	16,00			57,00	325.209,00			1.250.000,00
Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Guía	1,00	1,00		1,00				
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas	8.421,00			40.000,00	325.209,00			1.250.000,00
Funcionarios del MIDUVI fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios	50,00			100,00	50.000,00			300.000,00
Administración del programa									
Administración del Programa	N/A					799.804,00	3.300,00		2.450.000,00
TOTAL						17.736.992,00	1.413.078,84		60.600.000,00
