
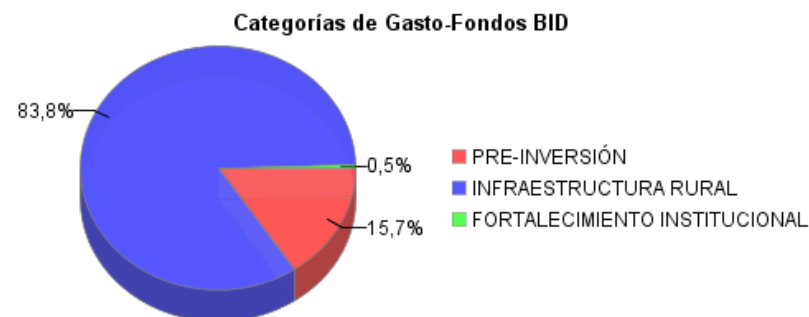
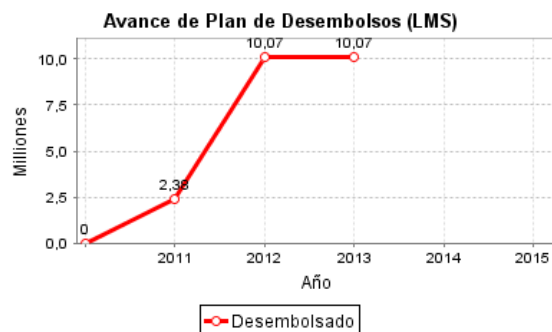



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	BANCO DEL ESTADO		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	2377/OC-EC	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	10.069.723,39
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	33,57
Operación(es) Relacionada(s):	EC-X1006, EC-T1218, RG-P1400	Saldo:	19.930.276,61
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	30.000.000,00
		Actual BID:	30.000.000,00
		Pari-passu:	74,00
		Co-financiamiento/País:	10.600.000,00
		Estimado Original:	40.600.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 27-mar-2013 Validado por Representante de País: 08-abr-2013

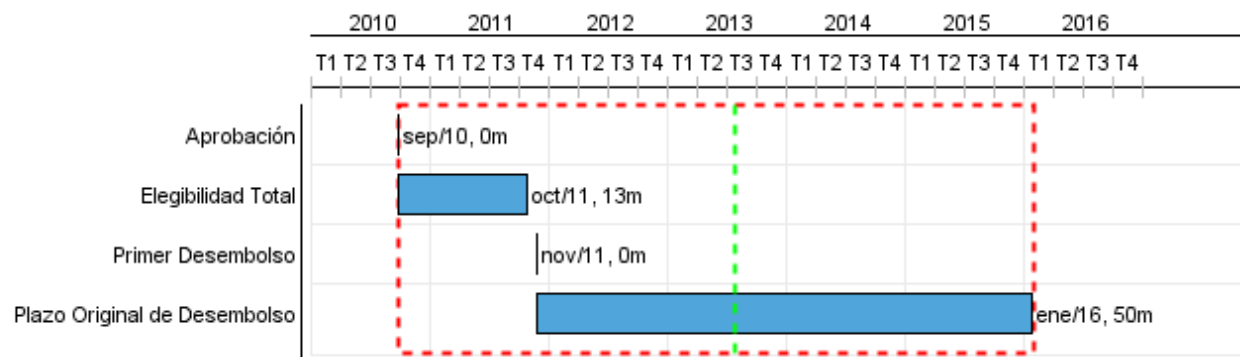

Progreso Acumulado al 2012

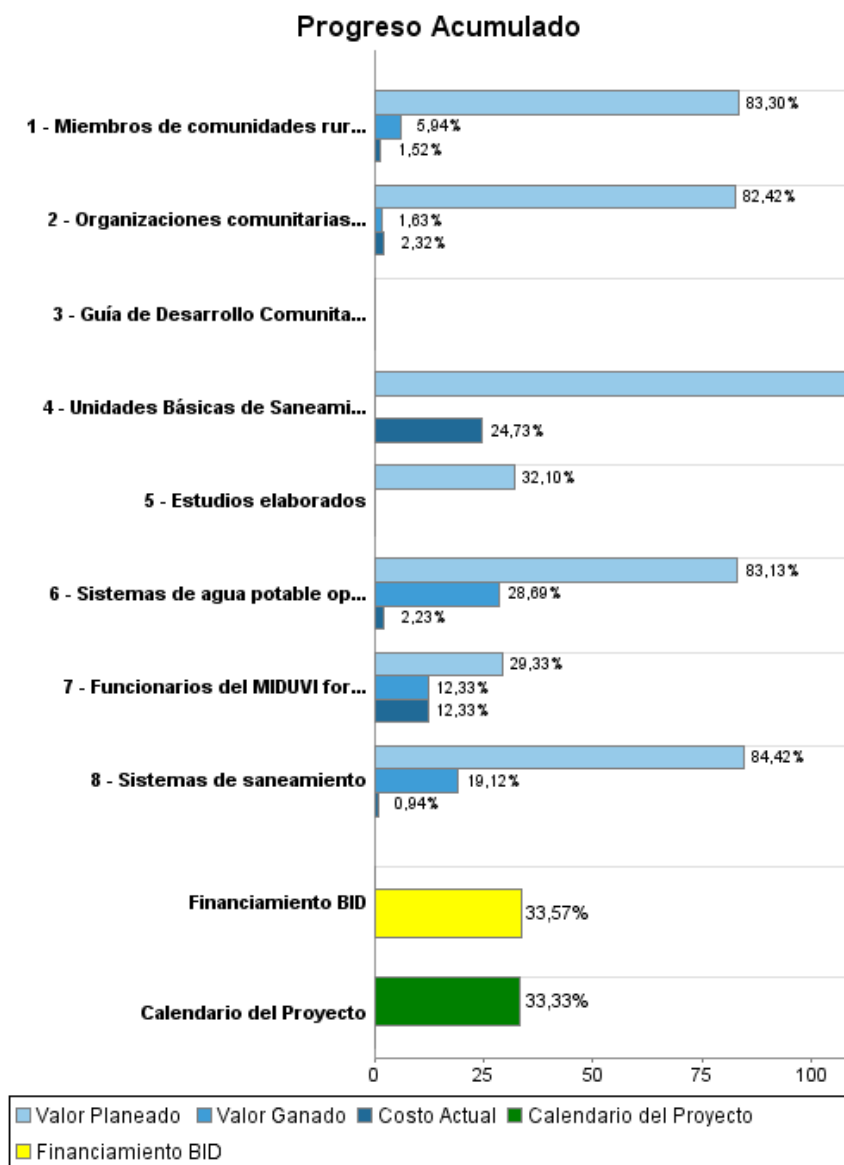

Resultados

Resultado:	Prestadores de servicios fortalecidos en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Supuestos:	El prestador de servicio desea participar del programa de Fortalecimiento.
Observaciones:	Se consideran Prestadores de Servicios: Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado-JAAPs, Comités, Prestadores comunitarios, y otros tipos de prestadores

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P	6,00	16,00	16,00	20,00	57,00
				A	5,00				
Sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial) con mujeres en puestos de administración	Sistemas		2010	P	4,00	7,00	4,00	5,00	20,00
				A					

Resultado:	Cobertura de servicios de agua potable y saneamiento incrementada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares	288.400,00	2010	P	8.421,00	14.035,00	15.421,00	10.339,00	336.616,00
				A	205,00				
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares	166.400,00	2010	P	8.421,00	14.035,00	15.421,00	10.202,00	214.479,00
				A	342,00				
Sistemas de agua potable y saneamiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas	Sistemas		2010	P	6,00	26,00	13,00	13,00	57,00
				A	5,00				
Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas		2010	P	6,00	26,00	13,00	13,00	57,00
				A	5,00				

Resultado:	Comunidades rurales y/o pequeñas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Comunidades rurales intervenidas	Comunidades		2010	P	22,00	74,00	79,00	48,00	210,00
				A	9,00				
Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Mujeres		2010	P	4.210,00	6.877,00	4.294,00	4.303,00	19.600,00
				A	4.126,00				
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Habitantes		2011	P	8.421,00	14.035,00	8.421,00	9.123,00	40.000,00
				A	8.421,00				

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Pre-inversión									
Estudios elaborados	Estudios	10,00			57,00	208.712,00			4.700.000,00
Componente 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento									
Sistemas de agua potable operando	Sistemas	3,00	3,00		29,00	4.395.194,00	341.450,00		15.321.792,00
Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	UBS	2.000,00			3.000,00	2.842.477,00	1.158.314,00		4.684.623,00
Sistemas de saneamiento	Sistemas	3,00	2,00		28,00	8.790.387,00	287.215,00		30.643.585,00
Componente 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores	16,00	1,00		57,00	325.209,00	29.000,00		1.250.000,00
Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Guía	1,00	1,00		1,00				
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas	8.421,00	1.924,00		40.000,00	325.209,00	19.000,00		1.250.000,00
Funcionarios del MIDUVI fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios	50,00	37,00		100,00	50.000,00	37.000,00		300.000,00
Administración del programa									
Administración del Programa	N/A					799.804,00	290.000,00		2.450.000,00
TOTAL						17.736.992,00	2.161.979,00		60.600.000,00
