
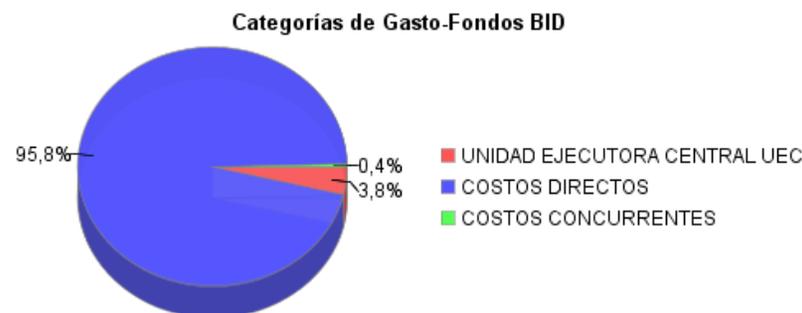


Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS	Monto Aprobado Actual:	200.000.000,00	BID Original:	200.000.000,00
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL DEVELOPMENT	Monto Desembolsado a la fecha:	101.159.202,28	Actual BID:	200.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	1956/OC-AR	% Desembolsado:	50,58	Pari-passu:	80,00
Etapas:	Approved	Saldo:	98.840.797,72	Co-financiamiento/País:	50.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	250.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	AR-X1006				
Subtipo de Operación:	CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión)			Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 14, 2011 Validado por Representante de País: Oct 21, 2011

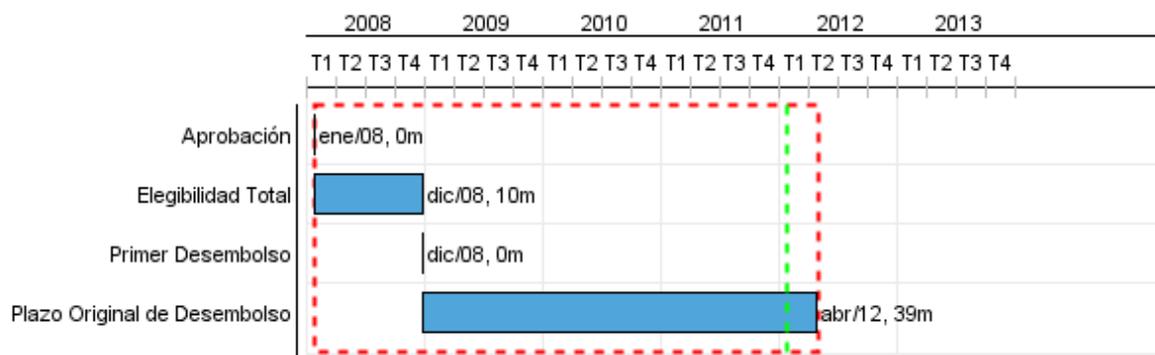

Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado

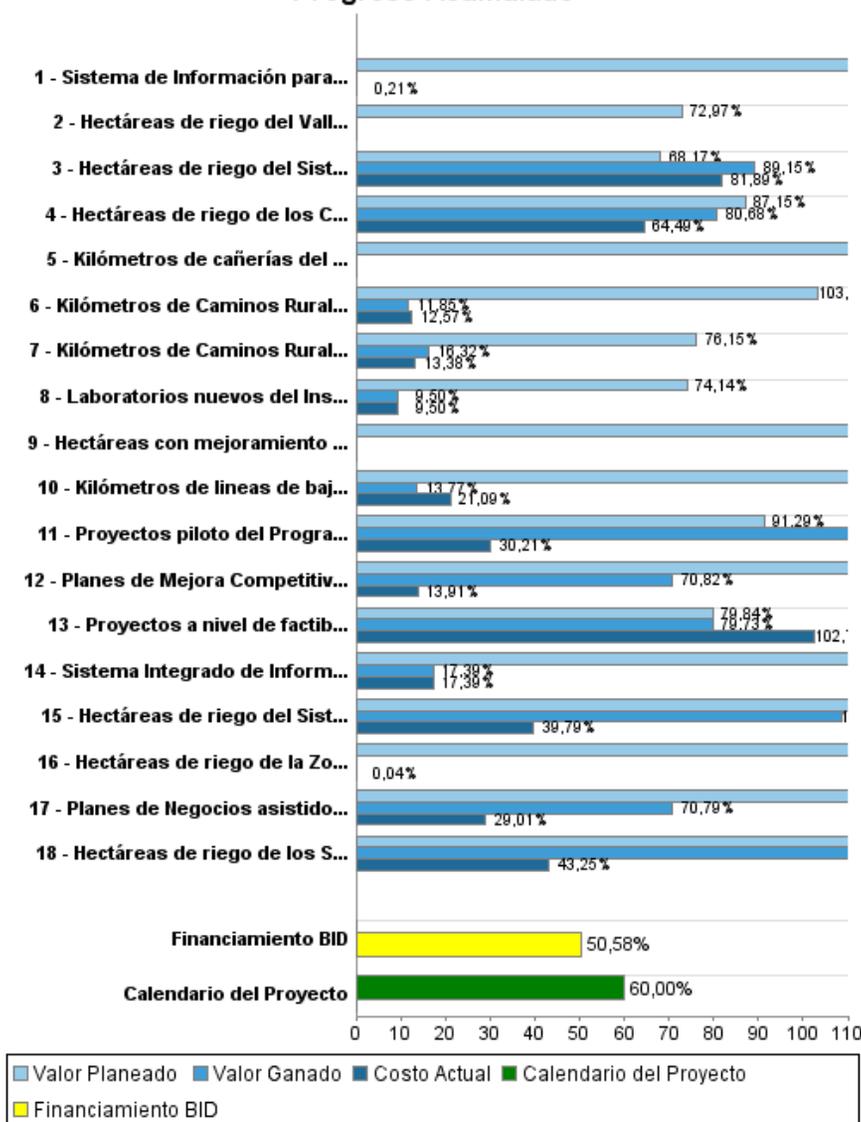

Resultados
Resultado: Área Irrigada en Producción

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Hectáreas con infraestructura de riego mejorada	Hectáreas		2006	P A	58.432,00

Resultado: Accesibilidad Rural Mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tránsito Diario Medio Estimado (TDME).	vehículos/día	67,00	2008	P A	74,00

Resultado: Zonas Rurales Conectadas a Sistemas de Energía

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Empresas Agropecuarias (EAPs) con acceso a energía para uso productivo.	Empresas		2008	P A	4.978,00

Resultado: Sistemas de Información y Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios Mejorados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Usuarios satisfechos por el uso del Sistema Integrado de Información Agropecuaria	%		2010	P A	70,00
Usuarios satisfechos con el uso del Sistema de Información Agrometeorológico de La Rioja	%		2010	P A	70,00

Resultado: Normas de Calidad Agroalimentaria Adoptadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Empresas agroalimentarias beneficiadas por el Programa que certificaron calidad	Empresas		2010	P A	200,00

Resultado: Instituto Nacional de Vitivinicultura fortalecido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Muestra de productos vitivinícolas con análisis de calidad	Muestra		2010	P A	50.050,00

Resultado: Encadenamientos Productivos Agroalimentarios Consolidados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Planes de Negocios asistidos que continúan operando	Planes		2008	P	256,00
				A	
Planes de Mejora Competitiva (PMC) consolidados	Planes		2009	P	16,00
				A	

Resultado: Competitividad de áreas rurales de economías regionales mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Agricultores a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas	Agricultores		2007	P	32.000,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Áreas de Riego Rehabilitadas									
Hectáreas de riego del Valle bonaerense del Río Colorado con infraestructura optimizada (CORFO I, II, III)	Has.	33.889,00			135.556,00	4.821.508,00			6.607.560,00
Hectáreas de riego del Sistema de Riego y Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut (Chubut) rehabilitadas	Has.	10.505,00	1.528,00		19.100,00	9.170.603,00	2.301.214,00		28.053.174,00
Hectáreas con mejoramiento de escurrimientos (suelos conservados) de la Región Pedemontana Etapa 1 (Córdoba)	Has.	53.103,00			106.205,00	3.067.608,00			5.905.490,00
Hectáreas de riego de la Zona Citrícola Villa del Rosario (Entre Ríos) rehabilitadas	Has.	1.007,00			1.678,00	7.040.866,00	3.350,00		8.126.074,00
Hectáreas de riego de los Sistemas de Riego Superficiales (La Rioja) rehabilitadas	Has.	189,00	943,00		6.285,00	5.132.060,00	1.376.938,00		6.882.232,00
Hectáreas de riego del Sistema Canal Matriz Nuevo Alvear (Mendoza) rehabilitadas	Has.	6.545,00	4.675,00		31.166,00	11.652.299,00	10.288.455,00		42.301.179,00
Hectáreas de riego de los Canales Socavón y Frugoni Marco (Mendoza) rehabilitadas	Has.	2.076,00	326,00		6.488,00	5.350.447,00	2.882.240,00		13.918.583,00
Caminos Rurales Rehabilitados									
Kilómetros de Caminos Rurales de la Provincia de Entre Ríos (Zona VII) rehabilitados	Kms.	112,00	24,00		160,00	28.738.285,00	5.049.099,00		37.737.016,00
Kilómetros de Caminos Rurales de la Provincia de Mendoza rehabilitados	Kms.	173,00	12,00		192,00	11.380.172,00	338.012,00		16.172.024,00
Zonas Rurales con Acceso a Sistemas de Energía									
Kilómetros de líneas de baja tensión tendidos por el Proyecto de Electrificación Rural III - Misiones	Kms.	908,00	61,00		1.020,00	14.484.450,00	1.155.668,00		23.332.608,00
Kilómetros de cañerías del Gasoducto desarrollado en Áreas Productivas de Entre Ríos instalados	Kms.	15,00			31,00	3.878.877,00			4.652.406,00
Servicios Mejorados									
Sistema Integrado de Información SIIA modernizado - Etapa II (MAGyP)	Sistema				1,00	2.641.908,00	297.465,00		4.165.236,00
Sistema de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (La Rioja) desarrollado	Sistema	1,00			1,00	1.043.608,00	3.484,00		1.628.158,00
Proyectos piloto del Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación en la Industria Agroalimentaria (MAGyP) ejecutados	Proyectos	15,00	15,00		35,00	2.290.704,00	542.000,00		3.747.039,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Laboratorios nuevos del Instituto Nacional de Vitivinicultura INV (MAGyP) en funcionamiento	Laboratorios				2,00	7.026.670,00	1.110.791,00		15.937.627,00
Negocios Agroalimentarios									
Planes de Negocios asistidos	Planes	110,00	50,00		320,00	7.291.667,00	2.011.651,00		11.500.000,00
Planes de Mejora Competitiva ejecutados	Planes	5,00	3,00		9,00	1.133.291,00	95.598,00		2.500.000,00
Costos de Administración y Fortalecimiento Institucional									
Preparación de Proyectos									
Proyectos a nivel de factibilidad aprobados	Proyectos	12,00	25,00		40,00	218.017,00	326.132,00		4.000.000,00
Costos Financieros									
TOTAL						126.363.040,00	27.782.097,00		237.166.406,00
