
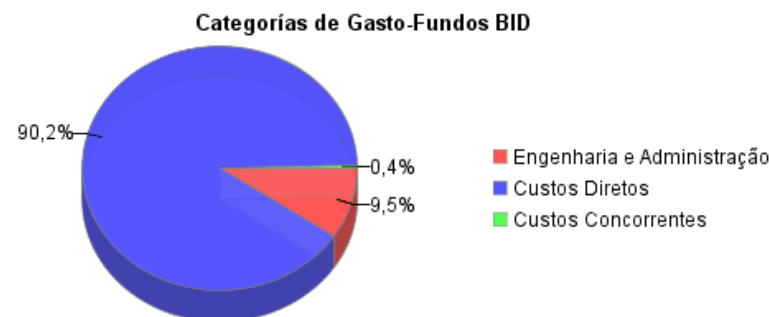
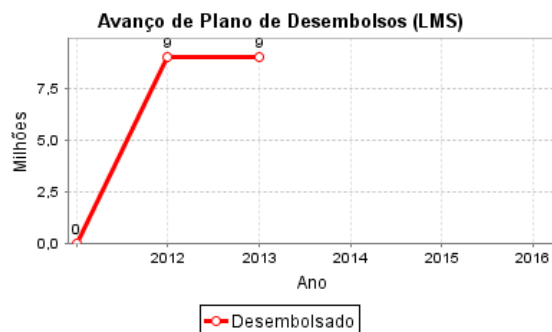



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	Secretaria del Estado de Rio de Janeiro para el Medio Ambiente				
Setor:	WATER AND SANITATION				
Número da Operação:	2646/OC-BR	Atual:	451.980.000,00	Original BID:	451.980.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	9.000.000,00	Corrente BID:	451.980.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	1,99	Pari-passu:	71,00
Operação Relacionada:	BR-T1202, RG-P1442	Saldo:	442.980.000,00	Cofinanciamento/País:	187.570.000,00
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimado:	639.550.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação	
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão:	03-oct-2013
		Validado pelo Representante do País:	04-oct-2013

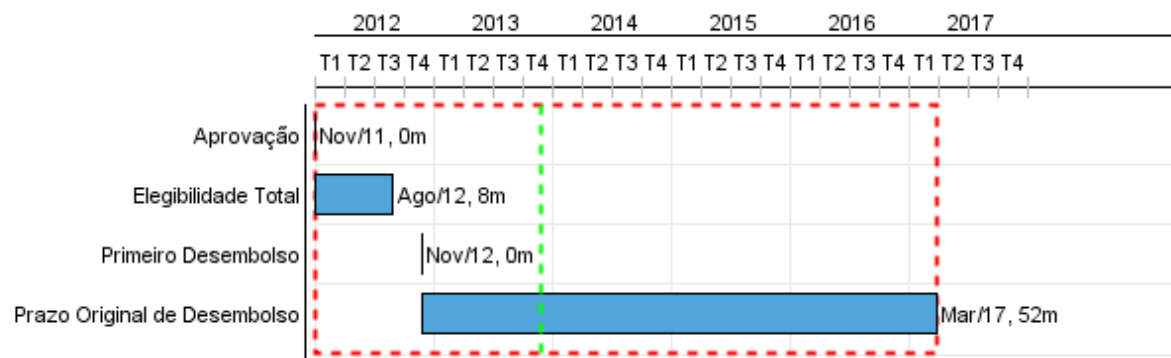

Progresso Acumulado até 2013

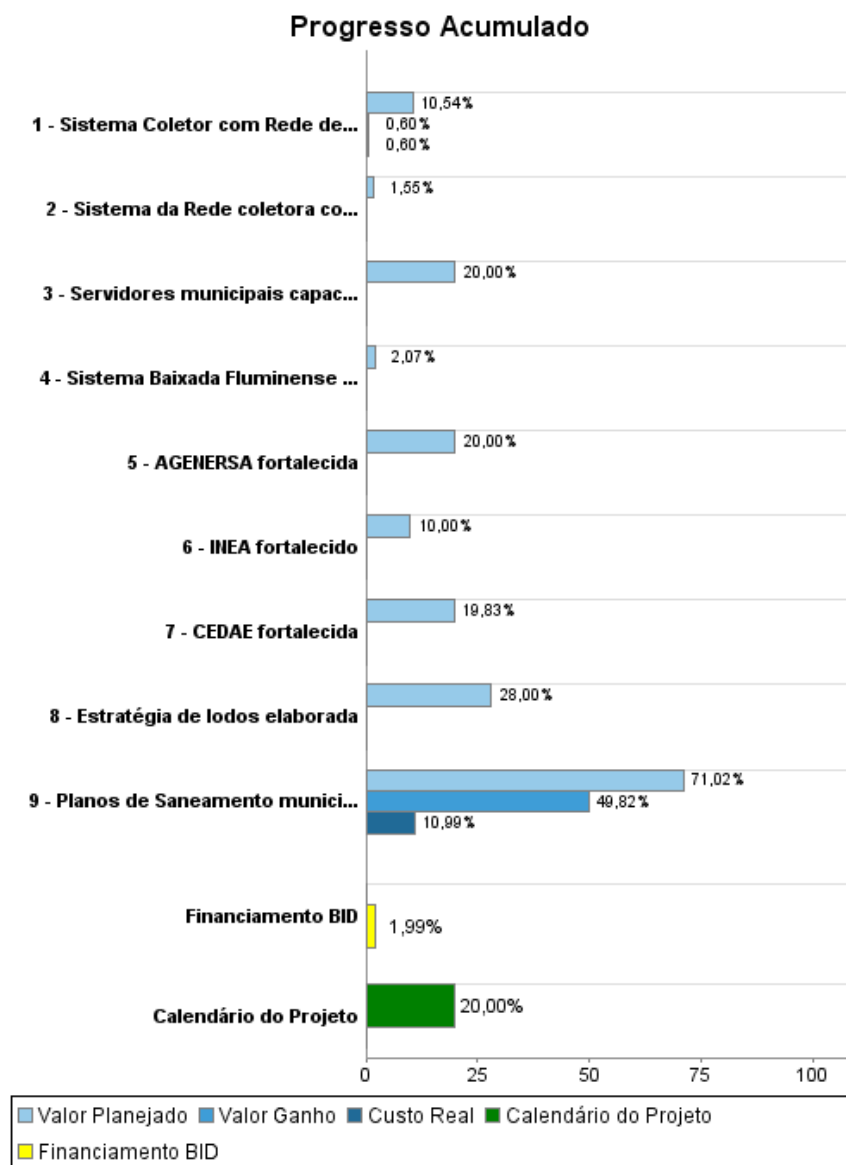

Resultados

Resultado: Vazão coletada e tratada nas ETEs incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Esgoto tratado na ETE Alegria	Litros/seg	790,00	2011	P A					1.540,00
Esgoto tratado na ETE Alcântara	Litros/seg		2011	P A					515,00

Resultado: Famílias atendidas com tratamento de esgoto a nível secundário

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Famílias conectadas ao sistema de tratamento secundario de esgoto (ETE Alegria)	Domicilios	129.365,00	2011	P A					188.365,00
Famílias conectadas ao sistema de tratamento secundario de esgoto (ETE Alcântara)	Domicilios		2011	P A					45.495,00
Famílias conectadas ao sistema de tratamento secundário de esgoto (Sistema Baixada Fluminense)	Domicilios		2012	P A					26.140,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Domicilios	129.365,00	2011	P A					260.000,00

Resultado: Contratos ajustados na área do PSAM

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Contratos ajustados	Contratos		2011	P A		3,00	3,00	2,00	8,00

Resultado: Plano de monitoramento atualizado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Atualização do plano de monitoramento	Plano		2011	P A	1,00				1,00

Resultado: Plano de redução de perdas de água aprovado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Aprovação do plano de redução de perdas de água	Plano		2011	P A		1,00			1,00

Resultado: Estratégia de gestão de lodos aprovada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Aprovação da estratégia de gestão de lodos	Estratégia		2011	P A		1,00			1,00

Resultado: Planos de saneamento municipais aprovados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Planos aprovados	Planos		2011	P A	2,00	6,00	6,00		14,00

Resultado: Projetos de captação de recursos elaborados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Projetos elaborados	Projetos		2011	P A		8,00	8,00		16,00

Resultado: Municípios do PSAM incorporados ao Programa Nacional de Nota Fiscal

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Municípios incorporados	Municípios		2011	P A		4,00	4,00		8,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Obras e equipes para coleta e tratamento de esgotos									
Sistema da Rede coletora construído (Cidade Nova e Tijuca)	Sistema				1,00	1.100.000,00			70.749.000,00
Sistema Coletor com Rede de Esgoto e estação de tratamento contruído (Sistema Alcântara)	Sistema				1,00	12.500.000,00	1.230,00		125.698.000,00
Sistema Baixada Fluminense contruído	Sistema				1,00	5.000.000,00			241.431.000,00
Outras obras a definir	N/A								106.871.000,00
Melhoria operacional e Desenvolvimento Institucional									
AGENERSA fortalecida	Agência				1,00	720.000,00			3.600.000,00
INEA fortalecido	Instituto				1,00	360.000,00			3.600.000,00
CEDAE fortalecida	Companhia				1,00	1.150.000,00			5.800.000,00
Estratégia de lodos elaborada	Estratégia				1,00	840.000,00			3.000.000,00
Sustentabilidade das políticas públicas municipais de saneamento									
Planos de Saneamento municipais elaborados (água potável e esgotos)	Planos	6,00	4,00		14,00	2.545.000,00	143.652,00		4.000.000,00
Servidores municipais capacitados para elaboração de projetos de financiamento	Pessoas	15,00			60,00	3.200.000,00			16.000.000,00
Custos Administrativos da UEPSAM									
Compras e consultorias para a UEPSAM	N/A					371.000,00	37.598,00		1.500.000,00
Apoio ao Gerenciamento e Supervisão	N/A					7.400.000,00	2.568.371,00		53.501.000,00
Serviços de comunicação social	N/A					1.800.000,00			2.000.000,00
Auditoria e Avaliação	N/A					560.000,00			1.800.000,00
TOTAL						37.546.000,00	2.750.851,00		639.550.000,00
