
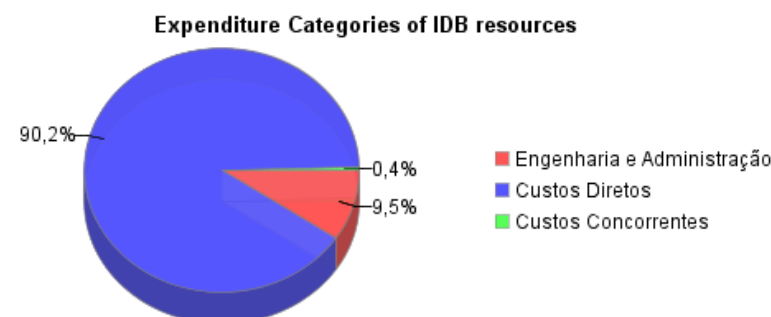
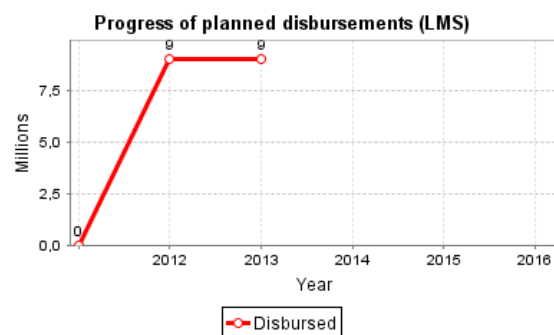



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Secretaria del Estado de Rio de Janeiro para el Medio Ambiente				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2646/OC-BR	Current Approved Amount:	451.980.000,00	Original IDB:	451.980.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	9.000.000,00	Current IDB:	451.980.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	1,99	Pari-passu:	71,00
Related Operation(s):	BR-T1202, RG-P1442	Balance:	442.980.000,00	Co-Financing/Country:	187.570.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	639.550.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 03-oct-2013 Validated by Country Representative: 04-oct-2013

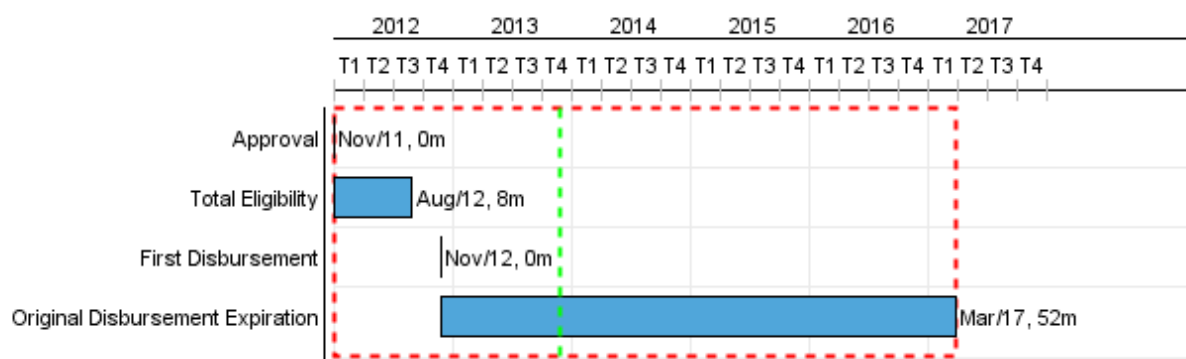

Accumulated Progress as of 2013

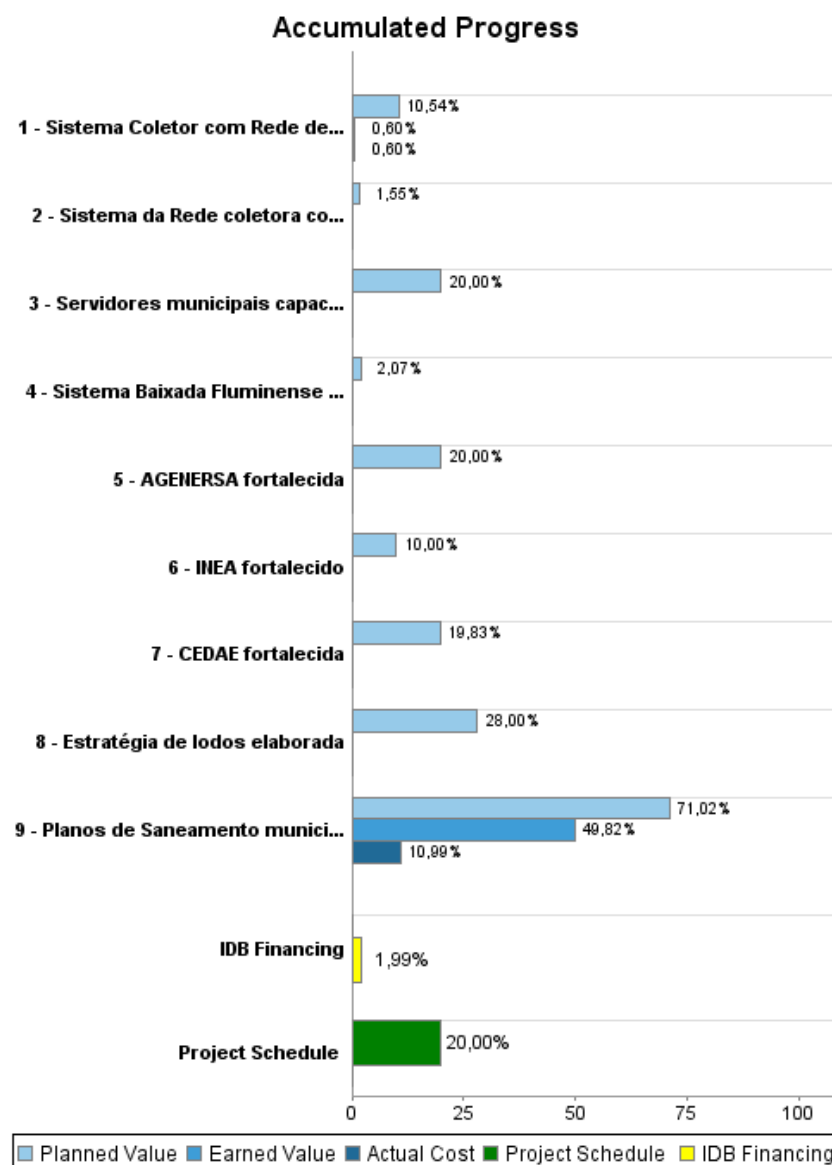

Outcomes

Outcome: Vazão coletada e tratada nas ETEs incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Esgoto tratado na ETE Alegria	Litros/seg	790,00	2011	P A					1.540,00
Esgoto tratado na ETE Alcântara	Litros/seg		2011	P A					515,00

Outcome: Famílias atendidas com tratamento de esgoto a nível secundário

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Famílias conectadas ao sistema de tratamento secundario de esgoto (ETE Alegria)	Domicilios	129.365,00	2011	P A					188.365,00
Famílias conectadas ao sistema de tratamento secundario de esgoto (ETE Alcântara)	Domicilios		2011	P A					45.495,00
Famílias conectadas ao sistema de tratamento secundário de esgoto (Sistema Baixada Fluminense)	Domicilios		2012	P A					26.140,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Domicilios	129.365,00	2011	P A					260.000,00

Outcome: Contratos ajustados na área do PSAM

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Contratos ajustados	Contratos		2011	P A		3,00	3,00	2,00	8,00

Outcome: Plano de monitoramento atualizado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Atualização do plano de monitoramento	Plano		2011	P A	1,00				1,00

Outcome: Plano de redução de perdas de água aprovado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Aprovação do plano de redução de perdas de água	Plano		2011	P A		1,00			1,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1282 - Environmental Sanitation Program for Municípios in the Guanabara Bay Area-
PSAM
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 17/09/2013

Outcome:	Estratégia de gestão de lodos aprovada								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Aprovação da estratégia de gestão de lodos	Estratégia		2011	P A		1,00			1,00

Outcome:	Planos de saneamento municipais aprovados								
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Planos aprovados	Planos		2011	P A	2,00	6,00	6,00		14,00

Outcome:	Projetos de captação de recursos elaborados								
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Projetos elaborados	Projetos		2011	P A		8,00	8,00		16,00

Outcome:	Municípios do PSAM incorporados ao Programa Nacional de Nota Fiscal								
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Municípios incorporados	Municípios		2011	P A		4,00	4,00		8,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Obras e equipes para coleta e tratamento de esgotos									
Sistema da Rede coletora construído (Cidade Nova e Tijuca)	Sistema				1,00	1.100.000,00			70.749.000,00
Sistema Coletor com Rede de Esgoto e estação de tratamento contruído (Sistema Alcântara)	Sistema				1,00	12.500.000,00	1.230,00		125.698.000,00
Sistema Baixada Fluminense contruído	Sistema				1,00	5.000.000,00			241.431.000,00
Outras obras a definir	N/A								106.871.000,00
Melhoria operacional e Desenvolvimento Institucional									
AGENERSA fortalecida	Agência				1,00	720.000,00			3.600.000,00
INEA fortalecido	Instituto				1,00	360.000,00			3.600.000,00
CEDAE fortalecida	Companhia				1,00	1.150.000,00			5.800.000,00
Estratégia de lodos elaborada	Estratégia				1,00	840.000,00			3.000.000,00
Sustenibilidade das políticas públicas municipais de saneamento									
Planos de Saneamento municipais elaborados (água potável e esgotos)	Planos	6,00	4,00		14,00	2.545.000,00	143.652,00		4.000.000,00
Servidores municipais capacitados para elaboração de projetos de financiamento	Pessoas	15,00			60,00	3.200.000,00			16.000.000,00
Custos Administrativos da UEPSAM									
Compras e consultorias para a UEPSAM	N/A					371.000,00	37.598,00		1.500.000,00
Apoio ao Gerenciamento e Supervisão	N/A					7.400.000,00	2.568.371,00		53.501.000,00
Serviços de comunicação social	N/A					1.800.000,00			2.000.000,00
Auditoria e Avaliação	N/A					560.000,00			1.800.000,00
TOTAL						37.546.000,00	2.750.851,00		639.550.000,00
