
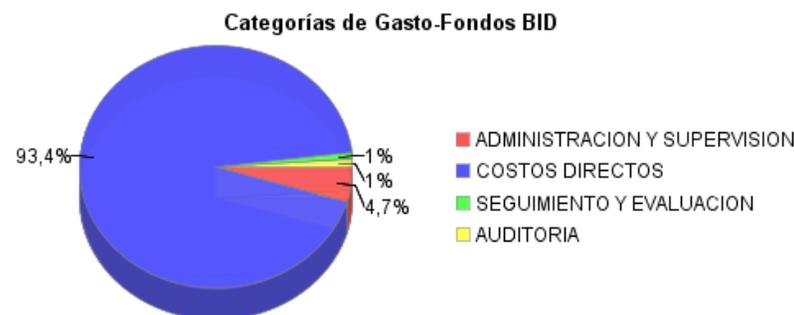
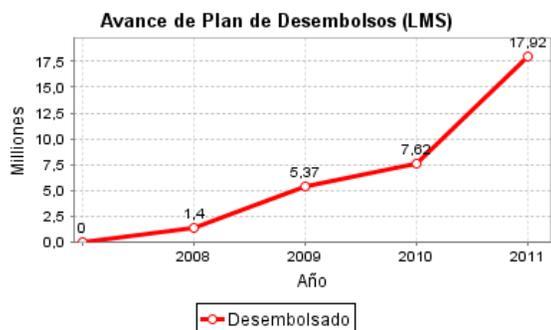



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):			
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-SOLID WASTE MANAGEMENT		
Número(s) de Préstamo:	1868/OC-AR	Monto Aprobado Actual:	60.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	17.923.445,57
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	29,87
Operación(es) Relacionada(s):	AR-T1018, AR-T1022	Saldo:	42.076.554,43
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	60.000.000,00
		Actual BID:	60.000.000,00
		Pari-passu:	80,00
		Co-financiamiento/País:	15.000.000,00
		Estimado Original:	75.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 29, 2011 Validado por Representante de País: Oct 21, 2011

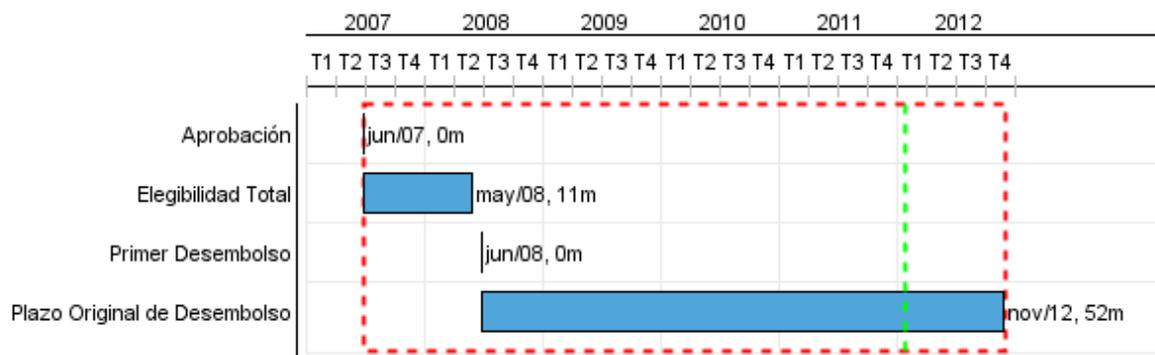

Progreso Acumulado al 2011

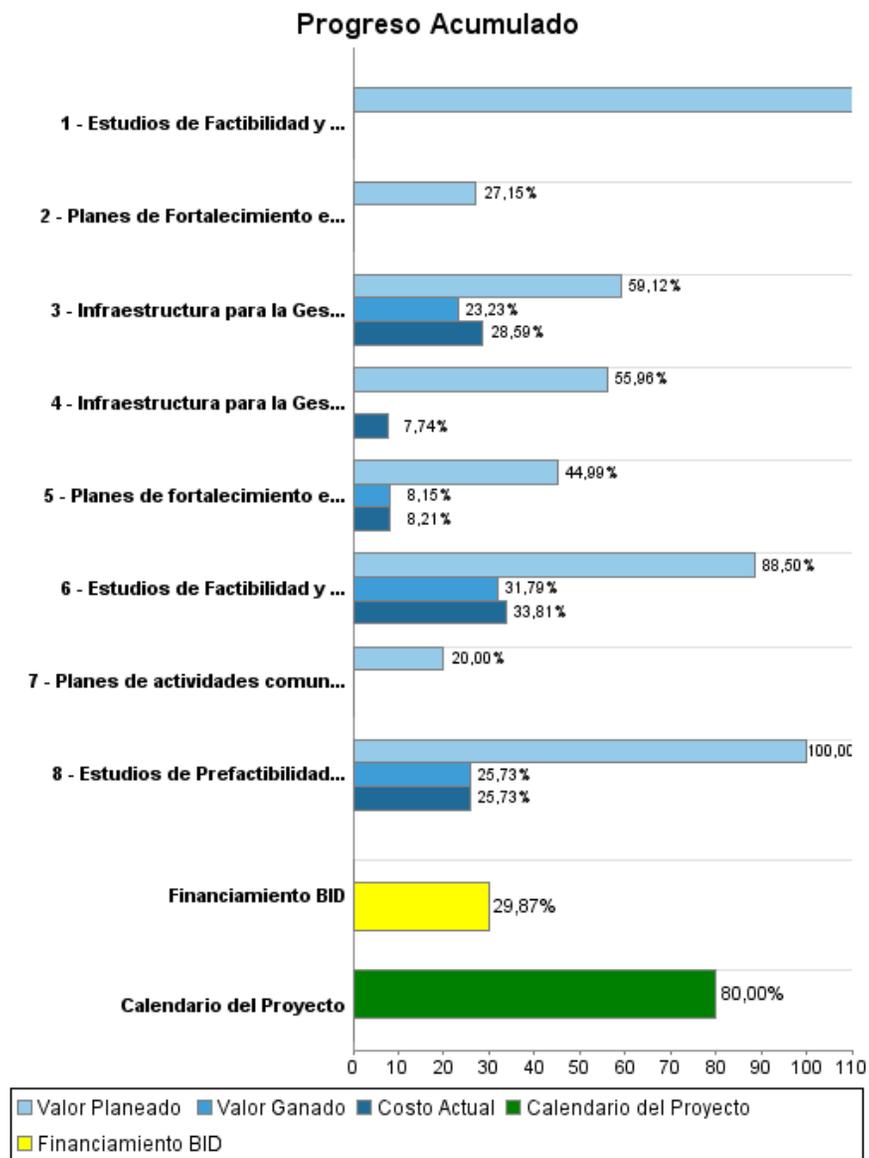

Resultados

Resultado:	Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios colindantes a Áreas Protegidas mejorados
Observaciones:	Los municipios intervenidos se encuentran aledaños a áreas protegidas nacionales o provinciales

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Rellenos Sanitarios financiados por el Programa operando regularmente	Rellenos Sanitarios		2008	P	3,00	5,00	12,00	12,00
				A	1,00			
Plantas de Separación y/o transferencia financiadas por el Programa operando regularmente	Plantas		2008	P	1,00	4,00	10,00	10,00
				A				
Municipios responsables operan y mantienen la infraestructura financiada por el programa siguiendo el respectivo plan de financiamiento de los costos.	Municipios		2008	P	4,00	7,00	20,00	17,00
				A	2,00			
Municipios con focos de disposición irregular	Municipios	17,00	2009	P	13,00	8,00	3,00	3,00
				A	15,00			
Áreas protegidas que disponen sus residuos en los nuevos Rellenos Sanitarios de los municipios colindantes	Areas protegidas		2008	P	1,00	3,00	10,00	10,00
				A	1,00			

Resultado:	Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en otros municipios turísticos mejorados
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Rellenos Sanitarios financiados por el Programa que son operados regularmente	Rellenos Sanitarios		2009	P		2,00	7,00	7,00
				A				
Plantas de Separación y/o transferencia financiadas por el Programa que son operadas regularmente	Plantas		2009	P		1,00	7,00	7,00
				A				
Municipios responsables que operan y mantienen la infraestructura financiada por el programa siguiendo el respectivo plan de financiamiento de costos.	Municipios		2009	P		2,00	7,00	7,00
				A				
Municipios con focos de disposición irregular	Municipios	14,00	2009	P		12,00		0,00
				A				

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Subprograma 1: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Áreas Protegidas y municipios colindantes									
Estudios de Prefactibilidad concluídos (Subprograma 1)	Estudios				2,00				29.892,00
Estudios de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos de GIRSU concluídos (Subprograma 1)	Estudios	6,00	1,00		12,00	900.000,00	58.259,00		1.970.108,00
Infraestructura para la Gestión Integral de RSU construída (Subprograma 1)	Obras de Infraestructura	10,00			28,00	12.000.000,00	4.506.991,00		39.800.000,00
Planes de fortalecimiento ejecutados (Subprograma 1)	Planes	4,00			17,00	1.400.000,00	48.976,00		3.800.000,00
Subprograma 2: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en otros municipios turísticos									
Estudios de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos de GIRSU concluídos (Subprograma 2)	Estudios	4,00			5,00	863.387,00			1.000.000,00
Infraestructura para la Gestión Integral de RSU construída (Subprograma 2)	Obras de infraestructura	3,00			7,00	7.903.702,00	874.993,56		20.200.000,00
Planes de Fortalecimiento ejecutados (Subprograma 2)	Planes	2,00			3,00	240.973,00			1.500.000,00
Planes de actividades comunitarias ejecutados (Subprograma 2)	Planes	2,00			7,00	50.000,00			250.000,00
TOTAL						23.358.062,00	5.489.219,56		68.550.000,00
