
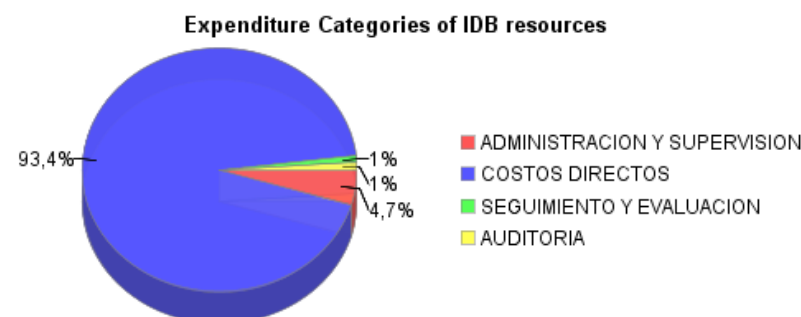
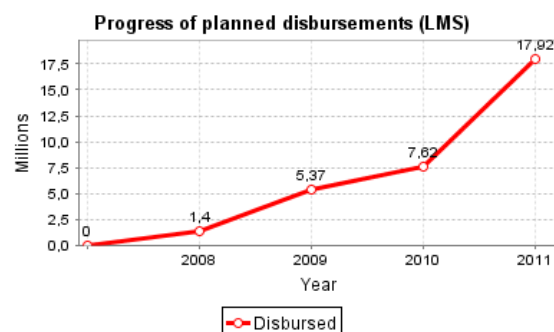



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):					
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-SOLID WASTE MANAGEMENT				
Loan Number(s):	1868/OC-AR	Current Approved Amount:	60.000.000,00	Original IDB:	60.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	17.923.445,57	Current IDB:	60.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	29,87	Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	AR-T1018, AR-T1022	Balance:	42.076.554,43	Co-Financing/Country:	15.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	75.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 29, 2011 Validated by Country Representative: Oct 21, 2011

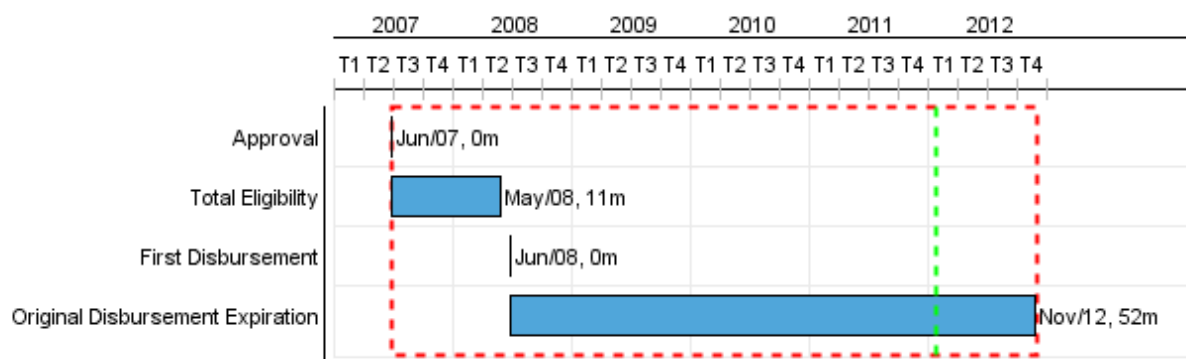

Accumulated Progress as of 2011

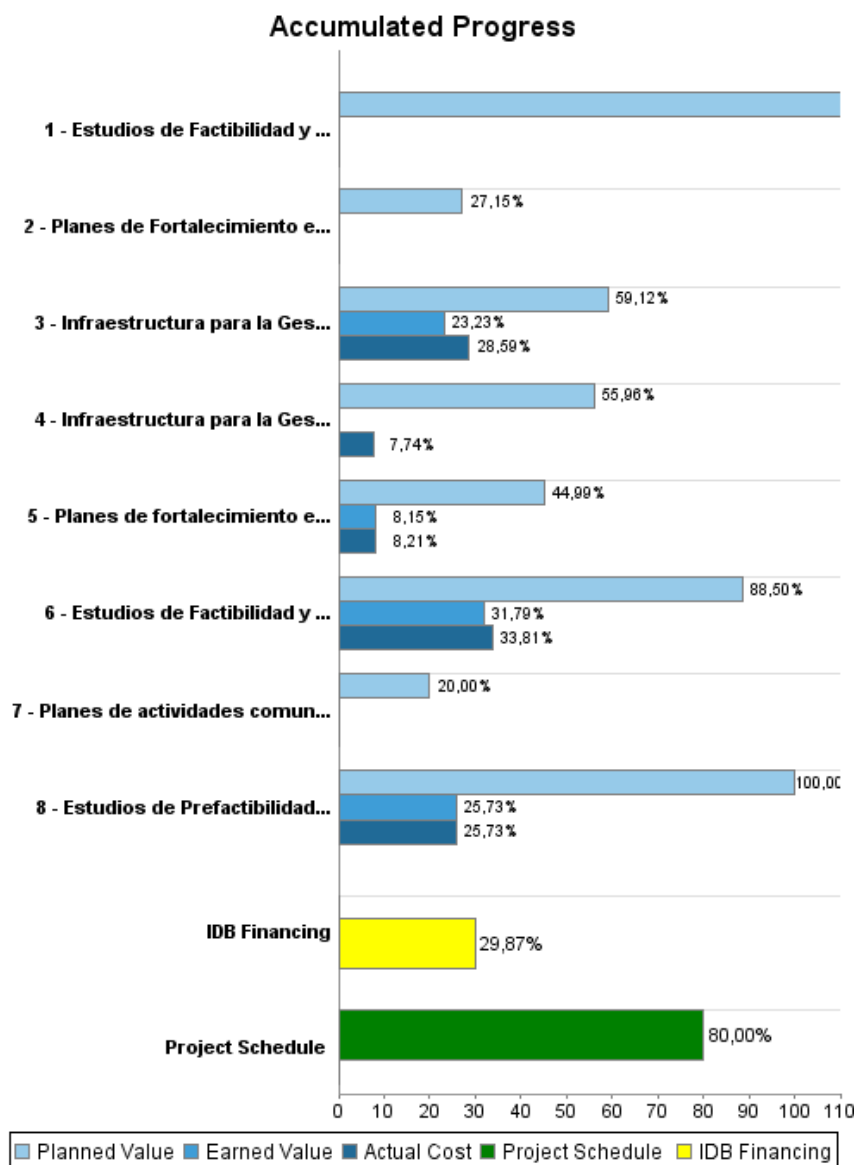

Outcomes

Outcome:	Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios colindantes a Áreas Protegidas mejorados
Comments:	Los municipios intervenidos se encuentran aledaños a áreas protegidas nacionales o provinciales

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	End of project
Rellenos Sanitarios financiados por el Programa operando regularmente	Rellenos Sanitarios		2008	P	3,00	5,00	12,00	12,00
				A	1,00			
Plantas de Separación y/o transferencia financiadas por el Programa operando regularmente	Plantas		2008	P	1,00	4,00	10,00	10,00
				A				
Municipios responsables operan y mantienen la infraestructura financiada por el programa siguiendo el respectivo plan de financiamiento de los costos.	Municipios		2008	P	4,00	7,00	20,00	17,00
				A	2,00			
Municipios con focos de disposición irregular	Municipios	17,00	2009	P	13,00	8,00	3,00	3,00
				A	15,00			
Áreas protegidas que disponen sus residuos en los nuevos Rellenos Sanitarios de los municipios colindantes	Areas protegidas		2008	P	1,00	3,00	10,00	10,00
				A	1,00			

Outcome:	Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en otros municipios turísticos mejorados
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	End of project
Rellenos Sanitarios financiados por el Programa que son operados regularmente	Rellenos Sanitarios		2009	P		2,00	7,00	7,00
				A				
Plantas de Separación y/o transferencia financiadas por el Programa que son operadas regularmente	Plantas		2009	P		1,00	7,00	7,00
				A				
Municipios responsables que operan y mantienen la infraestructura financiada por el programa siguiendo el respectivo plan de financiamiento de costos.	Municipios		2009	P		2,00	7,00	7,00
				A				
Municipios con focos de disposición irregular	Municipios	14,00	2009	P		12,00		0,00
				A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Subprograma 1: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Áreas Protegidas y municipios colindantes									
Estudios de Prefactibilidad concluídos (Subprograma 1)	Estudios				2,00				29.892,00
Estudios de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos de GIRSU concluídos (Subprograma 1)	Estudios	6,00	1,00		12,00	900.000,00	58.259,00		1.970.108,00
Infraestructura para la Gestión Integral de RSU construída (Subprograma 1)	Obras de Infraestructura	10,00			28,00	12.000.000,00	4.506.991,00		39.800.000,00
Planes de fortalecimiento ejecutados (Subprograma 1)	Planes	4,00			17,00	1.400.000,00	48.976,00		3.800.000,00
Subprograma 2: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en otros municipios turísticos									
Estudios de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos de GIRSU concluídos (Subprograma 2)	Estudios	4,00			5,00	863.387,00			1.000.000,00
Infraestructura para la Gestión Integral de RSU construída (Subprograma 2)	Obras de infraestructura	3,00			7,00	7.903.702,00	874.993,56		20.200.000,00
Planes de Fortalecimiento ejecutados (Subprograma 2)	Planes	2,00			3,00	240.973,00			1.500.000,00
Planes de actividades comunitarias ejecutados (Subprograma 2)	Planes	2,00			7,00	50.000,00			250.000,00
TOTAL						23.358.062,00	5.489.219,56		68.550.000,00
