

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:

Sector: WATER AND SANITATION

Número da Operação: 1868/OC-AR

Estágio: Approved

Tipo Operação: INV - Investimento

Operação Relacionada: AR-T1018, AR-T1022

Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual: 60.000.000,00

Desembolsado: 21.679.392,02

% Desembolsado: 36,13

Saldo: 38.320.607,98

Custo Total e Fonte

Original BID: 60.000.000,00

Corrente BID: 60.000.000,00

Pari-passu: 80,00

Cofinanciamento/País: 15.000.000,00

Original Estimado: 75.000.000,00

Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

Reformulação

B () Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


30-abr-2012

Validado pelo Representante do País:

08-may-2012

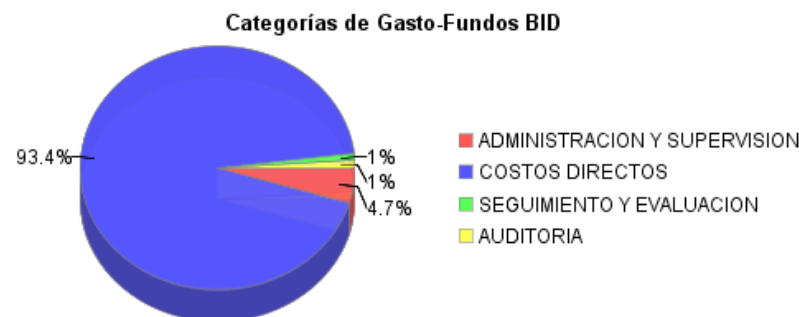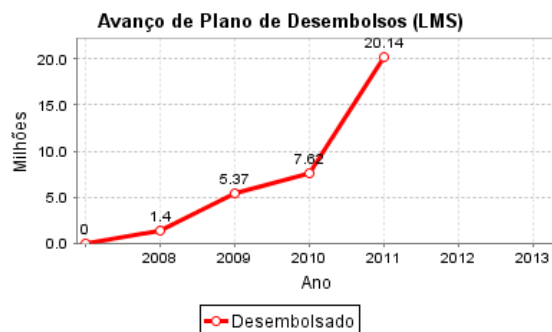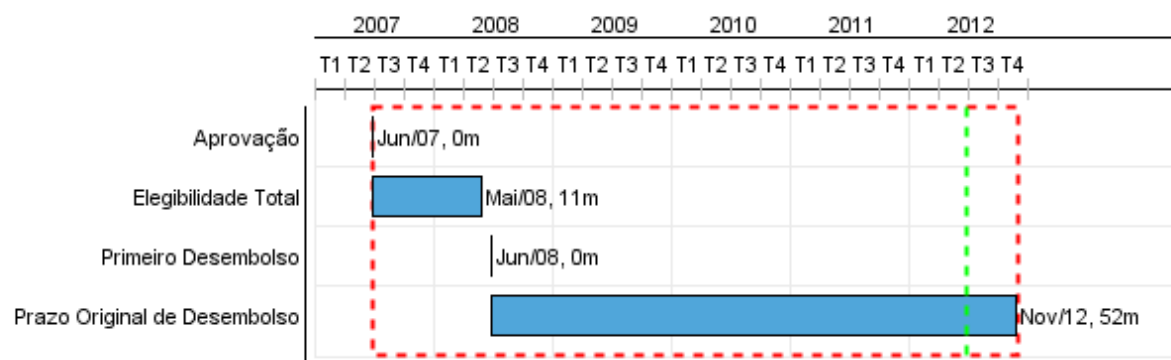

Progresso Acumulado até 2011

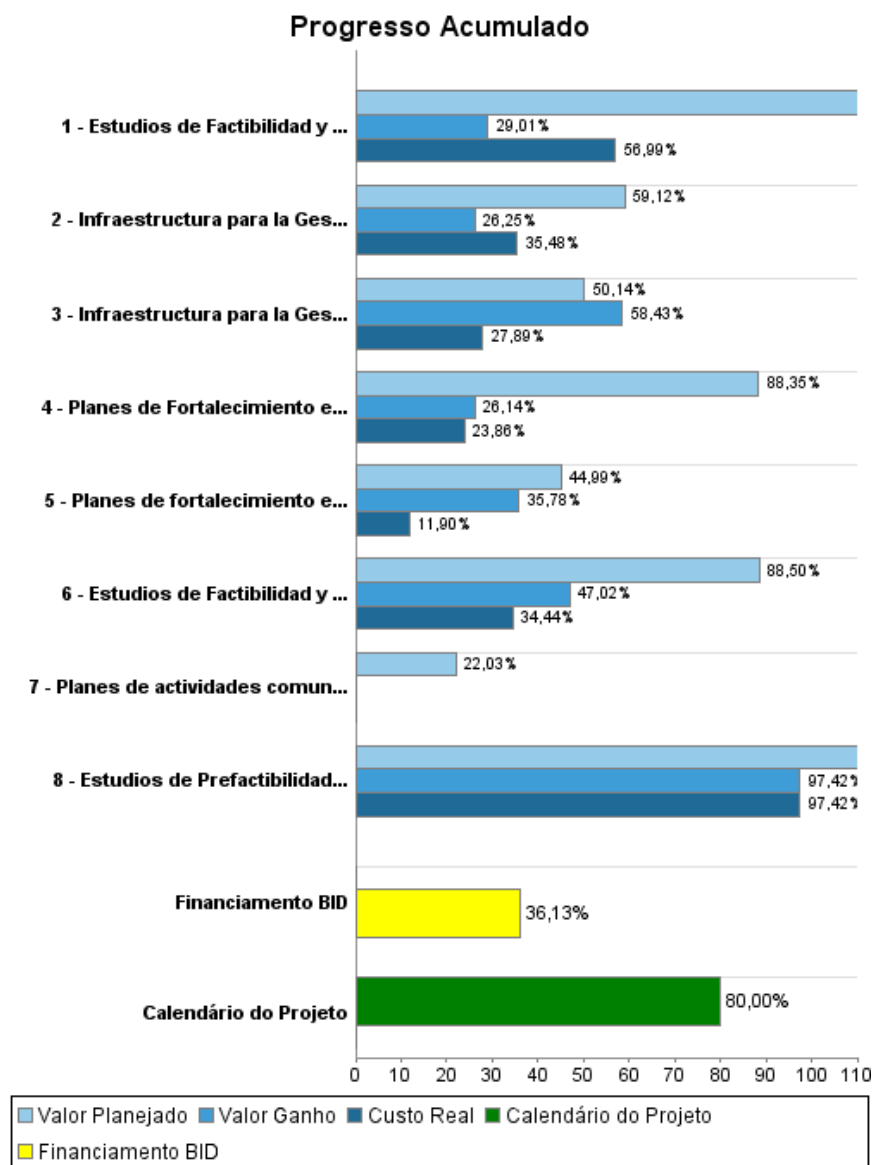

Resultados

Resultado:	Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios colindantes a Áreas Protegidas mejorados
Observações:	Los municipios intervenidos se encuentran aledaños a áreas protegidas nacionales o provinciales

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Rellenos Sanitarios financiados por el Programa operando regularmente	Rellenos Sanitarios		2009	P	3.00	5.00	5.00	8,00
				A	2.00	3.00		
Plantas de Separación y/o transferencia financiadas por el Programa operando regularmente	Plantas		2009	P	1.00	4.00	7.00	10,00
				A	1.00	1.00		
Municipios responsables operan y mantienen la infraestructura financiada por el programa siguiendo el respectivo plan de financiamiento de los costos.	Municipios		2009	P	4.00	7.00	9.00	12,00
				A	2.00	3.00		
Municipios con focos de disposición irregular.	Municipios	17.00	2009	P	13.00	8.00	9.00	5,00
				A	15.00	13.00		
Áreas protegidas que disponen sus residuos en los nuevos Rellenos Sanitarios de los municipios colindantes	Areas protegidas		2008	P	1.00	3.00	6.00	9,00
				A	1.00	3.00		

Resultado:	Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en otros municipios turísticos mejorados
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Rellenos Sanitarios financiados por el Programa que son operados regularmente	Rellenos Sanitarios		2009	P		2.00	2.00	5,00
				A		1.00		
Plantas de Separación y/o transferencia financiadas por el Programa que son operadas regularmente	Plantas		2009	P		1.00	1.00	7,00
				A		1.00		
Municipios responsables que operan y mantienen la infraestructura financiada por el programa siguiendo el respectivo plan de financiamiento de costos.	Municipios		2009	P		2.00	3.00	7,00
				A				
Municipios con focos de disposición irregular	Municipios	14.00	2009	P		12.00	8.00	5,00
				A		10.00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Subprograma 1: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Áreas Protegidas y municipios colindantes									
Estudios de Prefactibilidad concluídos (Subprograma 1)	Estudios		1,00		2,00		21.429,00		29.892,00
Estudios de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos de GIRSU concluídos (Subprograma 1)	Estudios	6,00	3,00		15,00	900.000,00	70.674,00		1.970.108,00
Infraestructura para la Gestión Integral de RSU construída (Subprograma 1)	Obras de Infraestructura	10,00	1,00		20,00	12.000.000,00	7.248.856,00		39.800.000,00
Planes de fortalecimiento ejecutados (Subprograma 1)	Planes	4,00	3,00		16,00	1.400.000,00	189.041,00		3.800.000,00
Subprograma 2: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en otros municipios turísticos									
Estudios de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos de GIRSU concluídos (Subprograma 2)	Estudios	4,00	1,00		5,00	863.387,00	424.000,00		744.000,00
Infraestructura para la Gestión Integral de RSU construída (Subprograma 2)	Obras de infraestructura	3,00	5,00		15,00	7.903.702,00	5.600.000,00		22.546.000,00
Planes de Fortalecimiento ejecutados (Subprograma 2)	Planes	2,00	1,00		15,00	240.973,00	110.000,00		461.000,00
Planes de actividades comunitarias ejecutados (Subprograma 2)	Planes	2,00			7,00	50.000,00			227.000,00
TOTAL						23.358.062,00	13.664.000,00		69.578.000,00
