
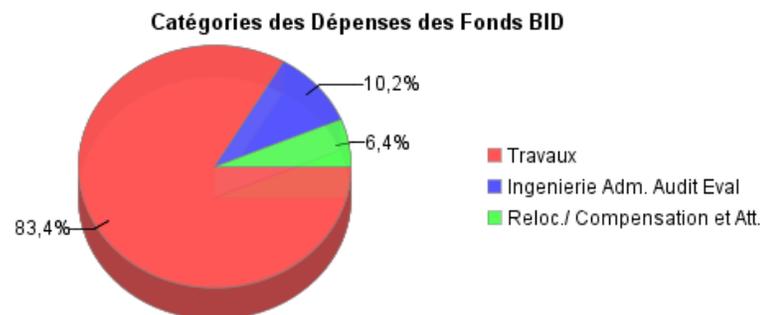
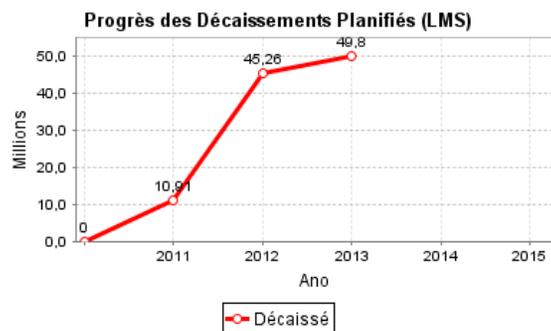



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
Secteur:	TRANSPORT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2552/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	55.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	49.801.228,93
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	90,55
Opération(s) Connexe(s):	HA-T1134, HA-T1135, RG-P1442, HA-L1081, HA-T1179, HA-T1180, HA-T1181, HA-T1182, HA-L1091	Solde:	5.198.771,07
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation		
		Initial BID:	55.000.000,00
		Courant BID:	55.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	55.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 21-oct-2013
		Validé par le Représentant: 22-oct-2013

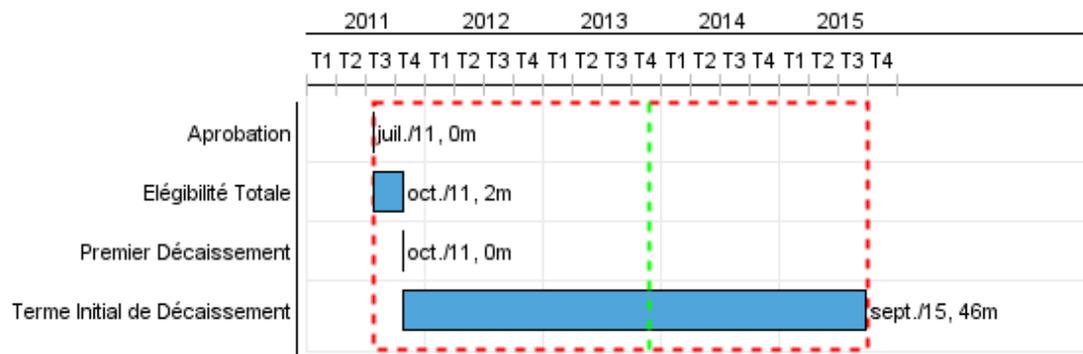

Progrès Cumulé à 2013

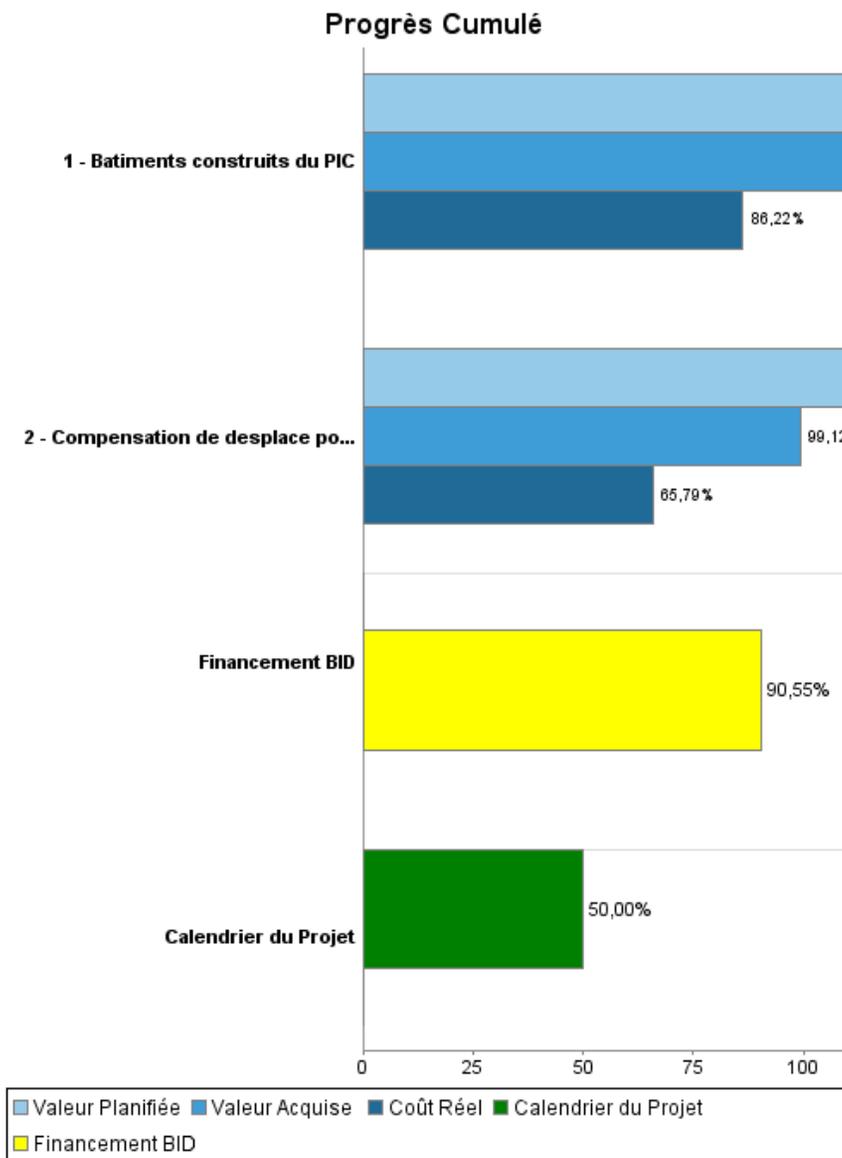

Résultats

Résultat: Private Investment and new job creation fostered

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Montant total des investissements étrangers faits pour le Parc industriel du Nord	Millions US\$	10,91	2011	P	40,00	40,00	40,00	120,00
				A	51,35			
Emplois locaux générés par l'opération du Parc industriel du Nord	Emplois		2011	P	3.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
				A	1.324,00			
Valeur annuelle des biens produits dans le Parc industriel du Nord	Millions US\$		2011	P				37,00
				A				
Salaires payés aux ouvriers haïtiens du PIC	Millions US\$		2011	P				25,00
				A				
Taux interne de rentabilité	Pourcentage	22,00	2011	P				12,00
				A				
Annual country's exports	US\$ Million	530,20	2013	P				583,17
				A				
Accessibility in the country	Km	180,00	2013	P				185,00
				A				

Résultat: Basic economic infrastructure rehabilitated

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Roads in good condition in the country	%	5,00	2013	P				5,15
				A				
Rural population with access to improved water services	%	30,00	2013	P				30,15
				A				
Rural population with access to sanitation facilities	%	10,00	2013	P				10,10
				A				

Résultat: Protection environnemenale de la mangrove de la Baie de Caracol réalisée

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Superficie de la mangrove protégée	Hectare	2.000,00	2011	P				2.000,00
				A				
Refuse in the mangrove	binary	1,00	2013	P				
				A				

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Financement de réhabilitation de l'infrastructure de bas									
Travaux									
Batiments construits du PIC	buildings	1,00	1,00		6,00	6.350.000,00			46.071.000,00
Relocalisation y Compensation et attenuation sociale et environnementale									
Compensation de desplace pour el Parc Industrielle	people	108,00			600,00	620.636,32			1.816.000,00
Administration - category 02									
Administration, audit, evaluation, consultancies	N/A					4.613.400,00			7.113.000,00
TOTAL						11.584.036,32			55.000.000,00
