
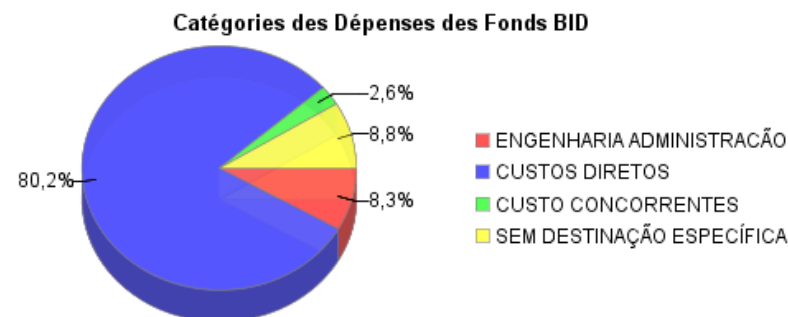
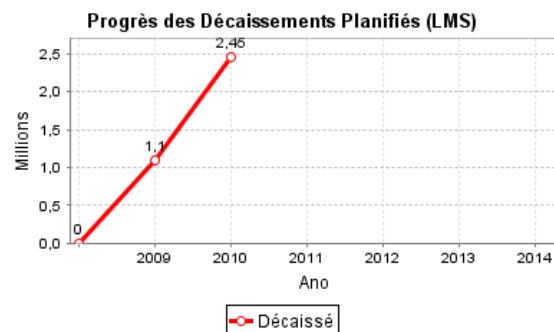


Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	PREFECTURA MUNICIPAL DE GOIANIA				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1980/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	56.700.000,00	Initial BID:	56.700.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.450.000,00	Courant BID:	56.700.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	4,32	Pari Passu:	98,96
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	54.250.000,00	Cofinancement/Pays:	37.800.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	94.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 24, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 19, 2011

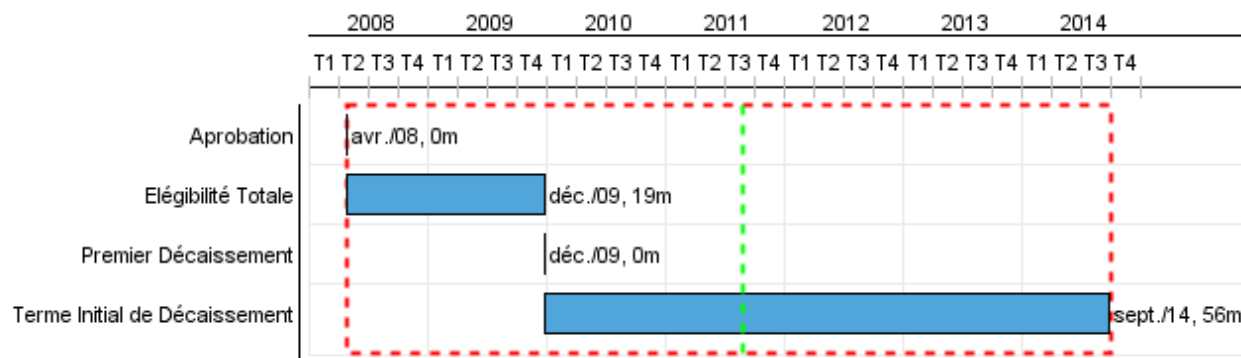

Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Problemas socio-ambientais que afetam a população nas áreas de intervenção do projeto reduzidos.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Valor médio do aluguel dos imóveis localizados a até 650 m das margens do córrego Macambira	(R\$)/mes	249,50	2004	P					286,93	286,93
				A						
Valor médio do aluguel dos imóveis localizados a até 650 m das margens do ribeirão Anicuns	(R\$)/mes	288,75	2004	P					322,06	322,06
				A						
Contaminação no córrego Macambira	DBO5 (mg/l)	15,00	2005	P					6,00	6,00
				A						
Contaminação no Ribeirão Anicuns	DBO5 (mg/l)	60,00	2005	P					24,00	24,00
				A						
Número de pessoas afetadas por inundação nas áreas de riscos das ladeiras ao Parque Linear no córrego Macambira equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	pessoas	50,00	2005	P						0,00
				A						
Número de pessoas afetadas por inundação nas áreas de risco lindeiras ao Parque Linear no Ribeirão Anicuns equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	pessoas	1.250,00	2005	P						0,00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Ordenamento Urbano Ambiental									
Parque Linear nas margens do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns implantado	parque				1,00				31.535.000,00
Famílias atualmente vivendo em áreas de risco , reassentadas	famílias				251,00				7.000.000,00
Parques Urbanos Implantados	ha				33,00				2.465.000,00
Consolidação da InfraEstrutura dos Bairros									
Obras para a consolidação da infraestrutura dos bairros construídas e em operação	km				24,00				3.000.000,00
Equipamentos urbanos para consolidação da infraestrutura dos bairros construídos e em operação	unidade				14,00				22,00
Sustentabilidade Social e Institucional									
Planos de Manejo para os Parques Ambientais Urbanos, implementados	plano				2,00				600.000,00
Plano Diretor de Resíduos Sólidos para os Parques elaborado	plano				1,00				385.000,00
Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns implantado	plano				1,00				175.000,00
Campanha de comunicação social do Programa implementada	plano				2,00				2.140.000,00
Sistema de melhoria do gerenciamento da gestão viária implantado	sistema				1,00				1.000.000,00
Outros									
Gastos (administração, financeiros, auditoria, etc..)	n/a					1.100.000,00	2.450.000,00		
TOTAL						1.100.000,00	2.450.000,00		48.300.022,00
