

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	PREFECTURA MUNICIPAL DE GOIANIA
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo:	1980/OC-BR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	56.700.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	2.450.000,00
% Desembolsado:	4,32
Saldo:	54.250.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	56.700.000,00
Actual BID:	56.700.000,00
Pari-passu:	98,96
Co-financiamiento/País:	37.800.000,00
Estimado Original:	94.500.000,00
Período de Amortización (meses):	234




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación

Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Mar 24, 2011
Validado por Representante de País: Apr 19, 2011

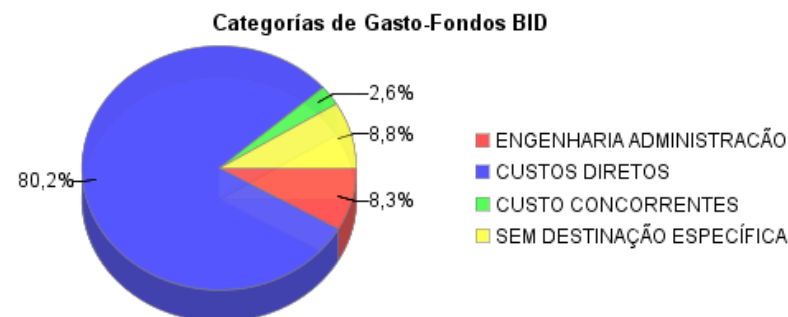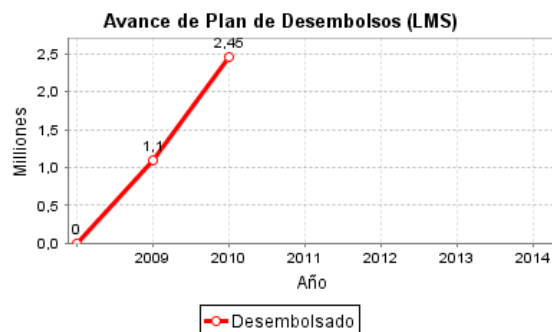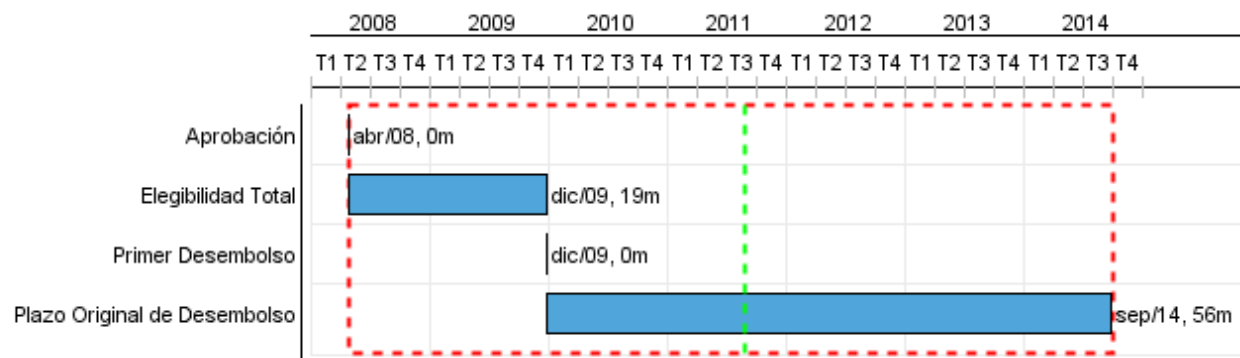

Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Problemas socio-ambientais que afetam a população nas áreas de intervenção do projeto reduzidos.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Valor médio do aluguel dos imóveis localizados a até 650 m das margens do córrego Macambira	(R\$)/mes	249,50	2004	P					286,93	286,93
				A						
Valor médio do aluguel dos imóveis localizados a até 650 m das margens do ribeirão Anicuns	(R\$)/mes	288,75	2004	P					322,06	322,06
				A						
Contaminação no córrego Macambira	DBO5 (mg/l)	15,00	2005	P					6,00	6,00
				A						
Contaminação no Ribeirão Anicuns	DBO5 (mg/l)	60,00	2005	P					24,00	24,00
				A						
Número de pessoas afetadas por inundação nas áreas de riscos das ladeiras ao Parque Linear no córrego Macambira equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	personas	50,00	2005	P						0,00
				A						
Número de pessoas afetadas por inundação nas áreas de risco lindeiras ao Parque Linear no Ribeirão Anicuns equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	personas	1.250,00	2005	P						0,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Ordenamiento Urbano Ambiental									
Parque Linear nas margens do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns implantado	parque				1,00				31.535.000,00
Famílias atualmente vivendo em áreas de risco, reassentadas	famílias				251,00				7.000.000,00
Parques Urbanos Implantados	ha				33,00				2.465.000,00
Consolidação da InfraEstrutura dos Bairros									
Obras para a consolidação da infraestrutura dos bairros construídas e em operação	km				24,00				3.000.000,00
Equipamentos urbanos para consolidação da infraestrutura dos bairros construídos e em operação	unidade				14,00				22,00
Sustentabilidade Social e Institucional									
Planos de Manejo para os Parques Ambientais Urbanos, implementados	plano				2,00				600.000,00
Plano Diretor de Resíduos Sólidos para os Parques elaborado	plano				1,00				385.000,00
Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns implantado	plano				1,00				175.000,00
Campanha de comunicação social do Programa implementada	plano				2,00				2.140.000,00
Sistema de melhoria do gerenciamento da gestão viária implantado	sistema				1,00				1.000.000,00
Outros									
Gastos (administração, financeiros, auditoria, etc..)	n/a					1.100.000,00	2.450.000,00		
TOTAL						1.100.000,00	2.450.000,00		48.300.022,00
