

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1088	Chief of Operations Validation Date	04/07/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/25/17
Last Update	04/06/17	Country Representative Validation Date	04/25/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for integration and urban coexistence	Loan Number	2895/BL-HO
Executing Agency	FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	BARTELS,SANDRA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1088	17,200,000	17,200,000	0	0	17,200,000	17,200,000	16,300,000	94.77%	900,000
Aggregated	17,200,000	17,200,000	0	0	17,200,000	17,200,000	16,300,000	94.77%	900,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

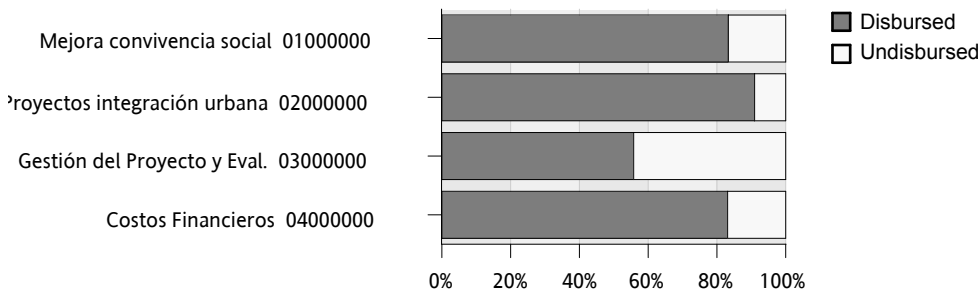

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condiciones de seguridad de los barrios

Observation: Mejora la seguridad de los barrios atendidos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Percepción de seguridad de los habitantes de las comunidades atendidas	Porcentaje	0.0	2013	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe de firma independiente para la elaboración de la línea de base y para la evaluación final del programa (incluye determinación de meta FDP)						
Observations: La unidad de medida se refiere al número de habitantes que se sienten más seguros en el barrio (antes y después del programa) respecto al total de habitantes. Los datos discriminaran por género y por rango de edad						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.2	Hechos delictivos registrados por barrio intervenido	Número	86.5	2013	P	61.00
					P(a)	61.00
					A	
Details						
Means of verification: Datos recolectados por el observatorio local de violencia implementado con apoyo del programa						
Observations: Preliminarmente, se asume como línea de base la tasa de homicidios de Tegucigalpa (2011) y una meta FDP de reducción del 30%. Incluye crímenes contra el patrimonio, contra personas y actos de violencia social y doméstica. Se implementará un observatorio I						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Valor de los inmuebles ubicados en los barrios atendidos

Observation: Aumento del valor de los inmuebles ubicados en los barrios atendidos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
2.1	Valor de los inmuebles residenciales	Lempiras por m2	0.0	2013	P	26,650.00
					P(a)	26,650.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta específica en cada comunidad, a ser realizada por una firma independiente (línea de base y evaluación final del programa)						
Observations: Se busca medir variaciones en los precios de las viviendas como consecuencia de mejoras en las características del barrio: vialidad, servicio de agua y saneamiento, transporte, seguridad, entre otros. La matriz de resultados establece una meta de aumento						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Fortalecer el capital social de las comunidades en los barrios atendidos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Número de organizaciones comunitarias	Organizaciones	0.0	2013	P		2.00
					P(a)		2.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta elaborada por firma independiente (para la línea de base y para la evaluación final del programa), lo que permitirá determinar la ambas metas

Observations: Se refiere a organizaciones que participan en las decisiones y actividades del programa. Se espera la participación del Patronato, la Junta de Agua, Sociedad de Padres y Representantes de la escuela y Comité de Emergencia Local (CODEL). Esto varía el bar

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Participación de la comunidad en actividades sociales y comunitarias del programa	Porcentaje	0.0	2013	P	30.00	30.00
					P(a)	30.00	30.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta elaborada por firma independiente para la evaluación final del programa.

Observations: La unidad de medida se refiere al porcentaje de la población que participan en las actividades sociales y comunitarias respecto al total de habitantes de los barrios. Los datos sobre participación comunitaria serán discriminan por género y por rango de

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Aumentar las capacidades laborales de los habitantes de los barrios atendidos, especialmente de los grupos en riesgos

Observation: cobertura oportunidades de capacitacion en los grupos de riesgo de los barrios atendidos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
2.1	Inserción laboral de jóvenes	Porcentaje	0.0	2013	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta elaborada por firma independiente para la evaluación final del programa

Observations: La unidad de medida se refiere al número de jóvenes capacitados por el programa que están trabajando y han mantenido el empleo por más de tres meses respecto al total de jóvenes capacitados por el programa. Los datos serán discriminan por género y por r

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: Mejorar el acceso a los servicios urbanos básicos de los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán

Observation: Acceso a servicios urbanos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
3.1	Cobertura de agua potable formal y alcantarillado sanitario	Households (#)	0.0	2013	P	2,975.00	2,975.00
					P(a)	2,975.00	2,975.00
					A		

Details

Means of verification: Informes final de la consultoría de supervisión de obras

Observations: La meta FDP equivale al 95% del total de viviendas ubicadas en los barrios seleccionados (3.132 viviendas). La línea de base deberá determinar el número exacto de hogares.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
	Afro-descendant				P		
					P(a)		
					A		
	Indigenous				P		
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
3.2	Cobertura de drenaje pluvial	Porcentaje	0.0	2013	P	95.00	95.00
					P(a)	95.00	95.00
					A		

Details

Means of verification: Informes final de la consultoría de supervisión de obras

Observations: El número de viviendas en los barrios seleccionados se ha estimado en 3.132

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
3.3	Cobertura de accesos viales y peatonales	Porcentaje	0.0	2013	P	95.00	95.00
					P(a)	95.00	95.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details							
Means of verification: Informes final de la consultoría de supervisión de obras							
Observations: El número de viviendas en los barrios seleccionados se ha estimado en 3.132							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
3.4	Cobertura de alumbrado público	Porcentaje	0.0	2013	P	95.00	95.00
					P(a)	95.00	95.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes final de la consultoría de supervisión de obras							
Observations: El número de viviendas en los barrios seleccionados se ha estimado en 3.132							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora en la convivencia social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Talleres de capacitación laboral en colonias de la Zona 1 que incluye los barrios: San Juan del Norte (1 y 2), Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Talleres completados	P	4	18	2,400	11,200
			P(a)	11	40	5,000	8,124.32
			A	11	37	1,140	6,624.32
1.2	Talleres sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de la Zona 1 que incluye los barrios: San Juan del Norte (1 y 2), Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Talleres completados	P	4	18	2,400	11,200
			P(a)	11	39	5,000	23,349.79
			A	11	36	2,151	21,849.79
1.3	Convivencias de integración para líderes comunitarios de las colonias de Zona 1	Retiros realizados	P		1		2,100
			P(a)	1	4	11,000	20,373.45
			A	2	3	9,530.68	11,630.68
1.4	Convivencias de integración y convivencia para jóvenes de las colonias de Zona 1	Retiros completados	P	1	3	11,000	33,000
			P(a)	1	9	13,000	38,064.43
			A	5	9	10,625	35,689.43
1.5	Eventos recreativos para niños de las colonias de la Zona 1	Eventos completados	P		4		44,000
			P(a)	1	3	9,000	17,806.93
			A	1	3	3,295	12,101.93
1.6	Curso de capacitación laboral en colonias de la Zona 1	Cursos completados	P		1		180,000
			P(a)	0	1	0	232,640.38
			A	0	1	0	232,640.38
1.7	Talleres capacitación laboral en colonias de la Zona 2 que incluye los barrios: David Betancourt, Arcieri (1 y 2), Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición	Talleres completados	P	11	29	4,400	11,600
			P(a)	11	48	6,000	9,830.32
			A	11	45	2,846	8,330.32
1.8	Talleres sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de Zona 2	Talleres completados	P	11	29	4,400	11,600
			P(a)	11	46	9,000	23,349.8
			A	11	43	2,151	21,849.8
1.9	Convivencias de integración para líderes comunitarios de las colonias de Zona 2	Retiros completados	P		1		2,100
			P(a)	1	4	11,000	33,561.57
			A	2	3	9,339	21,048.6
1.10	Convivencias de integración y convivencia para jóvenes de las colonias de Zona 2	Retiros completados	P	1	3	11,000	33,000
			P(a)	1	9	18,000	38,612.83
			A	5	9	10,625	31,237.83
1.11	Eventos recreativos para niños de la zona 2	Eventos realizados	P		4	11,000	44,000
			P(a)	1	3	9,000	17,806.93
			A	1	3	3,295	12,101.93
1.12	Curso de capacitación laboral en colonias de la Zona 2	Cursos completados	P		2		210,000
			P(a)	0	2		0
			A	0	2		143,570.51
1.13	Consultoría de Sistematización de las intervenciones sociales	Propuesta elaborada	P		1		35,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.14	30 Microemprendimientos fortalecidos participando en sistemas de mercado fortalecidas participando en sistemas de mercado	Emprendimientos	P		0		0
			P(a)	0	30	50,000	50,006
			A	0	0	8,713.13	8,713.13
1.15	Jóvenes y niños participando de programa deportivo	Secciones deportivas	P		0		0
			P(a)	24	48	376,350.52	194,943

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.15	Jóvenes y niños participando de programa deportivo	Secciones deportivas	A	24	24	120,902	120,902

Component Nbr. 2 Proyectos de integración urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Proyectos de Integración Urbana en Zona 1, Lote 1 que incluye barrios: San Juan del Norte 1 y 2, Buenas Nuevas	Barrio urbanizado	P	2	2	202,000	1,700,000
			P(a)	2	2	623,419	1,757,217.66
			A	2	2	480,458	1,753,917.66
2.2	Proyectos de Integración Urbana en Zona 1, Lote 2 que incluye los barrios: Brisas de la Laguna, Las Pavas y Alemania (1 y 2)	Barrio urbanizado	P	3	3	138,000	1,600,000
			P(a)	3	3	413,889.06	1,603,270.57
			A	3	3	387,965.07	1,599,770.57
2.3	Proyectos de integración urbana en la Zona 2 que incluye los barrios: David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición	Barrio urbanizado	P	4	4	2,123,000	8,800,000
			P(a)	4	4	2,985,318.51	9,111,997.11
			A	4	4	2,798,109.91	9,092,689.93
2.4	Culminación del Proyecto de integración urbana en la Colonia Villacristina	Barrio urbanizado	P		1		330,000
			P(a)	1	1	187,000	187,000
			A	1	1	120,118.5	120,118.5
2.5	Proyectos Zona 1: (1) Construcción Centro de Usos Múltiples Col. Alemania; (2) Reparación Cancha Usos Múltiples Col. Buenas Nuevas; (3) Canalización Quebrada Col. Pavas; (4) Reparación Calle Principal Col. Brasilia construidos	Obras	P		0		0
			P(a)	0	4	178,554.19	256,400.1
			A	0	0	40,762.35	40,762.35
2.6	Proyectos Mejoras Sistemas Eléctricos Colonias San Juan del Norte, Brisas de la Laguna (Zona 1); Arcieri I y II, Montes de Bendición, David Betancourth y Ramón Amaya Amador (Zona 2) construidos	Obras	P		0		0
			P(a)	0	6	177,785.67	660,379.31
			A	0	0	0	0
2.7	Proyectos Zona 2: (1) Construcción Centro Comunal Colonia Arcieri #1 y #2; (2) Construcción Centro Comunal David Betancourth; (3) Construcción Centro Comunal Montes de Bendición; (4) Mejoras a Campo de Fútbol, Colonia Ramón Amaya	Obras	P		0		0
			P(a)	0	4	126,966.12	468,784.81
			A	0	0	57,962.5	57,962.5

Component Nbr. 3 Gestión del Programa y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
3.1	Evaluación de medio termino	informe terminado y aprobado	P		0		0
			P(a)	1	1	50,000	50,000
			A	1	1	48,729.93	48,729.93
3.2	Planes de sostenibilidad	planes completados	P		0		0
			P(a)	2	2	20,000	20,000
			A	0	0	0	0
3.3	Evaluación final	informe	P		0		0
			P(a)	0	1		25,000
			A	0	0		0

Other Cost

	Consultoría para Elaboración de Planes de Sostenibilidad	P				
		P(a)			20,000	20,000
		A			0	0
	Consultorías para diseño de estrategia de comunicación, evaluación intermedia y final del programa, preparación de línea de base y evaluación de impacto del programa	P			60,000	270,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Estudios y Diseños Consultoría para Nuevos Planes de Desarrollo Integral de Barrios PIMP	P				
		P(a)			150,000	45,000
		A			0	0
	Gastos operativos, monitoreo (ETEC), equipamiento, auditoría externa e imprevistos	P			540,000	1,395,000
		P(a)			283,059.7	1,141,616.49
		A			262,911.61	984,146.02
	Imprevistos - Componente 1	P				357,200
		P(a)				0
		A				0
	Imprevistos - Componente 2	P				1,170,000
		P(a)				0
		A				0
	Intereses	P			163,000	500,000
		P(a)			163,000	500,000
		A			415,530	415,530
	Unidad de Enlace Técnico Comunitario (en campo)	P			46,600	449,000
		P(a)			203,520	644,864.2
		A			198,780.14	543,104.2

Total Cost

	Total Cost	P			3,319,200	17,200,000
		P(a)			6,104,862.77	17,200,000
		A			4,995,940.82	15,345,022.31

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
