

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1106	Chief of Operations Validation Date	03/30/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/21/17
Last Update	03/30/17	Country Representative Validation Date	05/10/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	NATIONAL IRRIGATION PROGRAM WITH A WATERSHED APPROACH III (PRONAREC III)	Loan Number	3699/BL-BO, 3699/BL-BO-1, 3699/BL-BO-2
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Sector/Subsector	PA-ADA - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-CLIMATE CHANGE ADAPTATION POLICY
Team Leader	MURGUIA BAYSSE,JUAN MANUEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1106	158,400,000	158,400,000	37,600,000	0	196,000,000	158,400,000	3,000,000	1.89%	155,400,000
Aggregated	158,400,000	158,400,000	37,600,000	0	196,000,000	158,400,000	3,000,000	1.89%	155,400,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

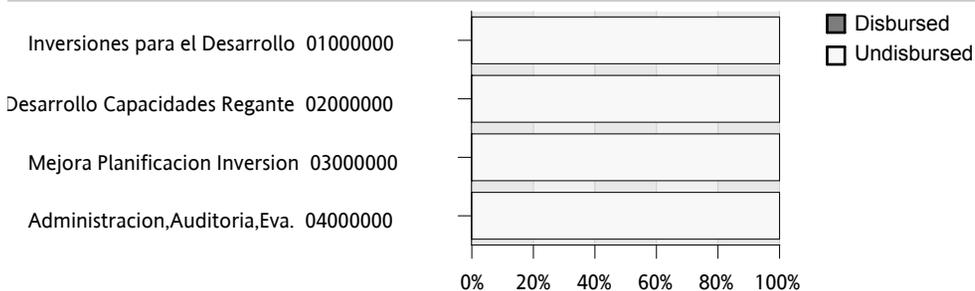

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Impacto esperado: Aumentar el ingreso de los hogares rurales beneficiados.

Observation: a) Las metas estimadas salen de las encuestas de evaluación de impacto del programa; b) Las metas se medierán utilizando la diferencia entre grupo de beneficiarios y control; c) Línea de base del ingreso bruto anuales: US\$ 3.370 y d) Línea de base de ingreso neto agrícola/Ha:US\$2.100.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento porcentual en los ingresos anuales (%)	Porcentaje	0.0	2017	P		30.00
					P(a)	30.00	30.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1. Mejorar la productividad de los hogares beneficiarios a través de un aumento en la superficie bajo riego.

Observation: Medio de Verificación: 1) las metas se midiran utilizando la diferencia entre grupo beneficiarios y control a través de las encuestas de evaluación de impacto; 2) Evaluación final del programa. Observaciones a) Las metas estimadas salen de las encuestas de evaluación de impacto del programa b) Línea de base: i) valor de la producción en /Ha. US\$3.000; ii) valor de ventas US\$1.460

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Indicador 1.1. Incremento porcentual en el valor de la producción agropecuaria (%)	Porcentaje	0.0	2017	P		35.00
					P(a)	35.00	35.00
					A		

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Indicador 1.2. Incremento porcentual en el valor de ventas agrícolas (%)	Porcentaje	0.0	2017	P		55.00
					P(a)	55.00	55.00
					A		

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.2	Indicador 1.3. Incremento en el número de hectáreas bajo riego nuevas o mejoradas (#)	Héctareas	0.0	2017	P		25,000.00
					P(a)	25,000.00	25,000.00
					A		

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Incremento en el número de Ha bajo riego técnico						
					P		12,500.00
					P(a)	12,500.00	12,500.00
					A		

Outcome Nbr. 1: Resultado 2. Mejorar la eficiencia en el uso de agua de los sistemas de riego y las capacidades para la gestión comunitaria

Observation: Medio de verificación: 1) Evaluación final del programa. Observaciones: a) Eficiencia se refiere al volumen de agua utilizado en finca sobre el volumen total de agua captado por sistema; b) La línea de base se validará durante la ejecución de la operación y c) Los valores presentados como línea de base y meta corresponden al análisis de proyectos muestra..

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Indicador 2.1. Eficiencia en el uso del agua promedio en los sistemas de riego tecnificado (%)	Porcentaje	25.0	2017	P		75.00
					P(a)	75.00	75.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021	
1.1	Indicador 2.2. Eficiencia en el uso del agua promedio en los sistemas de riego tradicional (%)	Porcentaje	20.0	2017	P		45.00
					P(a)	45.00	45.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021	
1.2	Indicador 2.3. Beneficiarios que cumple con aportes requeridos en los estatutos de la organización de regantes (%)	Porcentaje	0.0	2017	P		70.00
					P(a)	70.00	70.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Resultado 3. Mejorar la gestión del recurso mediante la aplicación de planes municipales de manejo hídrico.

Observation: Medio de verificación: 1) Evaluación final del programa. Observaciones: Los beneficiarios son miembros de los sistemas de riego del programa que han cumplido con las inversiones intraprediales requeridas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021	
2.0	Indicador 3.1. Proyectos de riego priorizados para financiamiento que surgen de los planes de aprovechamiento hídrico local (#).	Proyectos	0.0	2017	P		35.00
					P(a)	35.00	35.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Indicador 3.2. Número de beneficiarios de una	Beneficiarios	0.0	2017	P	21,100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	mejor gestión y uso sostenible del capital natural.	Beneficiarios	0.0	2017	P(a)	21,100.00	21,100.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Inversiones para el desarrollo de riego comunitario con enfoque de cuenca.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2021	EOP 2021
1.1	Producto 1. Diseño de proyectos de riego con enfoque del programa ajustados.	Diseño	P	120	1,900,000
			P(a)	120	1,900,000
			A	0	0
1.2	Producto 2. Diseños de proyectos de riego mayores con enfoque del programa elaborados.	Diseño	P	55	3,500,000
			P(a)	55	3,500,000
			A	0	0
1.3	Producto 3. Sistema de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (hasta US\$300.000).	Sistema	P	120	27,300,000
			P(a)	120	27,300,000
			A	0	0
1.4	Producto 4. Sistemas de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (mayores a US\$300.000).	Sistema	P	70	126,850,000
			P(a)	70	126,850,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Desarrollo de capacidades de los regantes para la sostenibilidad de los sistemas de riego.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2021	EOP 2021
2.1	Producto 5. Técnicos/as capacitados/as en gestión sostenible de los sistemas de riego.	Técnico	P	150	1,140,000
			P(a)	150	1,140,000
			A	0	0
2.2	Producto 6. Productores agropecuarios que reciben servicios de acompañamiento del programa.	Productores	P	21,100	7,100,000
			P(a)	21,100	7,100,000
			A	0	0
2.3	Producto 7. Productores agropecuarios que reciben servicio de asistencia técnica del programa.	Productores	P	21,100	13,840,000
			P(a)	21,100	13,840,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Mejora de la planificación de la inversión y de la gestión de recursos hídricos para riego.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
			EOP 2021	EOP 2021
3.1 Producto 8. Planes de aprovechamiento hídrico local diseñados y socializados.	Plan	P	50	3,350,000
		P(a)	50	3,350,000
		A	0	0
3.2 Producto 9. Guía para la supervisión en pre-inversión e inversión de los proyectos de riego aprobada.	Guía	P	1	50,000
		P(a)	1	50,000
		A	0	0
3.3 Producto 10. Técnicos/as capacitados/as en formulación de proyectos con enfoque del programa.	Técnico	P	200	220,000
		P(a)	200	220,000
		A	0	0
3.4 Producto 11. Estrategias de articulación intersectorial riego-cuenca implementadas.	Estrategias	P	2	340,000
		P(a)	2	340,000
		A	0	0
3.5 Producto 12. Evaluación del desempeño del subsector riego realizadas.	Evaluación	P	4	160,000
		P(a)	4	160,000
		A	0	0
3.6 Producto 13. Guía para la implementación de evaluaciones de impacto del subsector riego diseñada.	Guía	P	1	300,000
		P(a)	1	300,000
		A	0	0
3.7 Producto 14. Gobiernos departamentales gestionan la información del SIRH.	Gobiernos Departamentales	P	2	400,000
		P(a)	2	400,000
		A	0	0

Other Cost

Administración	P	9,000,000
	P(a)	9,000,000
	A	0
Auditoria	P	200,000
	P(a)	200,000
	A	0
Evaluaciones	P	350,000
	P(a)	350,000
	A	0

Total Cost

Total Cost	P	196,000,000
	P(a)	196,000,000
	A	0

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Indicador 3.2. Número de beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural.	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Componente 3. Mejora de la planificación de la inversión y de la gestión de recursos hídricos para riego.	Create Component	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Impact	Incremento porcentual en los ingresos anuales (%)	Modify Impact Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 8. Planes de aprovechamiento hídrico local diseñados y socializados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 10. Técnicos/as capacitados/as en formulación de proyectos con enfoque del programa.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 5. Técnicos/as capacitados/as en gestión sostenible de los sistemas de riego.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 12. Evaluación del desempeño del subsector riego realizadas.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 7. Productores agropecuarios que reciben servicio de asistencia técnica del programa.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 13. Guía para la implementación de evaluaciones de impacto del subsector riego diseñada.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 1. Diseño de proyectos de riego con enfoque del programa ejecutados	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/14/2017	03/21/2017
Impact	ss	Create Impact Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 1.2. Incremente porcentual en el valor de ventas agrícolas (%)	Modify Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 3.1. Proyectos de riego priorizados para financiamiento que surgen de los planes de aprovechamiento hídrico local (#).	Modify Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual.	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 4. Sistemas de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (mayores a US\$300.000).	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 10. Técnicos/as capacitados/as en formulación de proyectos con enfoque del programa.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 11. Estrategias de articulación intersectorial riego-cuenca implementadas.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 14. Gobiernos departamentales gestionan la información del SIRH.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 6. Productores agropecuarios que reciben servicios de acompañamiento del programa.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Resultado 3. Mejorar la gestión del recurso mediante la aplicación de planes municipales de manejo hídrico.	Create Outcome	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Resultado 2. Mejorar la eficiencia en el uso de agua de los sistemas de riego y las capacidades para la gestión comunitaria	Create Outcome	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 1.1. Incremento porcentual en el valor de la producción agropecuaria (%)	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 1. Diseño de proyectos de riego con enfoque del programa ajustados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Indicador 1.3. Incremento en el número de hectáreas bajo riego nuevas o mejoradas (#)	Modify Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Componente 1. Inversiones para el desarrollo de riego comunitario con enfoque de cuenca.	Modify Component	Se ajusto en función a la planificación anual	03/16/2017	03/21/2017
Output	Producto 13. Guía para la implementación de evaluaciones de impacto del subsector riego diseñada.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 2.3. Beneficiarios que cumple con aportes requeridos en los estatutos de la organización de regantes (%)	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 8. Planes de aprovechamiento hídrico local diseñados y socializados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 7. Productores agropecuarios que reciben servicio de asistencia técnica del programa.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Componente 2. Desarrollo de capacidades de los regantes para la sostenibilidad de los sistemas de riego.	Create Component	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 6. Productores agropecuarios que reciben servicios de acompañamiento del programa.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 14. Gobiernos departamentales gestionan la información del SIRH.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 1. Diseño de proyectos de riego con enfoque del programa ajustados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Impact	Incremento porcentual en los ingresos anuales (%)	Create Impact Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 2.3. Beneficiarios que cumple con aportes requeridos en los estatutos de la organización de regantes (%)	Modify Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 13. Guía para la implementación de evaluaciones de impacto del subsector riego diseñada.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 3. Sistema de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (hasta US\$300.000).	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 1. Diseño de proyectos de riego con enfoque del programa ajustados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/16/2017	03/21/2017
Output	Producto 10. Técnicos/as capacitados/as en formulación de proyectos con enfoque del programa.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 11. Estrategias de articulación intersectorial riego-cuenca implementadas.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 5. Técnicos/as capacitados/as en gestión sostenible de los sistemas de riego.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 4. Sistemas de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (mayores a US\$300.000).	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/16/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 1.2. Incremento porcentual en el valor de ventas agrícolas (%)	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 14. Gobiernos departamentales gestionan la información del SIRH.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 9. Guía para la supervisión en pre-inversión e inversión de los proyectos de riego aprobada.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Producto 5. Técnicos/as capacitados/as en gestión sostenible de los sistemas de riego.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 7. Productores agropecuarios que reciben servicio de asistencia técnica del programa.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 2.2. Eficiencia en el uso del agua promedio en los sistemas de riego tradicional (%)	Modify Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	ggg	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/14/2017	03/21/2017
Output	Producto 3. Sistema de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (hasta US\$300.000).	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/16/2017	03/21/2017
Output	Producto 11. Estrategias de articulación intersectorial riego-cuenca implementadas.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 1.3. Incremento en el número de hectáreas bajo riego nuevas o mejoradas (#)	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 8. Planes de aprovechamiento hídrico local diseñados y socializados.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 4. Sistemas de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (mayores a US\$300.000)	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 3.1. Proyectos de riego priorizados para financiamiento que surgen de los planes de aprovechamiento hídrico local (#).	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 1.1. Incremento porcentual en el valor de la producción agropecuaria (%)	Modify Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 3. Sistema de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (hasta US\$300.000).	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 9. Guía para la supervisión en pre-inversión e inversión de los proyectos de riego aprobada.	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 2. Diseños de proyectos de riego mayores con enfoque del programa elaborados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 2. Diseños de proyectos de riego mayores con enfoque del programa elaborados	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/14/2017	03/21/2017
Impact	Incremento porcentual en los ingresos anuales (%)	Modify Impact Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual.	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 2. Diseños de proyectos de riego mayores con enfoque del programa elaborados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 9. Guía para la supervisión en pre-inversión e inversión de los proyectos de riego aprobada.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Outcome	Resultado 1. Mejorar la productividad de los hogares beneficiarios a través de un aumento en la superficie bajo riego.	Create Outcome	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Impact	ss	Delete Impact Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 3.2. Número de beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural.	Modify Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual.	03/21/2017	03/21/2017
Output	Componente 1. Inversiones para el desarrollo de riego comunitario con enfoque de cuenca	Create Component	Se ajusto en función a la planificación anual	03/14/2017	03/21/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Producto 4. Sistemas de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (mayores a US\$300.000).	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Output	Producto 12. Evaluación del desempeño del subsector riego realizadas.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Outcome	Indicador 2.2. Eficiencia en el uso del agua promedio en los sistemas de riego tradicional (%)	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 3. Sistema de riego construidos	Create Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/14/2017	03/14/2017
Outcome	Indicador 2.1. Eficiencia en el uso del agua promedio en los sistemas de riego técnico (%)	Create Outcome Indicator	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 12. Evaluación del desempeño del subsector riego realizadas.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/21/2017	03/21/2017
Impact	Impacto esperado: Aumentar el ingreso de los hogares rurales beneficiados.	Create Impact	Se ajusto en función a la planificación anual	03/15/2017	03/21/2017
Output	Producto 2. Diseños de proyectos de riego mayores con enfoque del programa elaborados.	Modify Output	Se ajusto en función a la planificación anual	03/16/2017	03/21/2017
