

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1022	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/06/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	05/02/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Program for Rural and Indigenous Communities (PAYSRI)	Loan Number	2222/OC-PR
Executing Agency	SERVICIO NACIONAL SANEAMIENTO AMBIENTAL	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	OYAMADA KROUG,JORGE RUBEN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	PR-X1003
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Partially Satisfactory		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1022	12,000,000	12,000,000	8,000,000	0	20,000,000	12,000,000	10,053,350.83	83.78%	1,946,649.17
PR-X1003	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	39,478,900.77	98.70%	521,099.23
Aggregated	52,000,000	52,000,000	8,000,000	0	60,000,000	52,000,000	49,532,251.6	95.25%	2,467,748.4

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

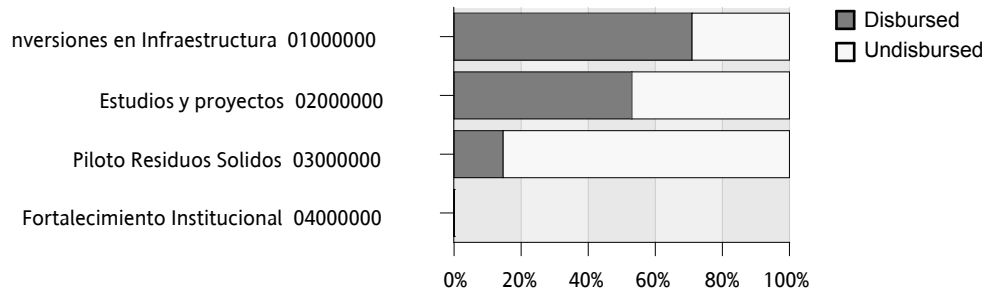

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Cobertura de los servicios de agua potable en el área rural, incrementada.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.0	Cobertura de agua potable en el área rural (atribuible al programa)	porcentaje	49.2	2008	P					51.10		51.10
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52	50.52
					A		49.64	49.65	49.83	50.11	50.36	

Details

Means of verification: Encuesta permanente de hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Habitantes con acceso a agua potable en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	habitantes	0.0	2009	P	3,000.00	23,250.00	37,500.00	33,750.00	30,000.00	22,500.00	150,000.00
					P(a)	3,710.00	31,595.00	6,885.00	32,214.00	19,855.00	18,016.00	120,000.00
					A	3,710.00	31,595.00	5,540.00	25,690.00	18,334.00	20,889.00	

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.3	Habitantes con acceso a agua mejorada en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	habitantes	0.0	2009	P	1,500.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	750.00	6,000.00
					P(a)	718.00	504.00	2,194.00	1,701.00	1,735.00	2,268.00	6,000.00
					A	718.00	504.00	493.00	0.00	0.00	3,096.00	

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Hogares con acceso a agua potable en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	Households (#)	0.0	2009	P	600.00	4,650.00	7,500.00	6,750.00	6,000.00	4,500.00	30,000.00
					P(a)	742.00	6,330.00	1,377.00	6,443.00	3,971.00	3,607.00	24,000.00
					A	742.00	6,330.00	1,108.00	5,127.00	3,659.00	4,169.00	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.3	Hogares con acceso a agua mejorada en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	Households (#)	0.0	2009	P	300.00	0.00	150.00	300.00	300.00	150.00		1,200.00
					P(a)	113.00	116.00	312.00	244.00	399.00	479.00	229.00	1,200.00
					A	113.00	116.00	67.00	0.00	0.00	675.00		
Details													
Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					
	Indigenous					P							
						P(a)						425.00	1,200.00
						A					0.00		

Outcome Nbr. 2: Juntas de Saneamiento en comunidades rurales y Comisiones de Saneamiento u otras estructuras comunitarias similares en comunidades indígenas; operativas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.1	Juntas de Saneamiento en comunidades rurales que operan los sistemas construidos por el programa	juntas	0.0	2009	P	8.00	62.00	100.00	90.00	80.00	60.00		400.00
					P(a)	8.00	60.00	11.00	59.00	39.00	40.00	39.00	226.00
					A	8.00	60.00	13.00	39.00	28.00	39.00		
Details													
Means of verification: Certificado de creación de la Junta y Certificado de Registro ante el Municipio. Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.2	Comisiones de saneamiento en comunidades indígenas que operan los sistemas construidos por el Programa.	comisiones	0.0	2009	P	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00			40.00
					P(a)	2.00	1.00	6.00	3.00	15.00	18.00	19.00	40.00
					A	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	15.00		
Details													
Means of verification: Certificado de creación de la Comision de Saneamiento y Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No				

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.3	Mujeres que participan como miembro de las Juntas de Saneamiento	mujeres	0.0	2009	P	18.00	122.00	200.00	200.00	200.00	160.00		900.00
					P(a)	9.00	101.00	0.00	133.00	88.00	150.00	195.00	508.00
					A	9.00	101.00	13.00	54.00	22.00	114.00		

Details

Means of verification: Actas de conformación de la Directiva de las Juntas de Saneamiento

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.4	Juntas y Comisiones de Saneamiento que piden apoyo para la operación y mantenimiento de los sistemas	porcentaje	60.0	2009	P						25.00		25.00
					P(a)							25.00	25.00
					A		0.00			0.00	0.00		

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Planes de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales, implementados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
3.1	Habitantes con acceso a sistemas de recolección y disposición final de residuos sólidos en comunidades rurales.	habitantes	0.0	1996	P		0.00	750.00	975.00	975.00	750.00		3,450.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00			3,450.00	3,450.00
					A				0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Certificado de entrega de obra y sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: Capacidad fiduciaria y de ejecución del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental fortalecida.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.1	Juntas y Comisiones de Saneamiento creadas por año por cada 100 funcionarios del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.	Juntas/comisiones	10.0	2009	P						50.00		50.00
					P(a)							50.00	50.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.1	Juntas y Comisiones de Saneamiento creadas por año por cada 100 funcionarios del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.	Juntas/ comisiones	10.0	2009	A					0.00	0.00		
Details													
Means of verification: Sistema de Información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.2	Juntas y Comisiones de Saneamiento asistidas por año por cada 100 funcionarios del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.	juntas/ comisiones	20.0	2009	P						100.00		100.00
					P(a)						100.00	100.00	
					A					0.00	0.00		
Details													
Means of verification: Sistema de Información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.3	Proyectos que aplican las normas de diseño actualizadas	porcentaje	0.0	2009	P	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00		100.00		100.00	100.00
					A					0.00	0.00		
Details													
Means of verification: Memoria de proyectos de ingeniería. Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.4	Proyectos en comunidades dispersas con tecnologías alternativas	proyectos	0.0	2009	P			5.00	5.00				10.00
					P(a)			0.00				10.00	10.00
					A					0.00	0.00		
Details													
Means of verification: Memoria de proyectos de ingeniería. Sistema de información único del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 5: Cobertura de los servicios de saneamiento en el área rural, incrementada

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
5.1	Cobertura de saneamiento básico en el área rural (atribuible al programa)	porcentaje	37.1	2008	P						39.70		39.70
					P(a)			0.00				39.18	39.18
					A		37.50	37.74	37.90	38.37	38.77		

Details

Means of verification: Encuesta permanente de hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
5.2	Habitantes con acceso a saneamiento básico en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes	habitantes	0.0	2009	P	3,000.00	23,250.00	37,500.00	33,750.00	30,000.00	22,500.00		150,000.00
					P(a)	3,440.00	20,380.00	14,475.00	31,015.00	20,400.00	21,782.00	18,320.00	110,000.00
					A	3,440.00	20,380.00	11,475.00	15,835.00	19,614.00	20,936.00		

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
5.3	Habitantes con acceso a saneamiento básico en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes	habitantes	0.0	2009	P	1,500.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	750.00		6,000.00
					P(a)	0.00	0.00	2,194.00	1,951.00	1,209.00	3,050.00	4,374.00	6,000.00
					A			243.00	0.00	0.00	1,383.00		

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
5.5	Hogares con acceso a saneamiento básico en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes	Households (#)	0.0	2009	P	600.00	4,650.00	7,500.00	6,750.00	6,000.00	4,500.00		30,000.00
					P(a)	688.00	4,076.00	2,895.00	5,994.00	4,080.00	4,500.00	4,199.00	22,000.00
					A	688.00	4,076.00	2,504.00	2,958.00	3,664.00	3,911.00		

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
5.0	Hogares con acceso a saneamiento básico en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes	Households (#)	0.0	2009	P	300.00	0.00	150.00	300.00	300.00	150.00		1,200.00
					P(a)	0.00	0.00	267.00	160.00	240.00	730.00	793.00	1,200.00
					A	0.00		57.00	0.00	0.00	350.00		

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
5.4	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2012	P								
					P(a)			2,895.00	5,994.00	4,080.00	4,500.00	4,199.00	22,000.00
					A			7,268.00	2,958.00	3,664.00	3,911.00		

Details

Means of verification: Sistema de información del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Sistemas de agua potable construidos en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes en operación	sistemas	P	60	400	4,662,000	25,897,000
			P(a)	40	226	6,358,003.16	25,355,383.2
			A	39	187	4,484,933.49	25,055,566.27
1.2	Sistemas de agua potable construidos en comunidades indígenas	sistemas	P		40	624,000	3,467,000
			P(a)	18	40	1,539,593.62	3,706,541.62
			A	15	21	1,446,070.63	2,360,889.23
1.3	Soluciones individuales de saneamiento básico construidos en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes.	soluciones individuales	P	4,500	30,000	2,522,000	14,009,000
			P(a)	4,500	22,000	4,238,668.77	16,680,639.12
			A	3,911	17,801	3,992,583.04	14,681,961.17
1.4	Soluciones individuales de saneamiento básico construidos en comunidades indígenas	soluciones individuales	P	150	1,200	338,000	1,877,000
			P(a)	730	1,200	230,054.22	506,074.94
			A	350	407	210,851.39	305,000.44

Component Nbr. 2 Preparación de proyecto y desarrollo comunitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Metodologías implementadas	metodologías	P		2		38,000
			P(a)		2	0	1,533.74
			A	0	2	0	1,533.74
2.2	Planes de capacitación implementados	planes	P		4		70,000
			P(a)		4	0	2,788.62
			A	0	4	0	2,788.62
2.3	Proyectos de agua para comunidades rurales, concluidos	proyectos	P		400	195,000	2,439,000
			P(a)	0	226	300,000	1,812,575.35
			A	0	226	8,841.2	1,086,160.26
2.4	Proyectos de agua para comunidades indígenas concluidos	proyectos	P		40		211,000
			P(a)	0	40	0	53,445.23
			A	0	40	0	53,445.23
2.5	Habitantes de comunidades rurales que integran las Juntas de Saneamiento capacitados en las áreas	habitantes	P	480	2,400	103,000	543,000
			P(a)	170	1,200	254,475.57	931,251.12
			A	144	1,086	358,875.44	747,699.73
2.6	Habitantes de comunidades indígenas que integran las Comisiones de Saneamiento capacitados en las áreas legales, técnicas, contables y financieras	habitantes	P	30	240		38,000
			P(a)	20	240	100,682.12	200,905.9
			A	0	220	78,330.04	98,324.12
2.7	Habitantes de comunidades rurales capacitados en aspectos de salud, higiene, uso racional de agua, equidad de género y protección de fuentes de agua.	habitantes	P	22,500	150,000	151,000	836,000
			P(a)	14,959	120,000	391,694.52	1,433,402.71
			A	30,573	115,941	552,389.14	1,150,876.29
2.8	Habitantes de comunidades indígenas capacitados en aspectos de salud, higiene, uso racional de agua, equidad de género y protección de fuentes de agua.	habitantes	P	750	6,000		74,000
			P(a)	1,022	6,000	194,045.49	387,207.65
			A	0	3,591	150,966.17	189,500.92

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Programa piloto de manejo de residuos sólidos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	Metodología para implementar planes de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales desarrollada	metodologia	P		1		30,000
			P(a)		1	0	64,600.79
			A	0	1	1,244.29	64,600.79
3.2	Sistemas de manejo de residuos sólidos implementados comunidades rurales en operación	sistemas	P	2	10	400,000	1,950,000
			P(a)	5	10	331,102.84	243,767.66
			A	0	0	96,510.06	96,510.06
3.3	Plan de concientización y capacitación dirigidos a las comunidades rurales sobre el manejo de los residuos sólidos implementado	plan	P		1		20,000
			P(a)	1	1	20,000	0
			A	1	1	0	0

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1	Plan de reingeniería del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	plan	P		1	70,000	1,435,000
			P(a)		1	124,210.91	1,599,348.56
			A	0	1	129,915.68	1,466,648.56
4.2	Sistema Único de Información para el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	sistema	P		1		1,330,000
			P(a)		1	130,372.73	50,208.94
			A	0.25	0.25	25,698.73	39,208.94
4.3	Normas técnicas de diseño para sistemas de agua potable y saneamiento actualizadas	normas técnicas	P		1		150,000
			P(a)	1	1	81,818.18	0
			A	0	0	0	0
4.4	Tecnologías alternativas de provisión de agua en comunidades dispersas desarrolladas	tecnologias alternativas	P		1		150,000
			P(a)	0.5	1	7,356.44	19,578.36
			A	0.5	1	7,274.82	19,578.36
4.5	Plan de difusión y comunicación del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	plan	P		1	100,000	435,000
			P(a)		1	22,690.91	142,793.97
			A	0	1	22,803.73	119,682.86

Other Cost

Administración		P			381,000	3,000,000
		P(a)			590,253.03	3,673,737.25
		A			416,585.95	3,148,854.7
Auditoria, evaluación y seguimiento		P			100,000	500,000
		P(a)			20,700	199,462.19
		A			20,198.29	149,679.17
Costos financieros		P			300,000	1,500,000
		P(a)			70,000	1,603,482.46
		A			164,593.87	442,365.58

Total Cost

Total Cost		P			9,946,000	59,999,000
		P(a)			15,005,722.51	58,668,729.38
		A			12,168,665.96	51,280,875.04

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Plan de concientización y capacitación dirigidos a las comunidades rurales sobre el manejo de los residuos sólidos implementado	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Habitantes de comunidades indígenas que integran las Comiciones de Saneamiento capacitados en las áreas legales, técnicas, contables y financieras	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Habitantes de comunidades rurales capacitados en aspectos de salud, higiene, uso racional de agua, equidad de género y protección de fuentes de agua.	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Proyectos de agua para comunidades rurales, concluidos	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Sistemas de agua potable construidos en comunidades indígenas	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Soluciones individuales de saneamiento básico construidos en comunidades indígenas	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Plan de difusión y comunicación del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Habitantes de comunidades rurales que integran las Juntas de Saneamiento capacitados en las áreas	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/15/2017	03/07/2017
Output	Sistemas de manejo de residuos sólidos implementados comunidades rurales en operación	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Habitantes de comunidades rurales que integran las Juntas de Saneamiento capacitados en las áreas	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Tecnologías alternativas de provisión de agua en comunidades dispersas desarrolladas	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Sistema Único de Información para el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Metodología para implementar planes de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales desarrollada	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Soluciones individuales de saneamiento básico construidos en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes.	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Normas técnicas de diseño para sistemas de agua potable y saneamiento actualizadas	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
Output	Plan de reingeniería del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas de agua potable contruidos en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes en operación	Modify Output	Datos ajustado con base en la información remitida por el ejecutor posterior a la reunión de fecha 07-Mar-2017. Ver SISCOR INPUT 466/2017, documento EZSHARE 71711723-32,	03/16/2017	03/07/2017
