

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1160	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/02/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	São José dos Campos Urban Structuring Program	Loan Number	2323/OC-BR
Executing Agency	Perfeitura Municipal de São José dos Campos	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	HOBBS,JASON ANTHONY	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Perfeitura Municipal de São José dos Campos		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1160	85,672,400	85,672,400	92,353,800	0	178,026,200	85,672,400	35,662,310.51	41.63%	50,010,089.49
Aggregated	85,672,400	85,672,400	92,353,800	0	178,026,200	85,672,400	35,662,310.51	41.63%	50,010,089.49

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

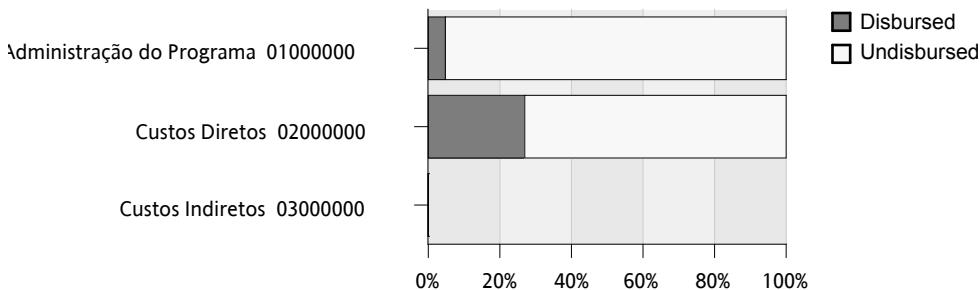

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Reestruturar e ordenar o desenvolvimento urbano do Município de São José dos Campos

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Ocupação irregular de terras do Município (favela) eliminada	favela	1.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Secretaría de Planeamiento Urbano.

Observations: No tiene en cuenta una invasión de zona privada ni familias dispersas en zonas de riesgo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Ocupação irregular de terras (assentamentos irregulares) do Município reduzida	assentamentos irregulares	94.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Secretaría de Planeamiento Urbano.

Observations: No tiene en cuenta una invasión de zona privada ni familias dispersas en zonas de riesgo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Índice de passageiros por kilómetros recorridos incrementado, em virtude da integração do sistema de ônibus	%	1.6	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Secretaría de Transporte

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.4	Arrecadação municipal (IPTU - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana)	US\$ milhões	39.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	incrementada.	US\$ milhões	39.0	2010	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Details															
Means of verification: Secretaría de Hacienda															
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Desenvolvimento Urbano do Município de São José dos Campos estruturado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Nº de favelas existentes	Favela	1.0	2010	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Secretaria de Planejamento Urbano

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Índice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1.6	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2.10	2.10
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Secretaria de Transportes

Observations: A meta é a integração do sistema de ônibus

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.3	Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	3.9E7	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Secretaria de Fazenda

Observations: Em 2010, ano de referência, o valor arrecadado foi de US\$ 39 milhões

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Melhorias urbano-ambientais implementadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Desenvolvimento Urbano do Município de São José dos Campos estruturado

Observation:

Details			
Means of verification: Secretaria de Planejamento Urbano			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Details			
Means of verification: Secretaria de Transportes			
Observations: A meta é a integração do sistema de ônibus			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.3	Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	3.9E7	2010	P	58,000,000.00
					P(a)	58,000,000.00
					A	0.00

Details			
Means of verification: Secretaria de Fazenda			
Observations: Em 2010, ano de referência, o valor arrecadado foi de US\$ 39 milhões			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: Melhorias urbano-ambientais implementadas

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7.4	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: SEADE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 3: Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas	0.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00	24,480.00	30,240.00	30,240.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00	24,480.00	30,240.00	30,240.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00			20,170.00

Details

Means of verification: URBAN

Observations: operadora do sistema de resíduos sólidos do Município

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 4: Assentamentos regularizados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.1	Lotes con matrículas individualizadas nos assentamentos	Lotes	0.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00			1,880.00

Details

Means of verification: Secretaria de habitação

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 5: Familias de la favela do banhado reubicadas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.1	tasa de permanencia de las familias asentadas	%	0.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

5.1	tasa de permanencia de las familias asentadas	%	0.0	2010	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Seguimiento anual, e investigación después de la ocupación, realizada por la Secretaría de Vivienda.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.2	zona liberada para la integración al area de preservación ambiental	m2	0.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,102.00	223,102.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,102.00	223,102.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: SEMEA

Observations: zona desocupada, recuperada y protegida para el futuro establecimiento de un área de protección ambiental

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 6: Mejorías en cuanto a movilidad de la población implantadas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.1	Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Secretaría de Transportes. comparación de la velocidad media de los corredores (Av. S. José, Rui Barbosa y Olivio Gomes)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.2	Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte. Datos actuales y medidos en la Av. dos Astronautas; la meta se medirá en la nueva vía.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.3	Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2.5	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00

Details

Means of verification: meta: 1 minuto por vehículo por día.

Observations: calculado

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.4	Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de líneas en funcionamiento)	lineas	37.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: reducción del 8%

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 7: Fortalecimiento institucional implementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
7.1	tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00			28.00

Details

Means of verification: protocolo municipal

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
7.2	Capacidad de gestión de servicios electrónicos	servidores	36.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00			0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details															
Means of verification: Registro de entradas al servidor de datos															
Observations: Reducción en un 50% (18 servidores) del número de "nodos físicos" sujetos a fallas															
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
7.3	Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Details															
Means of verification: protocolo municipal															
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity				No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Melhorias urbano-ambientais

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Parques Urbanos criados	Parques	P	1	5	3,000,097.14	15,000,485.7
			P(a)	0.5	2	12,540,898.9	15,490,897.67
			A	0.5	1.5	0	2,949,998.77
1.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos	P	6	21	709,150.33	2,836,601.32
			P(a)	0	12	1,000,000	2,842,591.32
			A	0	12	0	953,968.35
1.3	Assentamentos Urbanizados	Assentamentos	P	2	5	2,142,213.84	6,426,641.52
			P(a)	0.5	5	684,122.6	6,181,989.12
			A	0.5	4.5	0	4,813,743.92
1.4	Famílias reassentadas	Famílias	P	399	399	14,300,000	14,300,000
			P(a)	0	0	7,150,000	14,300,000
			A	0	0	0	0
1.5	Canal de Drenagem construído	Canal	P		1		2,930,371.39
			P(a)	0	1	0	3,178,621.89
			A	0	1	0	3,178,621.89

Component Nbr. 2 Componente II: Melhorias en cuanto a movilidad urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Obras do sistema Viário concluídas	Km	P		14.5		104,296,082.97
			P(a)	0.5	8	20,000,000	41,120,026.13
			A	0.5	4.5	20,000,000	41,120,026.13
2.2	Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	%	P		1	0	3,320,000
			P(a)	0	100	1,272,945.2	4,982,066.67
			A	0	100	0	2,436,176.27
2.3	Sistema Integrado de transporte público em operação	%	P		13	0	2,706,895.72
			P(a)	14	86	3,803,858.77	7,921,934.6
			A	14	86	0	314,217.06
2.4	Plano de melhorias operacionais na Secretaria de Transporte implementado	Plano	P		1	0	1,987,000
			P(a)	0.5	0.5	259,104.98	688,946.71
			A	0.5	0.5	170,636.17	341,372.92
2.5	Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto	P		1	0	1,692,659.29
			P(a)	0	1	0	25,701.44
			A	0	0	0	25,701.44

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação - ferramentas para planejamento de TI implantada.	ferramentas	P		1	0	150,000
			P(a)	0	2	0	169,006.28
			A	0	2	0	169,006.28
3.2	Gestão Cadastral - nova base de dados cadastrais e multifinalitários implantada	%	P		180,000	0	16,687,200
			P(a)	0	100	0	2,908,401.34
			A	0	100	0	2,908,401.34
3.3	Melhorias em tecnologia da informação (solução de armazenamento e processamento de dados) implementadas	%	P		0		0
			P(a)	0	100	822,474.62	3,451,747.26
			A	0	100	0	1,806,525.02
3.4	Aperfeiçoamento de serviços de governo eletrônico - softwares de governo eletrônicos implementados	softwares	P		0		0
			P(a)	1	4	511,700	4,661,627.12
			A	0	2	0	3,638,227.12
3.5	Base Cadastral - Nova base de dados geoterritoriais integrada	%	P		0		0
			P(a)	50	100	2,823,300	5,646,600
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP, fiscalização de obras	P			782,400	3,912,000
		P(a)			1,078,278.63	2,310,817.6
		A			0	154,260.34
	Imprevistos	P			356,052.4	1,780,262
		P(a)			890,131	1,780,262
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			21,289,913.71	178,026,199.91
		P(a)			52,836,814.7	117,661,237.15
		A			20,170,636.17	64,810,246.85

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Lotes com matrículas individualizadas nos assentamentos	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/26/2017	09/26/2017
Output	Plano de melhorias operacionais na Secretaria de Transporte implementado	Modify Output	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014. 2	09/27/2017	09/27/2017
Output	Sistema Integrado de transporte público em operação	Modify Output	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014. 2	09/27/2017	09/27/2017
Output	Parques Urbanos criados	Modify Output	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/27/2017	09/27/2017
Outcome	Nº de favelas existentes	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/26/2017	09/26/2017
Output	Obras do sistema Viário concluídas	Modify Output	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/27/2017	09/27/2017
Outcome	Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014. 2	09/27/2017	09/27/2017
Outcome	incremento no m2 de área verde por habitante	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/26/2017	09/26/2017
Outcome	Lotes com matrículas individualizadas nos assentamentos	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/26/2017	09/26/2017
Outcome	incremento no m2 de área verde por habitante	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/26/2017	09/26/2017
Outcome	Nº de favelas existentes	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/26/2017	09/26/2017
Outcome	incremento no m2 de área verde por habitante	Modify Outcome Indicator	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014.	09/26/2017	09/26/2017
Output	Obras do sistema Viário concluídas	Modify Output	Adequação dos resultados para compatibilizar com a Matriz de Resultados do Programa, modificada em 12/11/2014, conforme Of. n 20/GP/APE/2014. 2	09/27/2017	09/27/2017
