
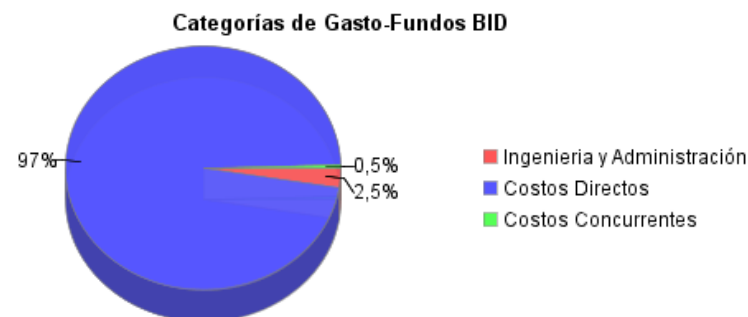




Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO		
Sector: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY		
Número da Operação: 2343/OC-AR	Atual: 200.000.000,00	Original BID: 200.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 200.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: AR-X1017, AR-T1077	Saldo: 200.000.000,00	Cofinanciamento/País: 50.000.000,00
Subtipo de Operação: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		Original Estimado: 250.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 21, 2011

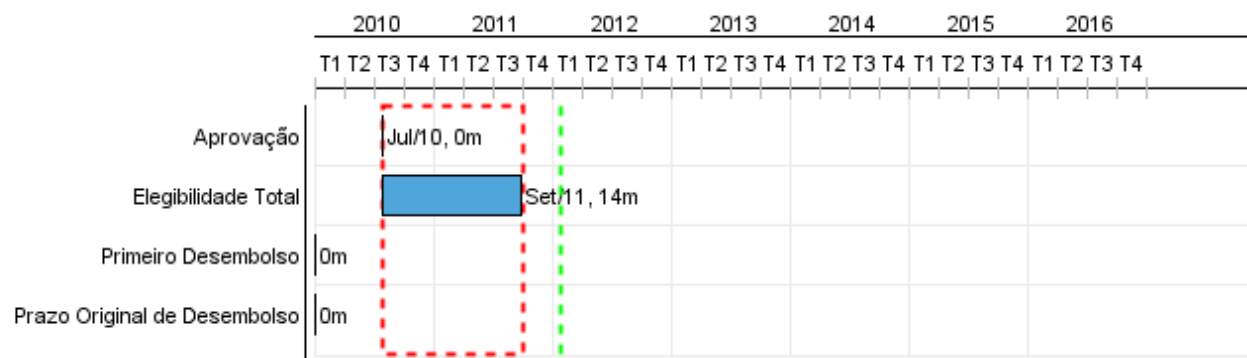

Progresso Acumulado até 2011

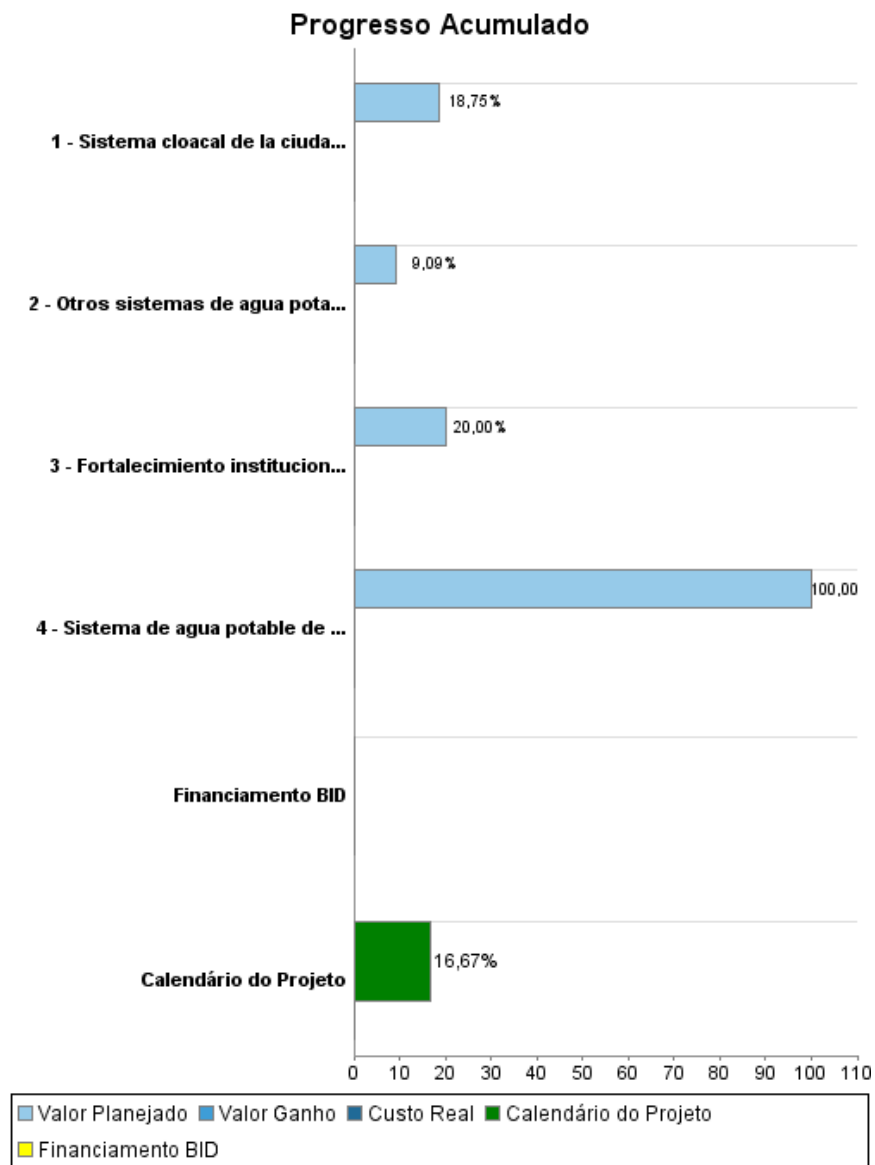

Resultados

Resultado: Sistema cloacal de la ciudad de San Juan mejorado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares	54.650,00	2009	P A	54.650,00	77.050,00	87.950,00	97.750,00	102.360,00	112.150,00
Incremento en agua residual tratada en lagunas de estabilización	l/seg		2009	P A	164,00	257,00	350,00	430,00	465,00	515,00
Agua residual tratada a nivel secundario y cumpliendo con normas	l/seg	100,00	2009	P A	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Biosólidos tratados y dispuestos de forma ambientalmente apropiada	ton/día		2009	P A	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Resultado: Sistema de agua potable de la ciudad de Salta mejorado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares		2009	P A		41.225,00	42.257,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
días del año fuera de norma por turbiedad	días	90,00	2009	P A						0,00
Días del año con producción restringida	días	154,00	2009	P A						0,00
Producción media sostenible	m3/seg	243,00	2009	P A	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Sistema cloacal de la ciudad de San Juan									
Sistema cloacal de la ciudad de San Juan construído	sistemas				1,00	15.000.000,00			80.000.000,00
Sistema de agua potable de la ciudad de Salta									
Sistema de agua potable de la ciudad de Salta intervenido	Sistemas	1,00			1,00	20.000.000,00			20.000.000,00
Administración, seguimiento y costos financieros									
Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento institucional implementado	Fortalecimiento				1,00	1.000.000,00			5.000.000,00
Otros sistemas de agua potable y saneamiento intervenidos									
Otros sistemas de agua potable y saneamiento intervenidos	Sistemas				1,00	10.000.000,00			110.000.000,00
TOTAL						46.000.000,00			215.000.000,00
